项目名称：安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

项目编号：安龙财磋商采购-2024-20

响 应 文 件

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

一、 投 标 书

致：河南博科工程管理有限公司

根据贵方竞争性磋商 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称） 的《磋商文件》（项目编号： 安龙财磋商采购-2024-20 ），

经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交《响应文件》。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价

（4）已标价工程量清单

（5）技术标

（6）工程质量保修书

（7）工程质量、安全、工期承诺书

（8）偏差表

（9）反商业贿赂承诺书

（10）供应商资格条件及履约承诺函

（11）资格要求相关证明材料（文件）

（12）采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）

（13）供应商须知所需的其他材料（按条款需要）

（14）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（15）供应商认为有必要提交的其它材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附《响应文件》开标一览表”中规定的应提供和交付的投标总价为：人民币 1265644.06元 ，即 壹佰贰拾陆万伍仟陆佰肆拾肆元零陆分（文字表述）；

工期： 60 日历天 ，施工地点： 安阳市龙安区龙泉镇 。

2、如果我单位的投标书被接受，我单位将履行《磋商文件》中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

4、我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括澄清、修改、补充文件（竞争性磋商公告所述媒体公布）以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、《响应文件》自开启日起有效期为90日历天。

6、我单位承诺按照《磋商文件》规定的付款方式执行。

7、如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据《磋商文件》“第三章3.5.5违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

8、我单位同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

邮政编码：45500

电话： 13346636351

传真：/

供应商（电子签章）：河南泰统建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

二、开标一览表

注：供应商需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列开标一览表，系统中填列的开标一览表为供应商《响应文件》的一部分。

基于电子化交易的特点，供应商上传解密后的《开标一览表》、《分项报价表》、《响应文件》，构成《响应文件》的组成部分。

《开标一览表》、《分项报价表》无需另行填列。

提示：本项目为工程项目，供应商须按“安阳市政府采购投标文件编制系统”中“开标一览表”要求逐项填列（如：工期、项目经理等）；“开标一览表”所列内容将作为符合性审查的一部分；未按要求填列的，磋商小组将有权视为无效投标。

三、分项报价

1、供应商需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列分项报价，系统中填列的分项报价为供应商《响应文件》的一部分。

2、基于电子化交易的特点，供应商上传解密后的《开标一览表》、《分项报价表》、《响应文件》，构成《响应文件》的组成部分。

《开标一览表》、《分项报价表》无需另行填列。

3、本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。供应商无需在“投标文件编制系统”分项报价表中选择“是否享受价格折扣、折扣率（%）”。

四、已标价工程量清单

后附







投标报价汇总表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	50704.1
2	200	路 基	88657.42
3	300	路 面	1102679.14
4	600	安全设施及预埋管线	23603.4
5	第100章至第700章合计		1265644.06
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1265644.06
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		1265644.06

工程量清单表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理			50704.1	50704.1
102-2	施工场地建设费	总额	1	32000	32000
102-3	安全生产费	总额	1	18704.1	18704.1
清单 合计 人民币50704.1元					

工程量清单表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

标表2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			88657.42	88657.42
202-2	挖除旧路面			88657.42	88657.42
-a	水泥混凝土路面	m3	687.8	128.9	88657.42
清单 合计 人民币88657.42元					

工程量清单表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层			17035.2	17035.2
308-2	黏层	m2	10080	1.69	17035.2
309	沥青混凝土面层			561456	561456
309-2	中粒式沥青混凝土面层			561456	561456
-a	5cm中粒式沥青混凝土面层	m2	10080	55.7	561456
312	水泥混凝土路面			374644.66	374644.66
312-1	水泥混凝土面层			374644.66	374644.66
-a	水泥混凝土	m2	3439	108.94	374644.66
314	检查井			24087.6	24087.6
314-3	检查井升高	座	30	802.92	24087.6
310	旧路面处理			125455.68	125455.68
310-1	路面灌缝	m	5376	4.98	26772.48
310-2	路面凿毛	m2	10080	9.79	98683.2
清单 合计 人民币1102679.14元					

工程量清单表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	标线			23603.4	23603.4
605-1	路面标线			23603.4	23603.4
-a	热熔标线	m2	540	43.71	23603.4
清单 合计 人民币23603.4元					

工程量清单单价分析表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程　　货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-2	施工场地建设费					总额						32000				32000
2	102-3	安全生产费					总额						18704.1				18704.1
3	202-2-a	水泥混凝土路面			28.75		m3					60.51	4.8	17.23	10.64	6.97	128.9
【1】	1001001	人工	0.264	108.85	28.75												
4	308-2	黏层					m2		1.37		1.37	0.02	0.01	0.04	0.14	0.11	1.69
【1】	3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青					t	3333.33	1.37		1.37						
5	309-2-a	5cm中粒式沥青混凝土面层			0.08		m2		54.16		54.16	1.11	0.07	0.06	0.13	0.09	55.7
【1】	1001001	人工	0.001	108.85	0.08												
【2】	1513006	中粒式沥青混凝土(商)				0.05	t	1083.19	54.16		54.16						
6	312-1-a	水泥混凝土			18.96		m2		60.6		60.6	3.37	1.72	8.49	8.99	6.81	108.94
【1】	1001001	人工	0.174	108.85	18.96												
【2】	1511009	普C30-32.5-2(商)				0.204	m3	291.26	59.42		59.42						
【3】	2001001	HPB300钢筋					t	3675.57	0.01		0.01						
【4】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3628.32	0.2		0.2						
【5】	3001001	石油沥青					t	3970	0.39		0.39						
【6】	3005001	煤					t	825.69	0.02		0.02						
【7】	3005004	水				0.029	m3	5.32	0.15		0.15						
【8】	4003002	锯材中板 δ=19~35,中方混合规格					m3	2035.4	0.14		0.14						
【9】	7801001	其他材料费				0.265	元	1	0.27		0.27						
7	314-3	检查井升高			246.29		座		317.08		317.08	7.15	15.78	106.92	66.3	43.39	802.92
【1】	1001001	人工	2.263	108.85	246.29												
【2】	3005004	水				0.125	m3	5.32	0.67		0.67						
【3】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.411	m3	194.17	79.8		79.8						
【4】	5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方				0.091	m3	116.5	10.6		10.6						
【5】	5507003	青(红)砖240mm*115mm*53mm				0.513	千块	353.98	181.59		181.59						

工程量清单单价分析表

合同段：龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程　　货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【6】	5509001	32.5级水泥				0.114	t	238.94	27.26		27.26						
【7】	7801001	其他材料费				17.16	元	1	17.16		17.16						
8	310-1	路面灌缝			1.2		m		1.66		1.66	0.77	0.12	0.52	0.41	0.29	4.98
【1】	1001001	人工	0.011	108.85	1.2												
【2】	3001001	石油沥青					t	3870	1.39		1.39						
【3】	3005001	煤					t	885.69	0.07		0.07						
【4】	7801001	其他材料费				0.194	元	1	0.19		0.19						
【5】	7901001	设备摊销费				0.009	元	1	0.01		0.01						
9	310-2	路面凿毛			0.62		m2		1.47		1.47	5.5	0.35	0.44	0.81	0.59	9.79
【1】	1001001	人工	0.006	108.85	0.62												
【2】	2009502	精铣刨刀头				0.042	个	29.91	1.24		1.24						
【3】	3005004	水				0.008	m3	5.32	0.04		0.04						
【4】	7801001	其他材料费				0.044	元	1	0.04		0.04						
【5】	7901001	设备摊销费				0.148	元	1	0.15		0.15						
10	605-1-a	热熔标线			3.37		m2		24.36		24.36	6.34	0.72	2.66	3.61	2.65	43.71
【1】	1001001	人工	0.031	108.85	3.37												
【2】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	4.1	19.23		19.23						
【3】	6007003	反光玻璃珠GB/T 24722-2009 1、2号(A类)				0.957	kg	3.33	3.19		3.19						
【4】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						

五、技术标

（格式自拟）

1、内容完整性和编制水平

2、施工方案和技术措施

3、质量管理体系与措施

4、安全管理体系与措施

5、环境保护管理体系与措施（包括有效的扬尘治理措施）

6、工程进度计划与措施

7、拟投入资源配备计划

8、施工进度表或施工网络图

9、施工总平面布置图

10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

1、内容完整性和编制水平

龙安区龙泉镇 X005 西王线(陈家坡-龙安大道)改造工程项目，位于安阳市龙安区龙泉镇，起点位于陈家坡，自东向西止于龙安大道，路线全长约 1.19km。拟建项目路基宽度 11.0 米，具容体断面布置 11.0 米=1.0 米(路肩)+9.0 米(行车道)+1.0 米(路肩)，沥青混凝土路面。本项目道路采用原三级公路标准建设，设计速度 40km/h。主要内容为:中修罩面，局部破碎板挖补后统一铺筑 5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土，并完善交通安全设施。

一、工程概况

1、采购项目编号：安龙财磋商采购-2024-20

2、采购项目名称：安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1275058元

最高限价：1275058元

序号	包号	包名称	报预算（元）	包高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	安龙财磋商采购-2024-20	安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程	1275058元	1275058元	是	1275058元

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、技术要求或服务要求等）

5.1 采购内容：工程量清单、图纸及磋商文件包含的全部内容；

5.2 质量要求：合格

5.3 工程地址：安阳市龙安区龙泉镇

5.4 工期：60 日历天

5.5 资金来源：财政

6、合同履行期限：60 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

1、全面响应招标文件原则编制本投标文件以及后续施工中，我公司将全面响应招标文件《合同条件》、《技术条款》和其它要求，严格履行合同，在工程质量、安全、进度、环境保护和文明施工等方面，争创佳绩。

2、质量创优原则我公司在本工程施工的质量目标是“合格”。为达到该质量目标，我们将加强领导，强化管理，贯彻执行质量体系标准,运用合理的技术精心施工和科学的质量检测方法进行控制,确保实现质量目标。

3、进度保证原则根据业主对本工程的工期要求，编制科学、合理、周密的施工方案，利用先进的项目管理技术，合理安排进度，实行网络控制，重点做好工序间的衔接,实时监控进度，确保实现工期目标。

4、安全保护原则在施工组织设计编制中，始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，制定详细有效的监测方案，采取相应的预防和应急技术措施，重要岗位操作工保证持证上岗,安全措施落实到位，确保万无一失。

5、环境保护原则本工程涉及施工废弃物排放、卫生防疫、景观与视觉保护、噪声控制、粉尘控制、扰民与污染控制、水土保持、生态保护等多方面问题.结合具体情况.我们将采取积极、严密的环保措施,尽可能减少施工对河流和周边环境的影响，按照国家有关环境保护的法律法规，编制施工区和生活区的环保措施计划并严格执行.

6、合理布局原则根据本标段工程的任务量和管理目标的要求，考虑地形地貌特征，在临时工程的施工布置上,特别是水、电等管线以及道路、各种场地的设置，充分利用业主提供的场地，本着避免干扰、就近布置、方便适用、优化设置的原则，合理布局。

7、科学配置原则根据本工程的任务量和管理目标的要求,实行科学配置。在人、财、物、设备等方面，科学合理配置，既保证施工需要，又避免资源浪费.

二、编制原则

1、安全第一

在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位，在确保万无一失的前提下组织施工。

2、优质高效

加强领导，强化管理，优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行 ISO9001 质量体系标准，积极推广“四新”技术，确保创优规划和质量目标的实现。

3、方案优化

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在保证安全、确保质量、满足工期、有利环保的原则下对施工方案进一步优化。

4、确保工期

根据建设单位对本工程建设项目的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，按照合理配置资源、组织平行及交叉作业，采用网络计划技术对各工序作业时间加以控制。

5、科学配置

在施工组织上实行科学配置，选派有经验丰富的管理人员、过硬的技术人员和专业化水平高的施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保工程施工的顺利进行。

三、编制依据我公司严格依据以下资料进行本投标文件的编制：

1、招标文件

2、设计图纸；

3、现行国家有关规范、标准、规程。

4、公司多年来同类工程的成功施工经验.

5、公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

6、公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备；

7、本地区有关建筑工程施工的有关规定；

8、公司 ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件；

9、公司编制的本工程施工图预算书及其他资料.

10、其他资料

四、施工部署

1、项目进度、质量、安全、环保目标

1）进度目标

根据招标文件要求本工程施工总工期共60日历天。若中标，我公司计划开工日期为2024年11月10日，工程竣工日期为2025年1月9日，在合同规定工期内完成全部任务，具体开工日期以监理开工令为准。

在施工过程中，我们将信守合同承诺，有计划的组织人力和物力资源，尽量创造流水作业的环境，不断优化管理，采用“四新”技术，在动迁工作不延误的基本条件下，保证在合同工期范围内完成本工程的全部施工任务。

2）质量目标

本工程的质量目标：工程符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。

在施工过程中，我们将严格执行国家、地方有关加强质量管理的法律、文件、颁发的施工规范、规程和质量标准，以及本公司制定的本工程质量目标。坚持以“科学管理、精心施工、信守合同、顾客满意”的质量方针，严格按照工程设计施工图进行每道工序的施工，建立强有力的质量保证系统和质检系统，积极开展以“比质量、比进度、比安全、比文明”为主要内容的劳动立功竞赛活动，开展全面质量管理，诚恳接受建设单位、质检站及监理单位的检查、监督和指导。

3）安全目标

严格遵守和执行国家、省、市颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，并采取严密的监控措施，保证达到“员工责任工伤伤亡为零，无重伤事故，无重大机械事故”的安全目标。

施工中坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全各项安全规章制度和措施，实行三级安全管理。设置专职安全员，班组设兼职安全员，形成上下齐抓共管的安全管理网络。

4）环保目标

按公司三体系的要求：遵守环保法律法规，杜绝环境污染事件发生，提倡低碳生活。施工环保标准达到ISO14000系列标准，并符合环保要求。认真贯彻“预防为主，保护优先，开发与保护并重”的原则，“三废”按规定排放，确保工程所处环境不受污染。

2、施工方案和技术措施

我公司将把主要的施工力量投入到本工程中，树立精品意识,充分发挥市政工程施工经验和组织能力,解决施工中出现的各种问题。优质、按期、安全地完成本工程的建设。

1、根据设计图纸,施工前对图纸所示或监理工程师提供的各类现有建筑物、障碍物和设施的位置情况，进行现场核对和补充调查，如发现与图纸不符，应及时通知监理工程师或业主核查。

2、施工用水用电根据业主提供的水、电接驳点，安装独立水、电表。施工场地内水电管线由我公司自行解决，以满足施工用水电的需要。

3、按照材料及机械计划编制分批进场，在中标后即组织施工机械进场，并合理调配资金，分期分批组织材料进场。所有进场材料先送样品，经监理工程师确认后方可进场。

4、按照机械设备使用计划，对所有机械设备进行检修及调试惇，并定时保养，使其保持良好的待用状态。对工程中所用的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。

5、按照劳动力需用量计划调配人员，安排劳动力进场，并对准备进场的工人进行劳动安全教育;对工程所需的各技术工种人员进行技术培训教育，取得有关上岗证、资格证后方许其进场从事相应工种的工作。劳动力及技术工种人员进场后，定期对其进行劳动安全教育及施工技术总结及教育，以加强工人的劳动安全意识，不断提高施工技术，使工程顺利进展。

6、工程准备工作要做到全面充分，不能仓促马上。开工后应集中力量组织多个作业面，全面全工，齐头并进，组织好流水作业和立体交叉作业，采取一切安全和质量保证措施，优质高效地完成施工任务。

2.2 施工测量

1、平面控制网

(1)依据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》中测量精度要求，建立工程平面控御网，目的主要是加密各高级导线点，以满足施工测量的平面控制的需要。

(2)控制导线网测设所用仪器为全站仪，其精度为测角精度±2”，测距精度:棱镜±(2mm+2ppm×D)，发射片土(4mm+3ppm×D)。

(3)施工前由测量人员利用全站仪对业主提供的平面坐标点、高程点进行复测，并对场区内的现况地面标高统一复测。

(4)在道路沿线用全站仪布设一条闭合导线,作为以后施工的首级控制点。施工测量平面控制网，导线技术指标按一级导线要求执行。

(5)控制点的选择考虑便于长期保存，既要满足精度要求、分布均匀方便施工，还要考虑加密控制点的布设，对于重点平面控制点及高程控制点采用浇注混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深 0.5m，长和宽各 0.5m)，并检查控制点的变化情况，如有异常及时予以调整或平差。

(6)随着工程各项工作的进一步展开，为了更好的控制各构筑物的平面位置，在首级控制点的基础上，进行加密控制点的布设。加密点应依据控制点布设成附合导线、闭合导线或结点导线网的形式。

(7)所有内业成果报监理工程师审批后方可投入工程使用。

2、高程控制网

(1)高程控制与平面控制同步进行，待复测测绘院提供的高程控制点经监理工程师审批后，按四等水准技术要求将高程传至各个平面坐标点上。

(2)结合本工程的实际情况在施工过程中可建立临时水准点。临时水准点要选在不易破坏的地方(宜围绕各条道路且在占地线以外)，当施工过程中水准点不得不被破坏时，及时将其引测至稳固的地方，保证精度与原有水准点等级相同。

(3)在施工过程中，在使用任何水准点之前必须进行复测，检查水准点是否可靠。

3、控制点的复核及导线点、水准点的增设

(1)在进场接桩后，立即组织测量人员对控制桩点进行复测，如符合要求即向监理工程师申请批准使用，否则重新交桩。

(2)在控制桩点经监理工程师批准使用后，根据工程现场情况，在道路沿线进行控制点的加密。加密控制点要进行保护，防止碰撞或破坏。

(3)施工测量执行《工程测量规范》(GB50026-2007)，在施工现场沿线布设一级导线闭合控制网，四等水准高程控制网，导线点间距控制在 200m 左右，方法采用附合法。绘制草图上报监理工程师，桩点用水泥混凝土加固保护。

(4)为保证测量精度，仪器测出的数据必须加改正值，重要部位的点位、高程测量必须做平差处理，角度取到 0.1”，高程取到 mm 位。钢尺量距必须有三差改正，控制精度由高至低传递。减少误差消灭错误，测量工作从外业到内业必须做到步步有效复核。

2.3 混凝土构件拆除

详细核对建筑施工图纸与结构施工图纸，确认拆除部位:对比现有施工技术水准和管理水平，保证质量和工期要求并采取适当调整措施，巩固施工技术力量在每一分项施工前向操作班组进行交底。

1、主要施工机具准备:电锤、水钻机、电镐、气焊、风镐、三级电箱、拖线电箱若干。

23 现场准备:

(1)在拆除工程作业前,应在施工场所设置相关的安全标志。划定危险区域，施工前产发出告示，通报施工注意事项，并采取可靠的安全防护措施。

(2)确定拆除部位:按施工图纸要求确定拆除部位,经复核无误后做好明确标志。拆除部位周边做好产品保护措施。

3、拆除基础:

用电镐等工具将基础进行凿打，但应注意分块不宜过大，对过大的混凝土块使用风镐进行二次粉碎，检查所拆除的砼块是否给其它结构或人体造成危害:拆除的混凝土块，运至甲方指定地点。拆除施工应分段进行，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。设置临时围护栏拆除混凝土造成的空缺，应设置临时围护栏，围护栏设置应醒目，牢固可靠。

4、清运:拆除的混凝土应及时清运，保持施工现场整洁。5、工程质量保证措施

1)施工前管理人员应认真学习施工规范，工艺标准，设计要求和施工组织方案，做到心中有数。

(2)做好对施工人员的技术交底，并对参加施人员进行质量及安全教育。

(3)机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施 T.。

(4)施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

2.4 路基土方开挖与填筑施工方法

2.4.1 路基清表施工

1、在获得监理工程师许可的情况下，利用推土机、挖掘机及汽车配合，进行场地清理。

2、本工程的地面清表采用挖掘机、推土机作业并人工配合，自卸车运输，平地机精平的施工方法,将用地范围内的树木、灌木丛、杂草等进行砍伐或清理。清除施工区域内边坡树木、杂草、大型块石等附着物，根据业主和监理的要求做到清表后作业面无树木、杂草、淤殖土等附着物,具备边坡土方开挖和修整条件，现场试挖的清表深度30cm。

3、清表前，无水段需修筑临时排水、挡水工程，有水段必须首先疏通排干积水及做好雨季排水工作。对于机械不能清理的部位进行人工清除。

4、清表顺序自上而下进行，采用装载机挖装，可根据现场实际情况，不能有效清除的地方，请示业主单位、监理单位同意并参考相关规范。

2.4.2 土方开挖施工

主要内容包括:土方的开挖和回填工程。针对本工程施工工期短，工程任务量较大的特点，确定本工程的施工原则为分段施工、流水作业、由远及近、减少交叉、保护成品、一次成优。

1、测量人员对土方开挖段落进行跟踪测量，每 10m 设桩进行高程测量，避免超挖现象。

2、了解所挖区的十质情况，发现劣质土及时清除，采取措施。挖十区十方用作填方的，先将树根、草皮、杂物等清除干净。

3、施工中应避开雨天，并做好临时排水工作。挖土深度按设计规定执行，同时要考虑最后一层挖土顶面的平整，表面需要挂线，仔细找平并要预留一定的碾压下沉量，使其碾压后的高程正好与设计高程一致。预留多少要根据压实度、土质及现场试压来确定，一般 3cm~5cm。掌握好土的含水量，注意挖土区的临时排水挖土时若土过于干硬，则不易挖掘;如土过湿，又易粘在挖运土的工具上。过干或过湿的土都不利于做填方压实。因此做填方用的土、在挖前应掌握其含水量，过干的土事先适当洒水湿润;过湿的土应采取挖前晾晒等措施，使土的含水量接近于填方相应压实机械所需的最佳含水量，然后进行施工。

4、土方大面积露天施工，受气候的影响很大(干旱时土硬，下雨时过湿)，特别是雨天,影响更为严重,因此,要特别注意当地的气象预报、降雨量的大小，作好挖土区的临时排水，并要注意以下几点:

(1)要使挖土区经常保持有效坡度的斜面,利于自然排水,防止下雨积水，切勿挖成凹形盆地。如果确实难以避免，则应采取临时排水措施。

(2)当土较硬难挖时，挖土前先将表层硬土翻松，松土的面积不宜太大，能配合装土、运土、填土即可。

(3)堆土时，堆土的方向和铲运机或推土机推土后所形成的沟槽方向，要与地面的水流方向一致，以利降雨时排水。

(4)保护好样桩，防止机械和车辆碰撞，以免发生差错。

2.4.3 施工区域划分施工

为了便于施工管理，加快施工进度，保证工程顺利进行，需对木工程划分不同施工区域，分别组织施工(具体区域划分详见施工设计图进行)。2.4.4 现场临时道路铺设施工

1、道路应平整、坚实，能满足运输安全要求。

2、道路宽度应根据交通量和运输车辆或行驶机械的宽度确定,汽车运输时，宽度不小于 6m。

3、道路纵坡应根据运输车辆情况而定，机动车不宜陡于 10%。

4、道路圆曲线半径，汽车运输时不宜小于 15m，机动翻斗车不宜小于 8mo5、机动车道路的路面宜进行硬化处理。

6、现场应根据交通量、路况和环境状况确定行驶速度，并与道路明显处设限速标识。

7、穿越各种架空管线处，其净空必须满足运输安全要求，并在管线外设限高标识。

2.4.5 自卸汽车运土方施工

1、场地准备

(1)清除现场障碍，搞好场地平整和围护工作。(2)作好临时道路和现场的排水设施。

(3)设置清洗检查点:专人负责检查及冲洗。

2、施工人员组织和职责

根据运土:情况。成立.专门土方外运领导班组,组长为项目经理,下设冲洗组，保洁组，协调组，检查组，指挥组，各组互相监督，互相协调，统一由项目经理指挥。

(1)冲洗组职责:负责运车辆出场时车轮，车身的冲洗工作;

(2)保洁组职责:负责场地运输道路，土方运输道路掉落土等垃圾;(3)协调组职责:负责协调挖土组，运输队以及周边单位协调关系;(4)检查组职责:负责随时检查，监督，对违规现象及时制止，可采取适当处罚措施;

(5)指挥组职责:统一指挥运输车辆进出线路，确保车辆运输有条不紊。

3、场地运土

(1)出土路线应安排在道路两侧，并安排运土方至弃土场。

(2)场外运输听从统一指挥，按满车先出，空车后进的顺序。

(3)运土车出施工区域后应在第一道冲洗站冲洗，保证车辆无泥土，车身无掉土。

(4)运土车在进入场外道路前需进行冲洗，并检查载土量，不得超载，并用帆布盖严密后，才准驶出工地。

(5)场外卸土要统一运至指定弃土点，不得随意乱丢，乱倒。

(6)根据现场设计最优运送路线。

4、运土要求

(1)运输车辆在场内及场外均需听从统一安排，合理进出。

(2)装土时严禁超载，车厢堆土要平稳压实，大块土或块石应堆载车厢底部。

(3)运输车出场时要进行两道冲洗。

(4)运输车进入清洗检查点前必须用帆布遮盖车厢。

(5)运输线路要听从安排，不得随意改变运输线路。

(6)随时听从城市交警或城管部门安排。

2.4.6 土方填筑施工

1、施工准备

(1)进行中线、高程的复测，放出路堤的边线给出断面图，同时修筑便道和便桥，做好施工准备。

(2)对施工用地范围内的植物、垃圾、有机杂质进行清理，掘除移运和处理，要求清除耕植表土 10~30cm，并运到弃土地点。

(3)排除地表水，设置排水沟、截水沟，保证路基范围内无积水，以免影响路基填筑质量。

2、土方填筑施工方案

(1)路基填筑按技术规范要求进行，先施工软基路段，然后按四区段(填、平、碾、检)，八流程(施工准备测量放样、基底填前处理、分层填筑、摊铺平整、碾压夯实、检测签证、路基整形、边坡修整)施工程序组织。

(2)选择有代表性的地段，作为填土试验区段，根据填料性质和压路机型号，通过试验确定施工参数(松铺厚度，碾压方式，遍数)。优化施工方案，全面展开施工。

(3)根据构造物、机械的生产能力及具体的地形情况划分施工作业区，现场由主管技术人员、队长、施工员具体确定，长度一般为 200~300m 。每一作业区在路基横向上按 50~60m 划分若干个施工单元，每一施工单元内按四区段施工法进行土石填筑、平整、碾压、检验等工序的作业。

(4)每一工序完成后，完成该工序的机械转入下一单元进行同一施工，每一施工单元内不准进行交叉作业。

(5)施工中合理组织机械，使之形成循环流水作业，尽量使循环中全部机械处于良好的工作状态。

(6)由于碾压工序是施工控制的关键,施工中合理配备压路机，并使工序的作业时间大致相等。

3、填土路堤施工方法

(1)基底处理

路基基底根据施工时的地面和土质的实际条件，按设计文件要求进行处理。1)清除地表草皮、树木、垃圾、农作物根系及表土，并掘除树根和拆除路基用地范围内的结构物。

2 路堤填土高度小于 800mm(不包括路面厚度）时，对于原地表清除与挖除之后的土质基底，将地表翻松 300mm，然后整平压实。

3 路堤填土高度大于 800mm 时，将路基基底整平处理并在填筑前进行碾压，压实。

4)地面自然横坡或纵坡陡于 1:5 时，将原地面挖成台阶，台阶宽度不小于 1.0m，台阶顶作成：2%~4%的内倾坡度;砂类土上不挖台阶，将原地面以下 200mm~300mm 的表土进行翻松处理;对基岩面上较薄的覆盖层，先清除覆盖层再挖台阶。

(2)分层填筑

1)路基填筑之前，依据技术标准，压实机械性能、填料土质类别，选择长度大于 100m 的路段，在路基全宽范围内，先作填土压实试验段，确定填层厚度及压实参数，据以指导施工，并将不同填料的试验结果报经工程师批准后，作为施工控制的依据。

2)路基填筑采取横断面全宽，纵向水平分层填筑方式。

3)填土时，根据填土高度及由试验段确定的分层厚度及压实参数，具体确定计划分层数、压路机走行速度、碾压遍数，并绘制分层施工图，在施工中认真控制，随时调整。

4)当原地面高低不平时，从最低处分层填筑，由两边向中心填筑。

5)为保证路肩部位压实效果，路基两侧边坡各超填 0.3~0.4m，路基压实合格后刷坡整平。

(3)摊铺平整

路基填筑区段完成一层卸土后，用推土机和型平地机进行摊铺平整，使填铺面在纵向和横向上平顺均匀，在摊铺的同时，对路基进行初步压实，以保证压路机压到路肩时不致发生滑坡。

(4)含水量控制

用细粒土填筑路基时，必须严格控制填料的含水量，要求其不超过最佳含水量士 2%。当含水量太低时，在表层洒水并尽可能地搅拌，待提高含水量后碾压;

当含水量超过规定时，先翻松晾晒，待降低含水量后再摊铺碾压，填层厚度可适当减薄。在洒水或晾晒时，前后的施工单元可交叉施工。

(5)机械碾压

1)路基的压实在填土层的松铺厚度、含水量及平整度符合要求后，采用重型压路机。

2)碾压时遵循先轻后重，先慢后快原则，检测压实度等合格并经监理工程师批准后方可进行下一层的施工。压实路线:直线和大半径曲线地段，先压两侧后压中间，小半径曲线地段由内侧向外侧，纵向进退式进行。

3)横向接头，振动压路机一般重叠 40～50cm，前后相邻两区段重叠 2.0m.做到无漏压、无死角和确保碾压均匀。施工中正确规定行驶速度以提高压实效果,压路机最大行驶速度不超过 4km / h.

(6)检验签证

在填料质量、填筑厚度、填层面纵横方向平整均匀度等符合规定标准的基础上，进行压实度测定，没有达到标准地段，不予签证。

(7)路基整形

路堤按设计标高填筑完成后，进行平整和测量。(8)边坡整形

细粒土边坡，依据路肩边线桩，用人工按设计坡率挂线刷去超填部分，进行整修拍实。整修后的边坡达到转折处棱线明显，直线处平直，曲线处圆滑。

4、半挖半填及填挖交界路基处理方法

半填半挖及填挖交界路基,对纵向填挖结合部，挖方段设置不小于 10m 长过渡段，横向半填半挖结合部，挖方段沿行车道及硬路肩宽度范围内将原状土翻挖。首先将原地面挖成宽度 2m 的台阶，台阶顶面作成 3%的内倾斜坡，再进行路堤填筑。

5、高路堤填方施工方法

高填方路堤是路基施工中的重要环节，施工中需精心组织，精心施工，确保工程质量。

(1)施工前，对原地面进行清理后进行碾压，压实度达到 90%以上，并经工程师检查验收后，进行填土作业;软基地段必须按设计要求处理彻底，并经工程师认可后方可进行填筑。

(2)高填方路堤要严格控制石料的最大粒径，石料的最大粒径在底层不超过分层厚的 2/3.

(3)高填方路堤采用分层填筑、分层压实的方法施工，一层厚度不超过 30~40cm。填筑时一定要按路堤高度和边坡度将该层的路堤宽度(包括加宽量)补足，以免影响压实质量。设计路基填料采用易风化泥质砂岩，施工中合理确定分层厚度，确保压实质量。

(4)高填路堤填筑过程中进行沉降观测，为预留沉降量提供依据，施工完成后，定期进行观测，以检验施工效果。

2.4.7 其他要求

1、环境管理措施

((1))砂浆搅拌应设沉淀池，污水经沉淀后才用排污车集中拉走。2 落地灰和垃圾应及时清理，分类堆放，并装袋或封闭清运到指定地点。现场严禁抛掷砂子、白灰。

2、安全管理措施

(1)施工前编制专项安全技术方案，并对施工管理和操作人员进行详细安全技术交底。

(2)砌筑高度超过 1.2m 应搭设脚手架。向脚手架上运块石时，严禁投抛。脚手架上只能放一层石料，且不得集中堆放。

(3)人工搬运石料时，作业人员应协调配合，动作一致。

(4)砂浆搅拌机、起重设备、切割机具操作和临时用电应符合有关安全用电使用管理规定。

2.5 排水管道施工方法

1、施工准备

开槽前要认真调查了解地上地下障碍物，以便开槽时采取妥善加固保护措施，根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查，统计出现况地下管线情况，采取有效措施加以保护。

2、测量放样

(1)沟槽开挖测量

1)沟槽开挖前根据设计及施工方案进行中线定位，采用极坐标法测放管线中线时，在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。

2)管线中线桩每 10m 一点，桩顶钉中心钉，并在沟槽外适当位置设置栓桩;根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位置线，现场撒白灰线标注，然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩，每对高程桩上钉一对等高的高程钉。高程桩的纵向间距为 10m。

3)开挖过程中，核对中线、高程、坡度、沟槽下口线、槽底工作面宽度等进行检测，并在人工清底前测放高程控制桩。

4)沟槽检底后，依据定位控制桩采用全站仪投点法向槽底投测管线中线控制桩;采用水准仪将地面高程引至槽底。

(2)井室开挖测量

井室开挖与沟槽开挖同时进行，根据井室桩号坐标采用极坐标法测放井室结构中心位置，根据井室尺寸测放结构开挖上口线及开挖高程控制桩，同时进行栓桩。

3、沟槽开挖

挖方段挖至设计高程;填方段达到管顶上 50cm 应及时进行雨污水工程的施工。

((1))沟槽开挖采用人工+机械进行开挖，槽底预留 200~300mm 土层由人工开挖至设计高程。开挖过程中严禁超挖，以防止扰动地基。对于有地下障碍物(现状管缆等)的地段，由人工开挖严禁破坏。

(2)当管道埋深大于 3 米时，采用分层开挖，每层深度不超过 2 米，层间工作平台宽度不小于 0.8m。

(3)沟槽开挖应从下游向上游方向开挖，以利于沟槽排水。挖土应自上而下、水平分段分层进行，边挖边检查宽度及坡度，不够时及时修整，至设计标高后再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽及标高，要求坑底凹凸不超过 1.5cm。

(4)挖槽土方处置:按现场暂存、施工范围线外暂存、外弃相结合的原则进行。开挖土方凡适宜回填的土，均要选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量等标记，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前，制定合理的土方调配计划，按照做好土方平衡、少土方外运、现场土方调运的原则进行处置。

(5)开槽后及时约请各有关人员验槽，槽底合格后方可进行下道工序施工。如遇槽底土基不符合设计要求时，及时与设计、监理单位联系，共同确定基底处理措施。处理完成后，方可进行下道工序施工。

(6)进行沟槽开挖过程中，弃土应及时外排，在沟槽边缘上侧临时堆土宜过高;堆放材料以及移动施工机械时，应与沟槽边缘保持 1m 以上距离，以保证边坡稳定。尽量避开雨天施工，加强施工观测，确保边坡稳定安全。

3、质量管理体系与措施

1、质量目标


本工程的质量目标：工程符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。

2、工程质量管理机构及质量保证体系

本工程按项目管理模式组织施工，推行项目经理负责制。为确保项目的质量，项目经理部将建立质量管理机构和质量保证体系。质量管理机构负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量保证体系负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

1）质量管理机构

我公司将本工程作为重点工程，由总经理组织项目管理班子，任命副经理和项目部主要人员，成立以项目经理为首的质量管理机构。

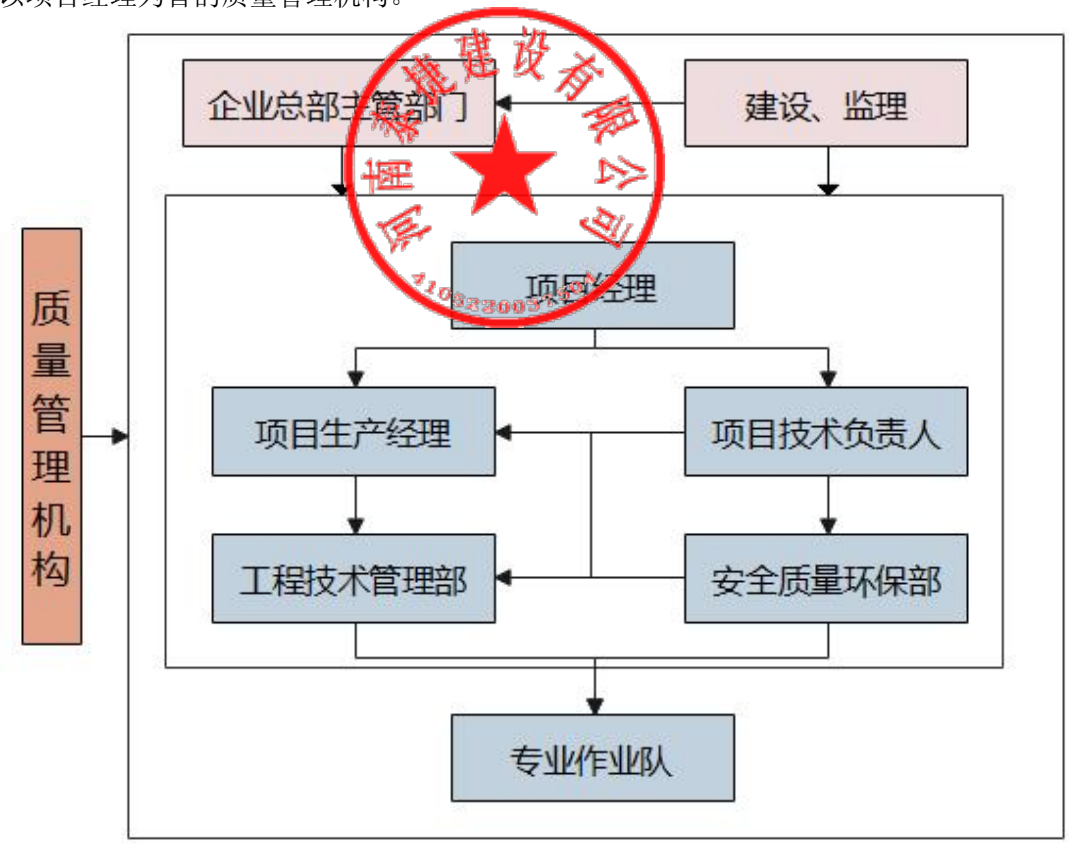

2）工程质量管理职责

项目经理

序号	质量管理职责—项目经理
1	对所承担项目的工程质量全面负责。 在项目上认真贯彻公司质量方针和质量目标，保证质量体系文件在本项目部的有效运行，全面履行工程承包合同中所规定的各项责任，确保项目管理目标的实现。
2	负责组织、领导、监督、检查各职能部门。 对本工程的质量进行策划、制定项目质量目标，明确项目质量管理，执

序号	质量管理职责—项目经理
	行验证等人员的职责和权限。
3	负责建立项目组织机构和各职能部门人员的安排，并规定其职责范围。
4	负责项目部接受质量体系审核的准备工作，参加管理评定。
5	负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要领导责任，对质量有奖罚权。
6	指导工程部对合格施工队伍进行选择评价，负责组织对合格施工队伍的管理。
7	负责本工程资源的组织、配置，根据授权进行项目的经营决策，制定项目管理文件，组织竣工验收、交付。

项目副经理

序号	质量管理职责—项目副经理
1	负责经理部的生产管理及所属各单位的施工生产和协调工作，向项目经理负责，协助项目经理做好工程质量管理工作。
2	组织落实项目实施性质量计划和工程创优规划，按合同要求确保工程质量、工期目标的实现。 履行工程质量的策划，组织质量审核，落实纠正措施，及时推广保证工程质量的先进方法。
3	贯彻实施工程质量、环境、健康安全一体化管理体系的方针和目标，履行工程承包合同，实施项目一体化管理体系，对施工生产和分管的工作负责。
4	督促、检查项目部各部门、所属各单位的各项工作，确保项目部生产、管理、发展计划的实施和完成。
5	定期检查项目一体化管理体系运行情况和运行效果，发现问题及时组织评审。
6	配合公司一体化管理体系内、外部审核。 对审核中发现的不合各项，认真制定纠正和预防措施，在限期内落实整改。 负责对本项目部的质量职责的执行情况进行监督、检查。

技术负责人

序号	质量管理职责—技术负责人

序号	质量管理职责—技术负责人
1	负责监督落实国家与行业的各种技术文件、规范及公司质量体系文件在本工程的实施。
2	参加项目的质量策划。
3	负责组织、编制、审批项目部的质量保证计划、施工组织设计和各项施工方案，并监督执行。
4	根据项目质量情况，进行分析、制定纠正和预防措施。
5	负责在施工中对本工程的技术、质量、测量、试验工作进行管理，对项目质量检验计划和项目试验计划进行有效性及可行性审核。
6	负责改革和推广新技术。
7	组织技术及施工人员审图，参加图纸会审，编制工程施工组织设计及主要施工方案。
8	组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施情况和进行验证。
9	负责收集整理保存建档相关的技术资料、文件图纸。
10	负责项目部测量和试验设备的管理工作。
11	负责对项目部检验和试验状态进行监督管理检查。
12	负责工程施工过程中发生的重大设计变更。
13	负责在工程施工中的原始资料、文件的积累。

施工技术专业工程师

序号	质量管理职责—施工技术专业工程师
1	参与施工图的会审工作，严格按施工图、规范、标准、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，做好各分项、分部工程的书面技术交底工作。
2	要把施工规范、标准、规程、质量规划、施工措施，通过技术交底向施工班组交待清楚，并在实施中认真检查落实。
3	对施工的测量、定位、标高及定位线等负有直接责任。
4	负责自检、互检、交接检的督促工作，负责隐蔽工程的检查和验收批验收工作。
5	协助技术负责人组织有关人员学习和推广新技术、新工艺、新材料的应用

序号	质量管理职责—施工技术专业工程师
	工作。
6	经常检查各施工班组的施工操作情况，对违反规范、标准、规程、技术措施者，有权制止并责令返工或停工。
7	协助质量专业工程师开展工作，掌握施工项目的全部质量状况，参与本工程的定期质量检查。

质量专业工程师

序号	质量管理职责—质量专业工程师
1	贯彻执行国家有关规范质量检验评定标准和公司质量部下发的各项文件。 贯彻项目部质量体系文件，项目质量保证计划，负责健全项目质量保证体系。
2	按国家施工规范、标准及有关规定，独立行使质量检查、监督权。
3	做好质量记录和隐蔽工程验收签证手续。
4	协助有关生产管理人员，做好日常质量检验和评定。
5	填好各分项工程的质量自检表，并做好自检质量等级评定工作。
6	向技术部门资料员定期送交完整的已签资料手续。
7	监督检查各施工队，在施工过程中执行质量计划情况。
8	落实工序隐检，负责核定分项工程质量评定。
9	督促施工队落实三检制，组织项目部的工程质量检查。
10	负责办理工程开工报告，施工许可证等有关事项。
11	负责向监理单位呈报日进度报表，周进度报表。
12	参加一般质量事故分析，监督检查措施实施情况，并进行验证。

材料员

序号	质量管理职责—材料员
1	负责监督检查并参与对材料供应方的评价选择和变更，建立材料供应方名录，确保工程材料采购工作处于受控状态。
2	负责组织项目材料采购策划，编制物资月度采购计划。 对进场和在场材料的质量、规格、数量采取相应管理措施，及时收集所购

序号	质量管理职责—材料员
	物资的质量证明和试验报告。
3	负责组织对进场材料进行验证，监督检查物资的标识及可追溯性的标识记录。
4	负责组织对进场材料进行验证，并上报监理单位。
5	负责组织对主要材料成品、半成品的搬运和贮存。
6	负责在工程施工过程中与监理单位办理申报、审批报表等签认手续。
7	负责按时向上级主管上报有关报表和资料，定期组织自检项目部材料管理方面的工作落实情况。
8	按计划经济合理地组织好所需材料的采购及定货业务活动，保证所购材料的质量，确保施工生产的正常进行，降低材料采购成本。
9	加强施工现场管理和仓库管理，严把验收关，严禁不合格物资进行进入施工现场。
10	加强定额用料管理，实行限额供料，抓好施工用料的节约，监督材料使用，使材料成本消耗在最低标准上。
11	加强周转材料的管理，实行统一租赁，制度化、标准化。

试验专业工程师

序号	质量管理职责—试验专业工程师
1	负责配合技术及生产部门做好材料检验和试验工作，保证试验结果的科学合理、真实可靠、准确及时，为项目组织施工生产提供科学有效的依据。
2	负责按施工规范要求编制切合工程实际的试验计划，并交给技术负责人审核其合理性、可行性及可操作性后认真执行。
3	负责按工程施工进度，及时收集、整理原材料合格报告及试验性质保资料。

测量专业工程师

序号	质量管理职责—测量专业工程师
1	负责配合技术及生产部门做好所有的工程测量工作，保证测量结果的科学合理、真实可靠、准确及时，为项目组织施工生产提供科学有效的依据。
2	负责按施工规范要求编制切合工程实际的工程测量专项方案，并交给技术

序号	质量管理职责—测量专业工程师
	负责人审核其合理性、可行性及可操作行后认真执行。
3	负责做好工程施工的定位放线工作，提供准确无误的各种施工标志（线、标高）。
4	负责对施工班组的测量及配合工作进行正确的指导、校正、评定和验收。
5	负责正确使用和妥善爱护、保养好测量仪器。

专业作业队班组长

序号	质量管理职责—专业作业队班组长
1	组织学习规范，熟悉图纸（交底图）、标准工艺，以身作则，不违章指挥，坚持“管施工的必须管质量”。
2	处处起带头作用，督促引导班组人员进行标准化作业，文明施工。
3	发现质量事故时立即理解图纸、标准，分析达到要求的可能性和存在问题。 严格“三按”（按图纸、工艺、标准）做好自检自查，参加调查、分析、处理、纠正。
4	负责向本班工人讲解技术交底，使全体人员掌握标准及应注意的质量事项。
5	坚持均衡生产，正确处理质量和进度的关系，不得为赶任务而不顾质量。

专业作业队岗位工人


序号	质量管理职责—专业作业队岗位工人
1	严格按照操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。
2	出现质量问题应及时向班组质检员、技术人员反映。 参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。
3	努力学习质量管理知识，积极参加 QC 小组活动。

3）质量保证体系

我司将认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，坚持“管施工必须管质量”和“谁主管谁负责”的原则。

运用全面质量管理手段，加强质量保证工作的领导和管理，建立管理层与作业层，专职与兼职相结合、全过程管理、全面管理的质量监控网络。

同时，配备富有施工经验、熟悉规范和设计，责任心强、敢于坚持原则的技术人员担任本工程的质量检查人员。

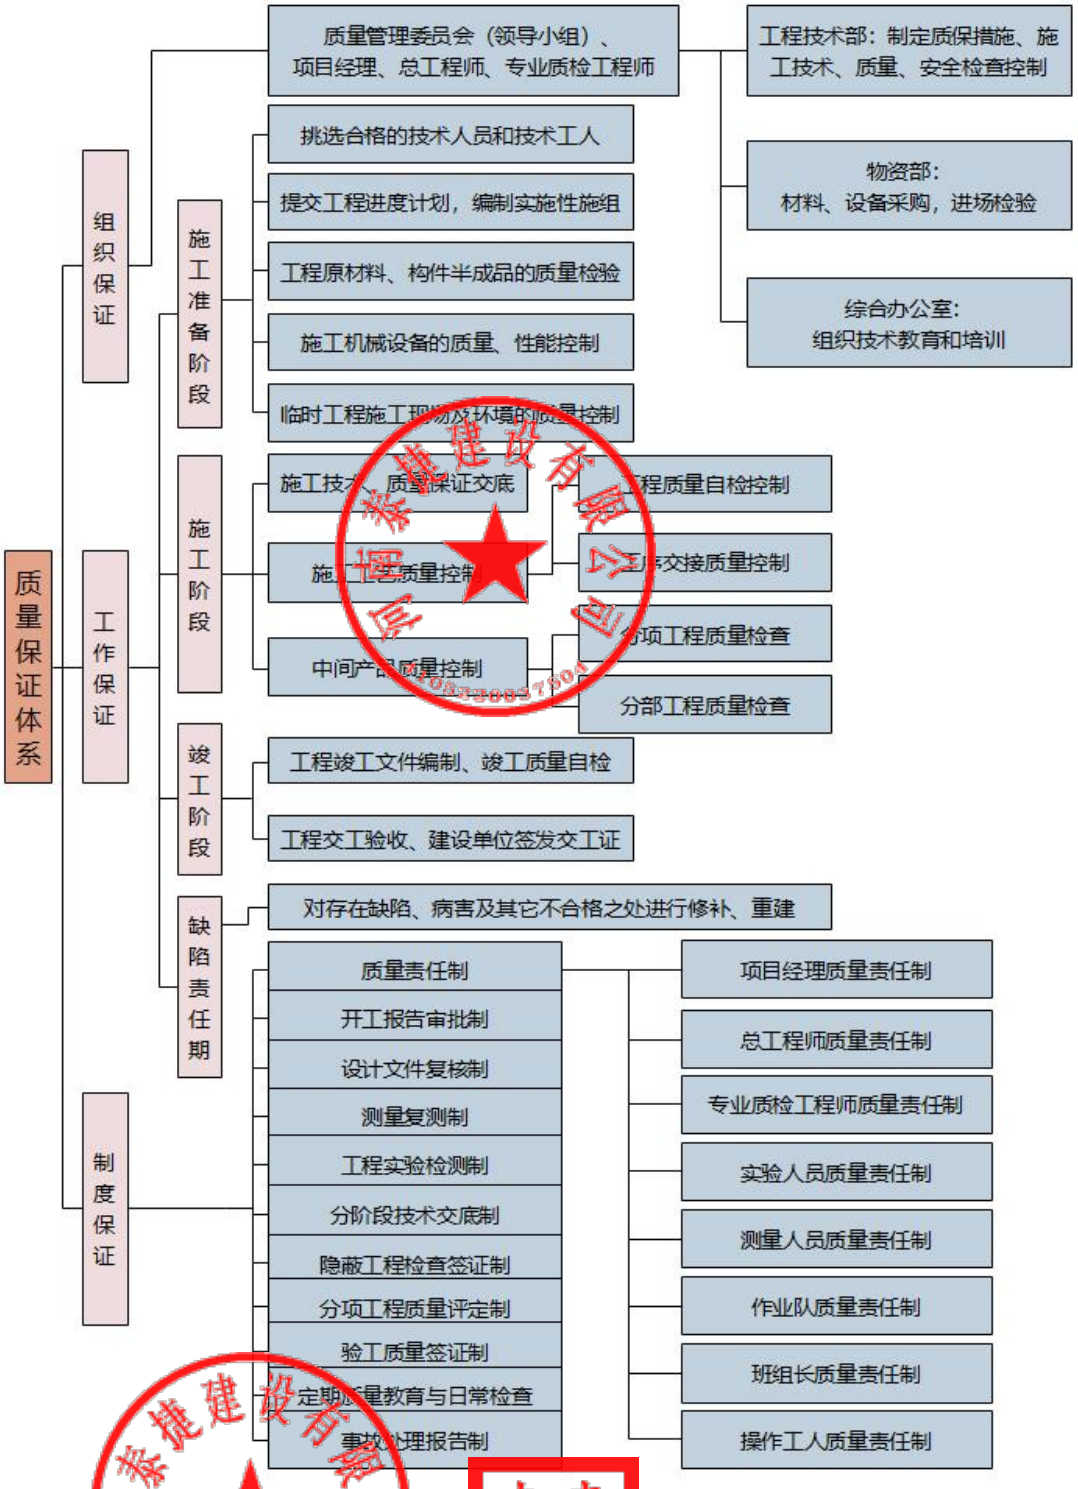

4）质量保证体系管理措施

①加强质量体系教育工作

②建立全面质量管理体系

③执行质量管理制度

④原材料采购质量管理

⑤加强技术培训和技术攻关。

⑥积极开展QC小组活动：结合工程施工特点和实际情况，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决工程施工中的关键质量问题，在保证工程质量优良的同时提高经济效益。做好质量管理小组的活动组织、开展以及成果推广总结工作。

质量保证体系管理措施	
1、材料进场检验制度	
1	认真把好材料关，做好原材料进场检验，加强对所有原材料、半成品进场的质量检测工作。
2	所有进场材料、成品及半成品必须具有出厂合格证，并根据国家规定要求分批量进行抽检，抽检不合格的材料一律不准使用，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收保管的责任。
3	对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等状态进行分种类堆放，严格保管，避免勿用不合格的材料。
4	对不合格的物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料和处理，应建立台账。
2、技术交底制度	
1	每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目技术负责人对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。
2	各级交底以书面形式进行。
3	因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。
3、样板引路制度	
1	施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序操作水平，确保操作质量。
2	每个分部分项工程或工种都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。
3	在重要分部工程，组织施工人员观摩，让施工人员明确质量标准，做到心中有数。
4、质量否决制度	
1	对不合格分部分项和单位工程必须进行返工。
2	不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究法人和

<table>
<tr><th colspan="2">质量保证体系管理措施</th></tr>
<tr><td></td><td>项目经理的责任。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>责任人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、成品保护制度</td></tr>
<tr><td>1</td><td>应当像重视工序的操作一样重视成品的保护。加强成品保护工作，是保证交工质量的一项重要内容。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>各专业负责人在技术负责人的领导及和质量工程师的统一协调下研究细化成品保护的组织管理模式、有关的规章制度以及具体的保护方法方案，负责本专业的所属劳务、分包单位的成品保护工作的监督管理。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>每日巡查过程中将成品的监护当作一项重要的和主要的工作。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>加强对职工的质量和成品保护教育，树立工人的保护意识，使其在操作和搬运、行走过程中相互监督，自觉维护。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>除在施工现场加设标语外，在必须注意进行保护的成品处标写醒目的警示，唤起来往人员注意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、过程三检制度</td></tr>
<tr><td>1</td><td>项目质量过程控制严格落实三检制度，它包括自检、互检和交接检。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>“三检制”要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用， 把施工现场质量管理工作的重点从“事后把关”转移到“事前控制”，做到防检结合，实行对工序严格把关，把质量问题消灭在施工过程中。</td></tr>
<tr><td colspan="2">7、工程技术资料管理制度</td></tr>
<tr><td>1</td><td>工程技术资料与工程施工同步，从工程施工准备工作中的文件材料的积累、整理、审查工作，到工程竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>项目资料员应严格执行工程技术资料的填写制度，对收集的施工技术资料的完整性、准确性负责。工程技术资料由与资料相关的部门或责任人提供。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>凡提供资料的部门及责任人必须及时向资料员提供与施工同步进行的资料，资料员及时分类整理归档，并向技术负责人汇报，由技术负责人审核。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>利用微机建立图档目录和追索管理程序，提高图档管理的时效性、完整性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">8、工程质量奖惩制度</td></tr>
</table>

质量保证体系管理措施	
1	各专业班组及分包单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标的给予奖励。
2	分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的给予处罚。处罚额度按照双方约定的合同条款执行。
3	进场材料把关严格、保管、发放等管理好的，原材、半成品控制严格，给施工质量创造了良好的基础，按双方合同约定给予奖励。
4	物资把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。
5	不按图施工，违章操作，造成返工的根据损失大小给予加倍处罚。
9、计量管理制度	
1	按施工工艺计量网络图、质量检测计量网络图配齐计量器具。
2	国家规定强制检定的计量器具必须 100%按时送检，其它计量器具也应按计划按时送检，周转送检率不得低于 90%。在周检的基础上，按时进行抽检10%，并作抽检原始记录。
3	计量器具统一建卡，分发给专人保管，并由计量管理部门统一调配。
4	原材料检测要及时做好记录，发现量差超过正负公差范围时，要立即通知有关部门和人员进行处理。
5	试验人员每季度要对试验仪器进行一次抽查，维修及保养，无证人员不得使用仪器设备，各种试验要按其试验程序及标准操作。
6	现场测量组每季度要对所用测量仪器进行抽查、维修及保养。在测量前对仪器要认真校核，按测量步骤做好原始记录，及时消除测量中各种因素造成的误差。
7	计量器具的保管，使用人员必须按其说明书正确使用，精心保养，妥善保管。使用完毕应擦拭干净，对量具量仪的测量面和刻度不得用油石、砂纸等硬物擦拭；非计量人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具；对较贵重的计量器具，其存放应符合有关规定要求。
10、培训上岗制度	
1	工程所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗，履行岗

质量保证体系管理措施	
	位责任制。
2	因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任外，还要追究企业主管领导的责任。
3	用严格的约束机制和奖罚机制来完善强化质量管理工作。
11、质量事故报告、调查及处理制度	
1	工程发生质量事故，立即向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作。
2	按照“四不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。

4、安全管理体系与措施

(I)安全管理机构

成立以项目经理为首，有施工员、安全员、技术员、班组长等参加的安全生产管理小组，检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行，做好安全日检记录，并对违反安全规定的人员进行处罚。以公司安全生产副经理及质安部成员组成公司安全管理领导小组，负责安全施工保证体系的管理，检查组织对安全隐患的突击检查。

工地安全管理小组，由项目部主管安全生产的负责人担任领导，负责工地安全施工管理，并由专职安全督导员负责具体安全事务的监督。班组施工管理兼职安全员，负责指挥班组工人的安全施工。

(II) 安全管理制度

1、项目经理、生产和质量副经理、安全监督员、施工工长、安全员必须按照各自的安全技术管理职责，进行层层安全意识教育和安全技术交底。实行安全工作纵向到底、横向到边、责任到人、目标到岗、专兼职检查结合，杜绝重大事故发生。

2、安全监督员是现场的安全执法人员，所有施工人员必须接受其监督检查，在安全与生产发生矛盾时，实施安全一票否决制。

3、项目经理和工长是现场安全施工的主要管理层，对所管分部工程的安全生产负直接责任。必须经常检查施工现场环境安全和安全防护设施，巡视作业点的安全情况；不违章指挥，制止违章作业，并组织职工安全技术学习，提高职工安全意识和预防事故能力。

4、所有施工人员必须认真贯彻执行国家和行业的安全方针、政策法规和法令，严格实行分公司制定的现场安全生产奖惩办法。

5、项目经理部每月组织一次安全检查和安全评议活动，对检查中发现的问题，要进行批评教育，并下发整改通知书，即时整改。对安全工作执行好的班组和个人，要给予表扬和奖励。

(III)安全管理体系

1、严格执行国家、省、市劳动安全条例及公司制定的各项安全施工保证措施，全面贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，杜绝安全事故发生。

2、建立健全各级各部门安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。项目与班组之间必须签订安全生产协议书。进行全面的、有针对性的安全技术交底，履行签字手续。特种作业人员必须持证岗。建立定期安全检查制度，查处隐患及时整改。

(IV)安全管理措施

1、组织措施

由主管现场施工的人员负责安全工作，配备专职安全管理员，各班组建立安全员值日制。加强现场安全宣传力度，提高施工人员安全意识。

在实际施工中认真执行国家有关安全生产的各项政策和规定，同时执行项目管理组制订的安全生产管理制度和纪律，规范安全施工行为。

建立谁负责施工、谁必须管安全的制度。在安排施工任务的同时安排好相应的安全措施。在制订每一项施工方案时，也制订相应的施工安全措施。坚决做到不安全项目暂缓施工，待做好安全防护后再施工的原则。

在施工区域内吊装设备和材料时，除明确标出“危险区域”的范围外，还要有专人负责指挥，指挥明确，信号清晰响亮，配合密切，以免发生错误操作，造成安全事故。在任何情况下，不允许发生超载冒险吊装的违规作业，以保安全。

一切登高设施，包括脚手架等，搭设后进行检查，重要的还应办理验收手续，施工定期检查、保养和维修，不能随意乱拆乱改，以防产生事故。在管道进行立体交叉作业时，做好可靠的隔离措施，防止上面的施工人员跌落。

施工现场的临时电力系统，严禁利用大地作相线或作零线。所有电气设备和机具除作保护接零外，必须在设备负荷的首端处设置漏电保护装置，以保用电安全。

重视施工现场的安全防火，制订切实有效的防火措施，杜绝一切隐患。 对危险品的存放应设专用仓库； 在易燃的保温材料区域施工。不能随意动火割和电焊；需有防火措施；在上部动火气割和焊接时，需先清除下部易燃物品。

2、技术措施

严格执行安全交底工作，每道工序开工前，由安全员负责向班组进行安全交底，坚持安全日检，发现隐患及时处理。

现场施工人员必须配备并使用各种安全用具，严禁冒险作业。基坑(槽)边设置防护围栏、悬挂警示红灯、安全标志，夜间施工增加路灯照明，并派专人维护交通，指挥施工现场车辆安全运行。

加强各类机械操作人员的安全教育工作，严禁无证上岗、酒后开车。进入现场的施工车辆，必须“三证”齐全。

对施工场地原有各种管线，在施工前，应调查清楚，并做好保护工作，避免在施工中遭到损坏。

施工基地必须配备灭火装置，且每月检查一次，要求全体人员都能正确使用。工棚内严禁吸烟，严禁乱搭乱接电线。

进入现场工作的电工，必须持有“电工上岗许可证”，对所有电器设备定期检查，严格遵守用电安全规程。电工房应配备必须的消防设备。

加强施工现场安全保卫工作，公司安全科随时监督检查。根据分部、分项工程的特点，分别制定安全保证措施，建立健全各项规章制度，并认真贯彻执行，落实劳动保护措施。

3、防火措施

(1)工地防火负责人

施工现场设立临时消防机构，项目经理为工程防火责任人，班组长为所在班组的防火责任人。工地设有安全防火监督员，负责防火安全管理工作。

公司将经常组织各级防火责任人巡场，不定期进行防火安全检查，及时发现隐患，堵塞漏洞。

(2)灭火器材的配备

每个施工班组均配备足够灭火器以应急需。

根据施工现场的工具房、材料仓和危险品仓堆放的物资性质和数量多少，配备不同类型的足够的灭火器材。

(3)重点防火区域

班组工具房、仓库、危险品仓、施工动火点。

搭设临时设施需按规定向有关部门办理报建手续。

在工地适当的地方设置吸烟区，严禁人员在施工现场随意吸烟和乱丢烟头，以免留下火种隐患。

(4)实行动火证制度

施工中需要动火、烧焊时，必须按照动火审批制度申报办理动火证，经有关部门批准后方可动火，动火过程中要严格执行动火安全技术措施，配备灭火器材和设专人看火监护，动火完毕需认真检查，消除隐患。

严禁使用电炉和没有完全保护外罩的碘钨灯，大容量照明灯具要距离易燃品 1.5 米以上，且需装置牢固。

工地设置市内电话或配备手提电话，一旦现场出现火灾，除组织人员积极扑灭外，还可及时拨“ 119”报警。

(V)治安保卫措施

1、我公司拥有一支健全的保安队伍，它由多名保安和多名纠察组成。他们分布在各个工地值班，对重点部位，如材料仓、工具房、配电房、水池、设备用房、贵重器材安装点、堆放电缆的地方等，加强值班、巡逻力量。公司保卫部门经常派出人员对各工地巡逻。

2、工地现场值班保卫人员必须履行职责，忠于职守，敢于制止不良现象的发生，对突发事件有迅速处理的能力和措施。

3、视实际情况需要，项目经理有权增派值班保卫人员。

4、本工程开工后，项目经理部即与公安和消防部门联系，以便工地一旦发生案件或火警，均可直接与公安或消防部门联系，及时报警。工程与城管、公安部门联合共建，更为工地现场的保卫工作增加力量和保障。

(VI)机械操作安全措施

1、所有机械操作人员保证持证上岗，坚持上、下班。班前班后的检查工作，发现问题先处理完善再进行使用。

2、定期检查机械性能、设备、设施配件。

(VII)用电安全措施

1、施工现场所有电线线路按“三相五线制”标准架设。所有供电终端严格执行一个插座配一个开关和漏电保护装置。

2、劳务工人、办公区内使用的照明均采用低度、适宜的灯泡，杜绝使用电炉。

3、一切机电设备均安装避雷装置和漏电开关；定期检查好线路、漏电开关，以保证不因线路、开关漏电而发生安全事故。

(VIII) 行车安全保证措施

1、交通道路应平整、清洁，排水系统畅通；坡度、转弯半径、错车道、路牌、路标、照明均应按相应的等级设计；

2、做好驾驶员、交通指挥员的安全技术培训，加强专业技术培训；

3、车辆定员、定人，并认真按当地交通法规对驾驶员进行约束管理；

4、严禁不良车况车辆上路；

5、交通道路设指挥员；

6、坚持车辆的日常保养和三修制，确保上路车辆良好；

7、主要路口设立警戒标志。

(IX)临时及辅助工程安全保证措施

1、临时工程施工中要防止对环境的污染和破坏，施工、生产和生活中产生的废水、废气和废碴均达到国家规定的排放标准。

2、为施工服务的临时道路的施工组织设计或设计说明施工。经竣工检查合格后，方可使用。单车道根据车辆需要和地形条件，设置会车道。

3、维修临时道路应在施工地段的两端设立安全警告标志；夜间施工设灯光警告标志。

4、临时房屋做到结构简单、牢固、适用、经济并根据地区特点，达到防火、防洪、防暑的要求。每栋间距符合有关规定，设置消防设施。

5、动力电源和照明电源分开布设，现场所有用电设备的安装、保管和维修应由电工专人负责。

6、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。

(X)人身安全管理办法

1、制定工作安全管理制度。

2、新工人必须经过三级安全教育，提高安全生产意识。

3、以工地所有工人进行安全教育和培训，未经安全生产教育培训的工人不得上岗作业。

4、工人进入施工现场必须带安全帽，不准穿拖鞋。

5、严格遵守劳动纪律，工作时间不准聊天、嬉笑、追逐、打闹和干扰他人劳动，不准携带亲友和小孩进入施工现场。

6、工人上班前不准喝酒。

7、管理人员、特种作业人员必须经过劳动部门培训考核，合格后持证上岗。对电工、焊工、安装工、机械工人进行针对性的培训。

8、夜间作业要有足够照明和坑洞的红灯警示，工人不得超负荷工作。

9、对不同工种的工人，根据工作需要，分别供给不同的防护用品。

(XI)安全生产应急预案

根据施工现场的特点及环境条件等具体情况，施工过程中可能出现的危害及危害程度，制定出符合实际、行之有效的应急救援预案。一旦遇到突发事故或事件，立即按本方案组织人员救援、疏散，并从人力、物力、交通工具、通讯设施等给予保证和支持，以防止突法事故(事件)的危害扩大。从而减少损失，保证人员的生命安全。

1、 应急预案的组织措施

施工现场成立由项目经理任组长、技术负责人任副组长的应急联动领导小组，确定应急抢险人员名单。上述人员必须经培训掌握应急救援知识。

进入施工现场作业的人员，必须先进行应急预案教育，使其掌握报警、应急抢救及应急自救知识。各分项工程施工技术交底应包含应急预案知识。

施工现场所有人员应熟悉报警求救电话(如：110、119、120 等)和报警知识，并明确发生险情时的报警信号、撤离信号、撤离路线及掌握受困的应急自救手段及知识。

定期召开由建设单位、监理单位参加的应急联动联系会议，相互沟通、协调，最大限度的防患于未燃。

2、应急预案内容

本应急预案对施工过程潜在事故和常见事故或突发事件进行分析并提出 采取控制事故的措施。事故或事件突然发生后，现场应急联动预案救援小组成员应按本应急预案的基本应急程序及相应专项应急程序启动，紧急抢险救护，以保证人员安全并有效控制紧急事件的发展并尽可能消除，将事故对人、财产和环境的损害和影响减少到最低限度。

3、基本应急程序

施工现场必须按审定的施工平面布置图设置。临时施工用电按临电方案要求敷设。施工现场应备有足够的消防器材，灭火装置有效率应 100%；消防通道、安全通道应布置合理且有明显标志。现场备有足够的抢险救援器材，如：钢管、扣件、木板、砂袋，挖掘工具、空压机、输气管、绳索、铅丝及通讯器材等。

一旦发生上述事故，发现者立即大声呼喊，喊明出事位置及何事。应急救援小组组长任现场指挥，组织应急抢险人员按应急预案实施抢 险救援。如组长临时不在现场，则由副组长任指挥，组织实施。立即打电话上报公司主管领导，同时向 110、119、120 求助。疏散人群、控制事故影响区，电工驻守配电房。如需要，立即切断电源。尽快抢救被困人员或伤员，疏通道路，以利 110、119、120 救援人员进入。专人作好每一步应急行动记录。

4、常见应急措施

(1)塌方或井下作业人员中毒。应急措施：

现场组织抢救的同时，立即向 119、120 报警求援。现场进行有效的支护。

如塌方造成人员受困，抢救人员拴上保险绳，尽快手工挖去泥土，露出受困人员头部及胸部，并立即送氧，保证受困人员生命安全。如井下人员中毒，应立即用空压

机向下送风，不可盲目下井救人。疏通道路，以利 119、120 抢险救援人员进入。并按救援的要求配合作 好抢险救援工作。

(2)高处坠落、物体打击、机械伤害应急预案：现场如发生高处坠落、物体打击、机械伤害事故，应根据伤者伤势情况，立即送就近医院或向 120 急救中心求救措施；送医院途中，应求助交警疏通交通或警车开道，争取抢救时间。

(3)触电事故应急预案：现场如发生触电事故，立即切断电源，抢救伤者。如伤者停止呼吸，应立即进行人工呼吸抢救，同时向 120 急救中心求助。

(4)模板支撑架跨塌、脚手架跨塌应急预案

1)现场如因立杆失稳或扣件断裂等原因致使模板支撑架或脚手架跨塌，最发现险情者要大声喊叫，叫明某地点或某部位发生跨塌，以利受影响区域人员尽快撤离，同时报告应急小组负责人。

2)急救小组组长或副组长负责现场总指挥组织抢险，由安全员打电话向 110 、119、120 求助。

3)切断影响区内电源。

4)如有人员受困，首先抢救受困人员，同时用钢管加固相邻受影响的支 撑架体，防止联动跨塌。

5)拉出影响区警戒线，严禁无关人员进入或围观，同时疏通交通，以利 110 、119、120 抢险救援人员进入现场抢救。

(5)大型机械设备事故应急预案

1)施工现场如发生大型机械设备事故，应立即切断设备电源，撤离操作人员。如人员受伤受困，立即进行抢救并向 120 求救。

2)立即电话通知设备处负责人及公司主管领导。

3)封闭现场，防止无关人员进入围观。

4)将伤员送附近医院抢救，途中请求交警疏通交通或警车开道。

5)疏通道路，以利抢险人员或 120 急救中心人员进入抢险救助。上述事故发生后，均应立即向公司主管领导报告。

(6)施工现场消防应急预案

施工现场必须配置足够的消防器材。施工现场一旦出现火情，应急联动小组成员及现场职工按照此应急预案实施，迅速及时的将火扑灭或控制火势，以免造成灾害性事故。

1)最先发现火情的人员要大声呼喊， 喊清某地点或某部位失火，并告知义务消防队负责人，消防队长担任现场总指挥，负责组织灭火。

2)由安全员打电话通知 119、120，报告失火地点、火势，同时上报公司主管领导。

3)切断影响区内电源。组织义务消防队员用灭火器灭火。用消防桶提水灭火，并用消防钩隔断火源，用铁铲铲砂灭火等自救。受困人员迅速从消防通道撤离。

4)疏通消防通道，隔断围观闲人，以利消防车进入现场抢救。

5)配合 119 消防人员抢险灭火或抢救受困人员。如有人员受伤，配合 120 救护人员抢救，同时组织人员维持现场秩序。疏散群众，保护好火灾现场，为消防部门的扑救及灾后调查创造条件。

(7)突发事件应急联动预案

施工现场突发事件包括：突发公共卫生事件、治安事件及城市地下管网破坏事件等，如突然意外发生，应按此应急预案实施。

1)突发公共卫生事件应急联动预案：

突发公共卫生事件是指突然发生造成或可能造成社会公众健康严重损害 的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒以及其他影响公众健康的事件。施工现场应按照有关“突发公共卫生事件应急联动预案”的要求加强施工现场管理。如发生疑似病例，应立即上报， 隔离并封闭现场。按突发公共卫生事件应急联动预案统一部署执行。

2)突发治安事件应急联动预案：

凡属全市、区或大规模突发事件，按市、区政府统一部署执行。市、区政府未部署的按以下方法处置。

在本现场如有酝酿准备冲击公司机关主要部门或非法游行、集会、 采用过激方式索要工资的，知悉情况后，应急小组应迅速报告有关部门，及时派出人员前往了解情况，掌握动态，同时安排力量，做好教育疏导工作，及时做好分化瓦解、缓和矛盾、平息事态工作。对主要组织指挥者和骨干分子、失去理智者采取有效措施进行控制。

对劝阻无效，正冲击重要部门或非法游行、集会的，应及时向上级有关部门报告，并确定现场指挥，迅速组织力量确保重点部门安全，维护秩序，控制局势，平息事件。

施工现场如发生盗、抢国家财产或建筑材料等事件，应立即报告当地派出所，请求援助，现场保卫人员应配合当地公安机关作好联保工作。

施工现场如发生打架、斗殴、群体械斗等事件，现场保卫应立即采 取劝阻等有效控制措施，防止矛盾激化及事态扩大，迅速查明原因，及时控制现场。立即通知公司保卫部门和当地派出所，协助、配合公安机关维护秩序，平息事件。

3)城市地下管网破坏应急联动预案

施工现场如突然意外造成城市给水管网破坏，应立即电话通知城市自来水公司说明某地给水管损坏，请求其迅速来抢修，同时，组织现场人员抢救可能被水淹地区的防潮防水物质，尽量减少损失；同时疏通道路、疏散围观人员，以利自来水公司抢险人员抢修。

施工现场如突然意外造成城市天然气管破坏，应立即向 110、119 报告，同时向天然气公司请求抢险。立即切断电源及灭去火源。疏通道路、疏散人群，以 110、119 及天然气公司抢险人员进入现场抢险。应急小组人员配合 110、119 及天然气公司抢险人员做好抢险工作。

(XII)急救常识

1、创伤止血救护

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等。如伤者一次出血量达全身血量的四分之一以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血措手不及。

2、烧伤急救处理

在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟，要在现场立即进行。

基本原则是：消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗， 或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗灭仍燃，衣服如有冒烟现象应脱下或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸烧伤。烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

3、吸入毒气急救

一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保护清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

4、触电急救

遇有触电者施救人员首先应切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下：

(1)口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌合上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸道畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧，此地救护者先深吸一口气，对准伤员口部用力吹入。吹完后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员口鼻有气流呼出，表示有效。每分钟吹气 16 次左右，直至伤员自主呼吸为止。

(2)心脏按压术。方法是将触电者仰臣于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲压按压，使胸骨下陷 3-4cm。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

5、手外伤急救

在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢要应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内，袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。

6、骨折急救

骨骼受到外力作用时，发生完成或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与外相通，骨折分为两大类：即闭合性骨与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应做好紧急处理后，再送医院抢救。为了使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢

体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项：

(1)如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。

(2)不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。

(3)固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤增加疼痛。

(4)夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受压。

(5)搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制做简单担架运送。

7、眼睛受伤急救发生眼伤后，可做如下急救处理：

(1)轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。

(2)严重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拨出插入眼中的异物。

(3)见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。

(4)立即用消毒纱布轻轻盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。

8、脊柱骨折急救

脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折的伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤者仰躺。无担架、木板需众人用搬运时，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者，否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久性瘫痪的严重后果。

(XV)雨季施工措施

1、加强对土石方施工的检查、监控。重点检查开挖进度，在施工现场设置观测点，随时观测毗邻建筑物、构筑物的变化，及时消除安全隐患。

2、强化对施工现场临时建筑、施工用电等危险性较大部位和环节的检查，重点检查大型机械设备固定状况和各种安全装置灵敏程度，提高设备抗大风、防雨、防雷击和防倒塌性能。

3、施工现场临时用电必须严格遵守标准规范， 尤其要做好变(配)电室防雨措施。汛期所有施工现场临时用电，除照明、排水和抢险用电外，其他电源必须全部切断。雨后施工前，要检查所有用电设施和线路的安全性，经检查符合要求后，方可投入使用。

4、做好对施工现场的宿舍、食堂、办公室和仓库等临时设施安全隐患的排查工作。汛期前，加强施工人员的防汛教育，宣传有关避险路线、避险地点和避险方法的安全防护知识，提高防护意识。汛情期间，宿舍设专人负责，实行昼夜值班，把处于有安全隐患的临建宿舍中的住宿人员撤到安全地带。

5、雨季施工时，应经常清扫路面，清除积水，保证现场运输道路畅通；检查施工便道排水情况，保证便道畅通，应在便道上铺设草袋，作好防滑处理，行驶的车辆应采取防滑措施。

6、雨季施工现场应有可靠的排水设施，雨季来临前，应对原有的排水系统进行检查，有必要的可进行疏浚、修补、加固，必要时增加排水设施。

7、雨季土方开挖时，应及时挖好排水沟、积水井，随时把积水抽出。土方开挖要求速度快，工作面不宜过大，须逐段、分期完成，挖好后要及时验槽、隐蔽，若基槽、坑挖好后不能立即进行下道工序，可在基底预留 300mm 厚土层，待垫层施工时再予以挖除。

8、土方回填前，要及时排除基坑内积水，回填土要严格控制含水率，必须分层回填并夯实，夯填要连续完成。

9、雨季砌体施工时，应严格控制砂浆稠度，在保证砌体稳定性的前提下，适当降低砌体的砌筑高度，砌筑砂浆浸雨后，应增加干水泥和水重新搅拌后使用。 每天完工后或雨停后， 砌体竖缝应填满砂浆，砌体顶面应放置一皮干砖或覆盖防雨材料，以防雨水冲刷。遇大风、大雨等异常天气，应检查砌体的垂直度变化，及时调整。

10、焊接用电焊条受潮后，应烘干后再使用。逢雨季，室外无遮蔽设施时，应停止施焊。原则上禁电焊施工不能在雨天进行，必要时，焊工必须穿绝缘胶鞋，以防触电，并搭设防雨设施，方可施工。

11、预制构件进场后，要集中堆放在指定地点，堆放地点应夯压密实，构件下垫枕木，四周设排水沟。

12、对设备堆场、建筑加工场等旷地较大的场所，应增加防雷接地装置，并在雷雨季节前，组织相关人员对现场所有防雷接地装置进行安全测试。

13、物资存放仓库应有防潮、吸湿、加热等设施。

14、做好设备维保工作，露天放置的设备应做好防雨措施，随设备供应的仪表以及其他精密设备应入库保存，裸露的接口应可靠封闭。

15、雨天高空作业须有防滑措施。

16、重点加强对电缆线及接头绝缘性能进行检查，如发现破损现象，应及时进行绝缘处理，以防发生触电事故。

17、在潮湿的条件下从事焊接作业，应采取防触电措施。

18、施工人员在容器内工作时，循环水管要防腐，要加强通风措施和监护工作。从事切割工作时，应在容器外点燃割具，不得在容器内用氧气吹扫，以防发生爆炸事故。

19、加强安全施工管理工作，对所用的设备进行检查，严防打滑。

(XVI)冬季施工措施

凡昼夜室外平均气温连续五昼夜低于 +5℃和最低气温低于 -3 ℃时，即由常温施工转入冬期施工。冬季施工易出现质量安全事故。

1、 砌筑工程

冬季施工期间的砌筑工程主要是采用抗冻砂浆法施工。

(1)防冻剂的掺量应根据当日气温和实验配合比实施。

(2)当室外大气温低于 -10℃及施工上需要时，对原材料进行加热，应优先加热水，当满足不了热工计算的温度时，再进行砂子加热，但要注意水温不得超过 80℃，砂子温度不得超过 40℃，水泥不可加热，但应放在不低于 0℃得室内。

(3)砌筑砂浆使用温度， 当气温在 -10℃以内，在-10℃~20℃时，为+10℃。搅拌好得砂浆要注意运输、存放、使用时的温度损失，最好随用随拌。

(4)操作上应按照“三一”砌筑法砌筑。灰缝应控制在 10mm 以内，砖砌体在当日施工完毕后，必须在表面覆盖保温材料。

(5)砖上冰、霜、雪要清除，一般不得浇水，冬施工砌筑工程不可采用无熟料水泥，不得使用白灰砂浆或粘土砂浆，砂子要清除冰块。

(6)每日砌筑后，应及时在砌筑表面进行保护性覆盖，砌筑表面不得留有砂浆。

2、钢筋工程

钢筋现场焊接要设置简易挡风及覆盖措施。防止焊后急剧降温。接头在焊接之前应清楚冰雪、污垢杂物。应使焊缝和热影响区缓慢冷却。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪，当环境温度低于 -20℃时，不得进行施焊。钢筋在负温度下进行冷拉时，其温度不宜低于 -20 ℃。

3、 砼工程

在冬施期间应对搅拌站及时提出对原材料，外加剂及到达现场时的砼温度等技术要求，厂家需进行试配合格后，方能生产，以确保砼工程质量。

(1)根据自然气温条件和工程的结构类型、原材料、工期限制等要求，从节约能源和降低冬施费用着想，采用蓄热法、掺外加剂、保温材料覆盖的综个法进行施工。

(2)砼应及时运到浇筑地点，在运输过程中，要注意防上砼热量损失，表面冻结，砼离析、水泥和砂浆流失，坍落度变化等现象。砼入模温度不得低于 10℃，一般控制在 15℃～20℃。

(3)砼在浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢，浇筑时风力超过 4 级，需在迎风面采取防风、防冻保扩措施。

(4)砼浇筑完毕后，应立即对砼表面进行保温，模板外挂阻燃草袋子。砼板上应覆盖一层薄膜，一层阻燃草袋，气温特别低时，再加盖一层阻燃保温材料。

(5)作好砼的测温工作，按施工方案布置测温孔，并应编号。砼浇筑前，对测温人员应作详细交底。测温孔应在浇筑砼的同时及时留好。

(6)按规定作好冬期施工砼试块管理工作，试块组数应比常温多两组，此两组试块应在施工部位同条件养护。

4、安全

冬季施工易出安全事故，要做好防冻、防盗、防火、防爆、防毒等技术措施。

(XVII)夏季施工措施

夏季施工措施，重点考虑高温施工。

1、严格执行建设部门及公司所颁发的有关夏季施工技术措施要求。

2、调整作息时间，中午 12 点前后 3 小时内不施工，避开一日最热时间。

3、注意操作环境，搭设安全通道、休息凉棚，做好防暑降温措施，并集中设置茶水桶，宿舍安装电扇降温。

4、尽可能地将工作面或施工流水面与太阳升落方向避开，合理布置。

5、夏季施工作业时，作业班组宜轮班作业或尽量避开烈日当空酷暑的条件下进行施工，宜安排早晚或晚间气候条件较适宜的情况下施工。

6、当气象台发出高温警示报告时，应急预案领导小组应及时关心职工的工作与生活状况，调整作息时间，严禁加班加点的超负荷施工。

7、高温防治措施

1)积极主动热心关怀施工人员的身体，做好夏季工作期间的作息制度，是工人有足够的休息时间。

2)发放防暑降温用品和落实急救措施，以防万一。

3)积极改善企业工人的劳动条件，住宿的通风降温设施，做好工人劳动保护与安全生产技术措施。

4)对在高温季节中中暑的人员，首先以救人为主，将中暑人员安置在通风降温的室内，并及时送医院进行治疗。

(XVIII) 农忙及节假日施工措施

1、为了避免农忙及节假日期间对工程的影响，项目劳务组和有关部门将召集各劳务组负责人开会进行宣传，同时签订农忙及节假日期间保证劳动力数量的合同。

2、对参加施工的工人提前做好思想工作，在思想上保证工程的顺利进行。

3、提前准备预备劳力，一旦工程进度受影响立即调入施工工地。

4、在农忙季节及节假日期间，对所有上班民工发放农忙费及节假日工资，这是我方对工期要求紧、任务重且必须在农忙期间进行正常施工所采取的一种行之有效的措施，能起到稳定军心，解除民工后顾之忧的作用，这对工程的顺利进行具有很大帮助。

5、环境保护管理体系与措施（包括有效的扬尘治理措施）

1.环境保护、水土保持保证体系及保证措施

1.1.环境保护、水土保持体系本工程的环境保护、水土保持目标：严格执行合同文件要求，遵循“预防为主，保护优先，建设和防护并重”的原则，确保施工区域内不因施工破坏周围环境，污染物排放达标，最大限度的节约能源和资源。

1.1.1. 设立环保、水保机构，切实贯彻环保、水保法规

1）、环保、水保机构：成立以项目经理为首的环境保护、水土保持领导小组，对本标段环保、水保工作负全面责任。施工中接受建设单位、环保部门、环保监理的监督。

2）、环境保护、水土保持体系

施工区内对环境要求极高。在施工过程中相应建立健全各种组织，制定有关管理制度，体现预防为主、保护优先，开发和保护并重的原则，认真做好施工环境保护及水土保持工作。

1.1.2　　环境保护措施

1.1.2.1　大气与水质的保护

1）、施工场地和运输道路要经常用洒水车进行洒水，防止扬尘。

2）、锅炉燃煤尽量采购使用低硫煤，减少二氧化硫的排放量，锅炉洗碱水要净化处理，才能排放。

3）、超标排放车辆、机械要安装净化装置，降低废气排放量。

4）、工程施工产生的废碴、废液按照有关环保要求进行处理，不得随意弃置、排放。

5）、水质保护

①油类、漆料等化学品不得倾倒于农田、水库及沟渠内，须备有足够的遮盖帆布，防止雨天化学品随雨水进入水体。

②施工期的废（污）水主要分施工人员的生活污水和生产废水两部分，由于两部分废水的性质不同，拟将其分开处理。

生活污水的主要污染物都是易生物降解的有机物，考虑到施工期间的生产与管理的条件，故选择较易操作控制的以生物接触氧化为主体的处理工艺。

生产废水包括施工机械设备清洗的含油废水、混凝土养护冲洗水、砂石料冲洗、钻孔桩泥浆等。含油废水和含砂、石废水分别进行处理，含油废水用隔池去油污，含砂、石废水则由沉淀将其中固体物料沉淀下来。进行水沉淀处理措施为：施工场地的

生产废水，经过滤网过滤，通过污水管输入池中沉淀，并做除油处理。经业主和环保部门认可后排放。

1.1.2.2.泥浆、废弃物处理。

⑴泥浆、施工废水、油料、化学品和尘埃等预处理后，运至指定地点进行排放和填埋。

⑵施工现场的生活垃圾和工程废弃物应集中堆放，经处理后，除部分用于农作物肥料外，其余均选位置较高的地方挖坑深埋并填坑、平整土地，种植永久植被

(3 对于锅炉炉渣，可联系当地村镇用以铺筑道路。

(4 油料贮放在业主指定的贮运仓库，现场用油料使用临时小型贮藏罐，不使用不合格油罐,以免污染发生。

1.1.2.3.噪音、废气、扬尘控制

⑴生活区域实行封闭式管理，设置围墙与外部隔离，以减少噪声、粉尘、弃磕等对周边环境的影响。

2 干燥地面开挖土方或钻孔作业时，要适当、及时洒水，保持土壤湿度;建筑垃圾集中堆放，采取洒水或遮盖等措施，防止扬尘。

⑶将施工现场的固定噪声、振动源相对集中布置，避开噪声敏感时段，较高噪声、较高振动的施工作业尽量安排在环境噪声背景值较高的白天施工。禁止施工人员在居民区附近和夜间施工时高声喧哗，避免人为噪声。

(4 禁止在施工现场熔沥青或焚烧油毡、油漆及其它会产生有害烟尘、恶嗅气体的物质，禁止用有毒化学物质污染施工现场及周围环境。

1.1.2.4.地表和地下水防污染措施

⑴禁止使用可能污染地表及地下水的材料和设备。

⑵生活区设化粪池，施工场地内设置冲洗系统，处理的生活污水排入指定区域。

⑶废浆液和淤泥使用专用的运输车辆运输排放，防止溢洒。

1.1.2.5.生态保护

⑴认真学习生态保护方面的知识，自觉保护、爱护沿线的动植物，保持动植物的生态平衡。

⑵积极开展路地共建活动，施工完毕后，能复耕的复耕，能造地的造地，尽量保护耕地。

⑶爱护、保护好现有水资源，不得改变现有水资源的流向、流量，维护现有平衡状态。

(4)取土尽量做好不侵占耕地，施工时维护好自然地形地貌。

1.1.2.6.施工区域绿化、美化措施

⑴在生活区和现场认真进行绿化，在道路两旁，闲散的边角地处，全部植草种树。利用施工空闲时间，在施工区附近进行义务种树。

2 所有临时房屋统一规划，保持与自然景观的协调，施工场地上的材料与机械按规划摆放和停放。

(3 取、弃土场选择和利用应经业主和监理批准，并按工程师的指令做好绿化、环保方面的措施。

(4 临时道路结合当地的规划，做到永临结合，道路根据地形设置，避免景观失调与破坏。

(⑸建好洗车场，对进入公路的车辆进行清洗，以防污染路面。

1.1.3.水土保持措施

1.1.3.1. 保护植被，做好水土保持

①施工期间尽量保护好植被，施工区内及周围的树木和植被不得随意砍伐和破坏。

②若因为工程的施工需要，植被受影响，应采取永久有效措施及时植树、种草,对植被进行恢复。

③采取永临结合的原则，修建好施工中的各项排水设施，防止水土流失。④基础开挖的土体，及时清运和回填。来不及回填时，周围要设置临时排水沟，防止水土流失。

⑤工程完工后，按环保要求对所有生活区、生产区临时设施所占用地进行复耕处理，复耕利用施工中开挖的耕殖土进行。

⑥施工便道要本着支援地方建设的原则，尽量做到永临结合，搞好绿化工作。⑦施工中积极加强宣传教育，通过挂警示牌、标志牌、贴宣传标语等方式提高全体员工对水土保持重要性的认识。

1.1.3.2.做好环保挡护工程、防止水土流失

①按设计要求做好路基的挡护工程，以及取土场和弃土场的永久挡护工程，避免水土流失。

②临时开挖基础等破土工程，也采取临时挡护工程，防止水土流失。

③近生活水源的施工场地用沟壕或堤坝与之隔开，避免水源污染。对洞口路堑边坡稳定性差的地段，做永久防护工程。

为有效控制工程施工扬尘，改善大气环境质量，结合施工现场实际，特制定施工扬尘防治管理制度。

1、施工单位对施工工地扬尘控制工作措施的落实负总责，对工地现场实施定期检查、考核。施工单位项目负责人是落实施工工地扬尘控制工作的第一责任人，具体负责执行施工工地扬尘控制实施方案，成立现场管理机构，指定项目部扬尘控制专职人员，做好扬尘控制工作的实施与管理。

2、监理单位对施工工地扬尘控制工作负监督责任。

3、管理要求

3.1 施工区域的围栏封闭

根据规划红线范围，设置高度不低于 2.0m 的围墙，确保整个施工区域与外界充分隔离，围墙外侧作美化或绿化处理。

3.2 运输车辆的防尘控制

在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀达到排放标准后，方可排人城市公共管网。

3.3 施工场地的硬化处理

施工现场按平面布置要求做好主要道路、材料堆场、生活办公区域铺设混凝土路面工作，实行场地的硬化或绿化处理，确保无一处露土现象，以达到防尘控制要求。

3.4 道路清扫扬尘污染的控制

安排保洁人员 2 每日对施工现场的道路进行 1~2 次的清扫，清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。

3.5 建筑材料扬尘污染的控制

(1)砂石设置专用池槽进行堆放，控制进料数量，做到随到随用，不大量囤积。堆放时做到堆积方正、底脚整齐干净，并将周边及上方拍平压实，然后用密目网罩进行覆盖。砂石料如过于干燥，应及时进行洒水。

(2)施工用的砖、砌块必须在指定场地进行堆放。进场后及时进行洒水湿润，定时由专人对堆放场地进行清扫。

(3)其他易飞扬物、细颗散体材料（如塑料泡沫、膨胀珍珠岩粉末等必须进行严密的遮或存放在不透风的仓库内，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施，以减少污染。

3.6 堆土防尘控制

建筑工程施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过 48 小时，应密闭存放或及时用网或膜进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

3.7 脚手架清理、拆除扬尘污染的控制

脚手架外侧应按行业规范要求全部用密目网进行围挡封闭，并设专人检查、维护，严禁擅自拆开。在使用期间应采取措施防止建筑材料、垃圾向外、向下散落。清理架体内的建筑垃圾和废料时，应采用洒水和吸尘措施，禁止直接掀翻、拍打。定期对沾上灰尘的密目网进行清洗，及时更换破损严重的密目网。拆除前，应先行清除脚手架中的杂物，并对积灰较多的密目网洒水湿润。

3.8 砂浆拌制扬尘污染的控制

在混凝土、砂浆搅拌操作间四周进行封闭围挡，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露天存放应采取严密遮盖措施。为减少施工现场扬尘污染源，施工现场全使用商品混凝土。

3.9 道路清扫扬尘污染的控制

在施工现场主要道路边、生活区域内场地适当位置安装一些水龙头，使洒水皮管、洒水车能就近使用，便于操作。道路安排专人每日对施工现场的道路进行 1~2 次的清扫，清扫前需进行洒水湿润，天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。所产生的生活垃圾和粉尘经分类袋装后及时地投放到指定的地点。

3.10 现场垃圾扬尘污染的控制

施工现场的施工垃圾（暴露垃圾）清扫前先洒水湿润，运输可采用搭设封闭式专用垃圾通道运输或采用密封容器、装袋清运，并派专人进行检查、监督。严禁随意在预留洞、阳台、窗口处凌空抛洒。所清扫集中的垃圾，在现场规划场地内堆放，并适量洒水或覆盖密目网，定时清运搬离现场，以减少粉尘污染。

3.11 生活垃圾扬尘污染的控制

生活垃圾安排专人进行收集、清理，按指定地点与现场垃圾分开堆放，并进行密闭遮生活垃圾应由环卫部门及时清运出场。禁止在现场焚烧建筑垃圾、废弃木料、塑料品和热熔防青，以防止对大气的污染。

3.12 对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体落实到操作层，并建立奖罚措施。

3.13 工程项目竣工后 30 日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

3.14 出现 5 级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并对堆放物采取防尘措施

4、考核措施

施工单位对工地现场实施定期检查、考核;监理单位对施工单位扬尘防治不到位，整改不及时的处以不低于1000元/次的罚款;对于因防治不到位受到上级主管部门通报批评的，处以不低于10000元/次的罚款。

6、工程进度计划与措施

一、科学组织施工

1 工序管理根据施工工艺要求，充分利用空间和工期允许的时间尽早开始合理结束，允许人员和资源的变化，调节关键线路施工产生的峰值，使施工平稳进行。

2、劳动力安排人力资源主要包括项目管理人员和施工作业人员两大部分。本工程已经列入我公司的重点工程，我公司将选配优秀的工程技术管理人员，在现场设立强有力的项目经理部、经理部由责任心强、业务精、技术好、组织能力强的人员组成。本工程工作量大，质量要求高，工期紧。

2.1 我司将选派强有力的专业施工队伍，他们为我司创立名优工程作出了突出贡献在技术上专业施工队伍完全有能力胜任本工程的施工。

2.2 在劳动力的需求量上，我司将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作、生活等的后勤保障，保持旺盛的工作热情和责任感，确保施工任务的顺利完成。

2.3 组织充足的劳动力，合理划分施工段，采取施工段内部独立流水均衡施工、合理安排工程每个工种施工量，制定每个人每天工作量，做到工程有序进行。施工段的合理划分能大大提高施工进度，并使劳动力按照工序划分，每个工人的操作更加细致、更加专业化，从而提高效率、新进场工人必须考核合格后，才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度。施工组织是一个系统工程，项目经理部建立有效的指挥系统，保证资源供应能够满足施工的需要。

2.4 向施工班组明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施；同时，对国家法定节假日施工人员严格按照国家劳动法要求发放加班工资，加强考勤，提高奖罚力度。对新进场工人必须考核合格后才能上岗’保证工人技术素质和熟练程度，对素质差、技术生疏的工人坚决更换。

3、工序验收

每道工序完成后，作业班组进行自检，合格后报工长复检，由工长报专职质检员验收，合格后方可由下一工序施工班组和质检员签字认可，办理交接检手续，进入下一道工序施工、同时加强交接检，加强工序成品保护，落实工序

质量责任。即验收下一道工序时，如果上一道工序存在问题，则上一道工序的责任由下一工序施工人承担。加大质检人员的权利，充分发挥专职质检员的作用，严把工序质量关、确保各工序质量一次验收成优，杜绝返工以良好的拖工质量获取工期的有效使用。

二、合理配置优势资源

足够的资源投入是保证工期顺利实现的基本条件之一，我们将在人员、材料、机械、设备资金等方面确保优势资源的充分投入，确保工期目标的实现。按照施工组织设计的要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制人员进场计划、材料进场计划、机械设备使用计划、资金使用计划，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。

1、人员管理措施人力资源主要包括项目管理人员和施工作业人员两大部分。本工程已经列入我公司的重点工程，我公司将选配优秀的工程技术管理人员，在现场设立强有力的项目经理部、经理部由责任心强、业务精、技术好、组织能力强的人员组成。我司将选派适合本工程施工特点的选择素质高、责任心强、技术过硬的、能吃苦耐劳的专业施工班组进场作业，确保高标准、高速度地完成本工程的施工任务。根据本施工组织设计制定的劳动力需求计划，针对现场施工情况，编制切合实际的阶段性劳动力需用计划，并及时将劳动力需用计划传递至劳动力配置部门。向施工班组明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施;同时，对国家法定节假日施工人员严格按照国家劳动法要求发放加班工资，加强考勤、提高奖罚力度对新进场工人必须考核合格后才能上岗、保证工人技术素质和熟练程度，对素质差、技术生疏的工人坚决更换、组织第二、第三梯队工人队伍，并提前考核存档，一旦有需要马上可以调赴一线生产，保证工期计划的实施。

2、材料配置

物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物资材料的需要，确保现场施工正常进行；所有材料进场时均由项目专职质检员、材料员、技术员共同验收，未经验收合格的材料一律不得使用，不合格材料严禁进入施工现场。由于本工程从开标至进场施工时间较短，进场前施工准备时间短，为确保

拖工准备不影响现场施工，我公司已经着手进行考查重点急需材料（专业分包或一家）已经签订意向书，提前做好准备工作针对已确定的材料清单，每种材料根据同一质量档次的原则，组织二名后备供应商，以便第一供应雷货源不足或有质量问题时可以尽快补充货源，保证工期的顺利完成。

3、资金配置高质量的完成各自的工程项目，使整个项目质量评定符合国家质量验收标准，达到符合国家质量验收标准工程水平。并且有责任、也有能力协助业主对工程投资进行控制，充分发挥资金作用，确保投资效益，力争将整个工程投资总额控制在合约确定的范围内，满足业主要求。为了搞好本装饰工程，我们将专门成立一个财务管理小组，在项目部财务小组的领导下，对工程项目各项资金使用、收入和支配进行预测、计划控制、核算、分析和校核，并制定资金组织运筹措施在整个施工的全过程中，会同业主、监理单位及所有专业单位紧密配合精心策划全部施工活动使工程尽可能按照预定的方案、计划及程序进行，尽可能的避免及减少意外事件的发生。将整个工程的工期、质量、投资等都控制在合约规定的范围内。

3.1 对投入的前期垫支款（如需要）以及甲方支付的工程进度款进行预算、计划，合理地使用和支配，使各项工程能顺利进行。

3.2 认真审查施工组织设计及重点部位的施工方案，力争将一切不合理的部分在工程开始前得到纠正。

3.3 在施工前精心策划各工序之间的搭接，施工过程中严格进行工序管理，尽量避免意外事件的发生。

3.4 当发生了影响工程顺利进行的突发事件需要采取应急技术措施，应急施工配合或要将施工图紧急修改时，应事先向监理及业主报告及申请，并做好搜集资料的工作、

3.5 按照总进度施工计划，编制季度资金需用计划，作为筹备施工用资金的依据，同时也可以帮助业主对投资进行控制。

3.6 每月十五日编制当月完成工程量报表及下月施工计划，然后汇总编制本月完成情况及下月计划，经监理审核后报业主作为拨付当月工程款的依据。

3.7 业主在支付工程款时，按照合约规定的办法支付，必要时，可向业主提出自己的意见及建议，并希望业主采纳。

3.8 在计划之外的临时追加用款计划，需写出用款申请报总承包方，总承包方审查后认为确有需要时，由总承包方向业主提出申请，批准后作为追加用款计划。

3.9 选用其他设备和材料用于替代原设计所用的设备和材料时，在订购之前，由总承包方写出报告，明确各项性能指标及价格，报监理及业主批准后实施，用以节省投资。

3.10 准备充足的后备资金，以备不时之需，确保项目不因短期的工程款不到位而延误

工期。

三、保证工期的具体措施

1、制定详细的、包含各工种各作业层的计划，及时总结，及时分析，不断调整和完善

计划。

1.1 制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。

1.2 严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。

1.3 每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行汇报总结，对进度的完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。

1.4 根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。

1.5 做好周进度计划，周进度计划是最能反映实际并切实执行的进度计划，也是修正编制旬进度计划、月进度计划的依据之一是整体计划最基本的依据之一

1.6 仔细阅读图纸，熟悉装饰施工和安装施工的技术资料，从而做到心里有数。1.7 加强与监理、业主、其它专业施工单位的沟通与协调，共同致力于将进度安排合理化，将施工技术方案合理化，避免交叉中的冲突（包括工作面、衔接）等原因拖延工期。

2.落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影响。

2.1 材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以作安排。

2.2 公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购。

2.3 对于甲控材料，我方将尽可能早的提出材料计划和样品以供确定、公司劳资部门组织足够数量的劳动力投入施工现场。

2.4 关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作。3、调度措拖

3.1 定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。

3.2 灵活机动的安排人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。3.3 划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡打歼灭战，不给后续工序留尾巴

3.4 进行立体施工，天花、墙面、地面及其他作业面数条战线同时展开，大胆穿插。3.5 安排加班，使工程自始至终处于高峰作业期间、

4、进度控制流程及重点

4.1 工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认、编制施工进度计划劳动力、材料使用计划及其它相关计划总监理工程师审批编制月度实拖计划检查执行情况正常施工竣工修正进度计划(每周一次）补救措施方案。

4.2 在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必要的。如果这一系已列为工程进度计划的组成部分而得到同意，则可省去这一程序中大部分工作，但每月的详细进度计划仍是需要编制的。

4.2.1 月度工程施工实施计划；

4.2.2 材料采购计划；

4.2.3 分部工程施工计划；

4.2.4 分项工程施工计划；

4.2.5 施工机具调配计划；

4.3 检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较、分析工程延误(或提前)的原因，及时采取补救措拖、

4.4 修订进度计划、工程施工单位综合考虑修订的进度计划必须仍按原竣工目标编制。如果在修订计划之前已获得延期索赔的批准，则可以相应地在新竣工期的基础上修订进度计划。在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次、通常工程施工单位无权为修改进度计划而得到任何额外款项，这是因为工程施工单位未能保持合人满意的施工进度而导致计划的修改、当工程延误并非由装饰工程施工单位负责时，延期是合理的，但业主因种种原因不愿延期时，装饰工程施工单位将放弃延期索赔而要求费用索赔。因为工程施工单位为赶回原计划进度，必然要增加机械、人力，改变材料采购计划，或采取其他措施，这些措施往往要使工程成本增加。因此，当合理的延期得不到批准而按原定竣工期目标修订计划时，就有权得到额外付款、当工程项目有重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加或减少工作量、改变设计方案，改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期控制变得相当复杂。一般情况下，即使没有明显的延误情况，工程施工单位也应该每隔一段时间调整一次进度计划。因为随着工程的进度，各种施工条件和环境也在不断变化、定期进行全面检查对装饰工程施工单位自身争取主动、降低成本、加快进度是非常有利的。

4.5 当施工进度不符合计划进度时，工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案，并取得业主或监理工程师的批准

4.6 工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程度上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程度、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实践经验。

5、进度计划的调整由于外界影响，通过调度工作已经实效则必须对进度计划进行整，重新确定关键线路，集中人力物力先施工非原非关键线路的工序或部位，为后续工作保留足够的时间、采用应急措施，减少因工序紊乱造成损失，或做好应急准备，为后续施工充分创造条件。

6、进度报告每月 25 日由我公司分别向业主提交当月的进度报告，提出需要解决的问题，向业主汇报本工程内的其他相关工作，保证施工顺利进行。月报包括以下内容：本月完成实物工程量及形象进度说明；相应于计划的实物工程量完成比例；劳动力投入情况；材料、设备供应情况；工程质量状况；施工安全状况；工程款支付情况；合同工期执行情况；存在问题及处理措施；下月计划安排；反映工程主要形象进度的工程照片。

第三节工期调整及追赶措施

本工程将严格执照施工计划安排，均衡组织生产，但若因重大设计变更，自然灾害或其它一些原因影响了计划施工工期，我们将采取如下措施调整和追赶工期，确保总工期最终实现。

1、挖掘潜力，优化施工方案

通过科学分析并结合施工实际情况，挖掘潜力，优化施工方案，调整施工工序，使施工作业更科学、更合理，达到使工期缩短的目的、

2、增加人力、物力、机械和资金的投入

2.1 适当增加劳动力，积极做好职工工作，搞好材料、物质储备，减少节假日对施工的影响。

2.2 合理增加施工机械设备、料具的投入，充分发挥机械化施工的效率。

2.3 加强施工管理，确保资金更好的用于施工生产，保障施工生产顺利进行。

7、拟投入资源配备计划

施工机械设备配备

根据工程数量及工期要求，为满足施工需要，缩短工期，最大限度利用施工机械，以及不同施工阶段机具的需求差别和有效衔接，主要施工机械配备如下：

A、机械设备的使用与维护

①、各种机械设备必须有出厂合格证，仪器、仪表应具有年检合格证。

②、各种机械设备的操作人员必须持证上岗。

③、带电机具安装时应有可靠的接地，砼、砂浆搅拌机应搭设防雨棚。各种机具应按说明书定期维护、保养。

④、加强机械设备管理的维护保养，确保正常运转。机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到95%以上，对本工程我公司设置专业机械维修班一个，保证施工的连续性。

B、机械设备的管理

①、机械设备和机具需配备专业人员进行管理。根据施工组织设计编制机械设备的进出场计划，在施工过程中如对起重设备和特殊过程使用的设备调整须报请原批准部门批准。负责填报《机械设备交接验收单》、《设备维修检验表》、《设备检修情况记录表》、《年度机械设备盘点登记表》；

②、各项目应依据《施工机械台班费用定额》及《保养修理技术经济定额》结合实际情况，做好机械定期保养工作。日常要坚持“十字作业”法，即；清洁、紧固、润滑、防腐，发现问题及时处理，使机械设备在施工过程中始终保持完好状态。

③、机械操作人员，尤其是特殊工种作业人员都有必须经过安全操作技术培训考核，持证上岗，非机操作人员严禁上机。机操人员必须听从施工人员的正确指挥，严格实施《建筑机械使用安全技术规程》，负责填写《机械设备运转记录》表和《机械设备履历表》并做好日常的维修保养工作。

④、属于特殊过程的施工机械设备，须送具有检测资格的检验单位鉴定合格后方可使用。

⑤、重大事故发生后，须于 6 小时内用电话或电报及时报告上级主管部门，然后再补报事故报告。处理事故要坚持“三不放过”的原则，即：事故原因没有分析清楚不放过；干部、群众没有受到教育不放过，没有切实可行的防范措施不放过。

⑥、凡无证操纵各种机械设备，一经查实，罚当事者 100 元，如属领导者责任擅自使用无证操作者机械设备罚领导 100 元。并予以通报批评。

⑦、需要购置机械设备，必须结合生产实际，并从技术和经济等到方面进行可行性论证，按程序报请批准之后方可办理。

⑧、积压的机械设备以及由于磨损严重已不能使其达到使用和安全要求或无改造价值需报废的设备，必须报请领导批准后方可办理报废手续。

⑨、按照上级部门下达的设备保修计划时对设备进行保修，并做好记录。

拟投入本工程的主要施工设备表详见后附表一，拟配备本工程的试验和检测仪器设备表详见后附表二

附表一：拟投入本项目的主要（标段）施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	摊铺机	ABG525	2	南京	2019	65	良好	道路	/
2	洒水车	RQ140	2	随州	2018	35	良好	防扬尘	/
3	推土机	K1140	0	上海	2019	50	良好	土方	/
5	压路机	XP261	3	山东	2018	26T	良好	平整场地	/
6	搅拌机	Sj1200	0	云南	2024	55	良好	道路	/
7	发电机	/	1	上海	2019	40	良好	全过程	/
8	平板货车	/	1	湖南	2019	50	良好	运输	/
9	铺设车	SF220	1	徐州	2019	99	良好	沥青道路	/

注：以施工现场实际情况调整

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表


序号	仪器设备名　　称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时　　数	用　途	备注
1	全站仪	GTS-332	1	武汉	2021年	40	测量	/
2	电子经纬仪	ZH.ET-1	0	郑州	2018年	120	测量	/
3	水准仪	SHTL	0	广州	2019年	50	测量	/
4	土方试验仪	BZYS-4212	0套	武汉	2021年	60	测量	/
5	砼试验仪	HZD-80	0套	无锡	2018年	60	测量	/
6	水准尺	3m,5m	2	郑州	2018年	10	测量	/
7	钢卷尺	50m	2	郑州	2021年	10	测量	/
8	经纬仪	J2	1	武汉	2023年	65	测量	/
9	试模仪	150*150*150mm	1	武汉	2018年	82	测量	/
10	取芯机	HZ-20	1	无锡	2019年	82	测量	/
11	测距仪	FY-DW2	2	深圳	2022年	58	测量	/

注：以施工现场实际情况调整

8、施工进度表或施工网络图

施工工期 / 工程项目	施工总进度计划安排(60日历天)					
	10	20	30	40	50	60
施工准备						
挖除旧路面						
水泥混凝土路面						
透层、粘层						
沥青混凝土						
检查井工程						
旧路面处理						
标线						
竣工验收						

9、施工总平面布置图

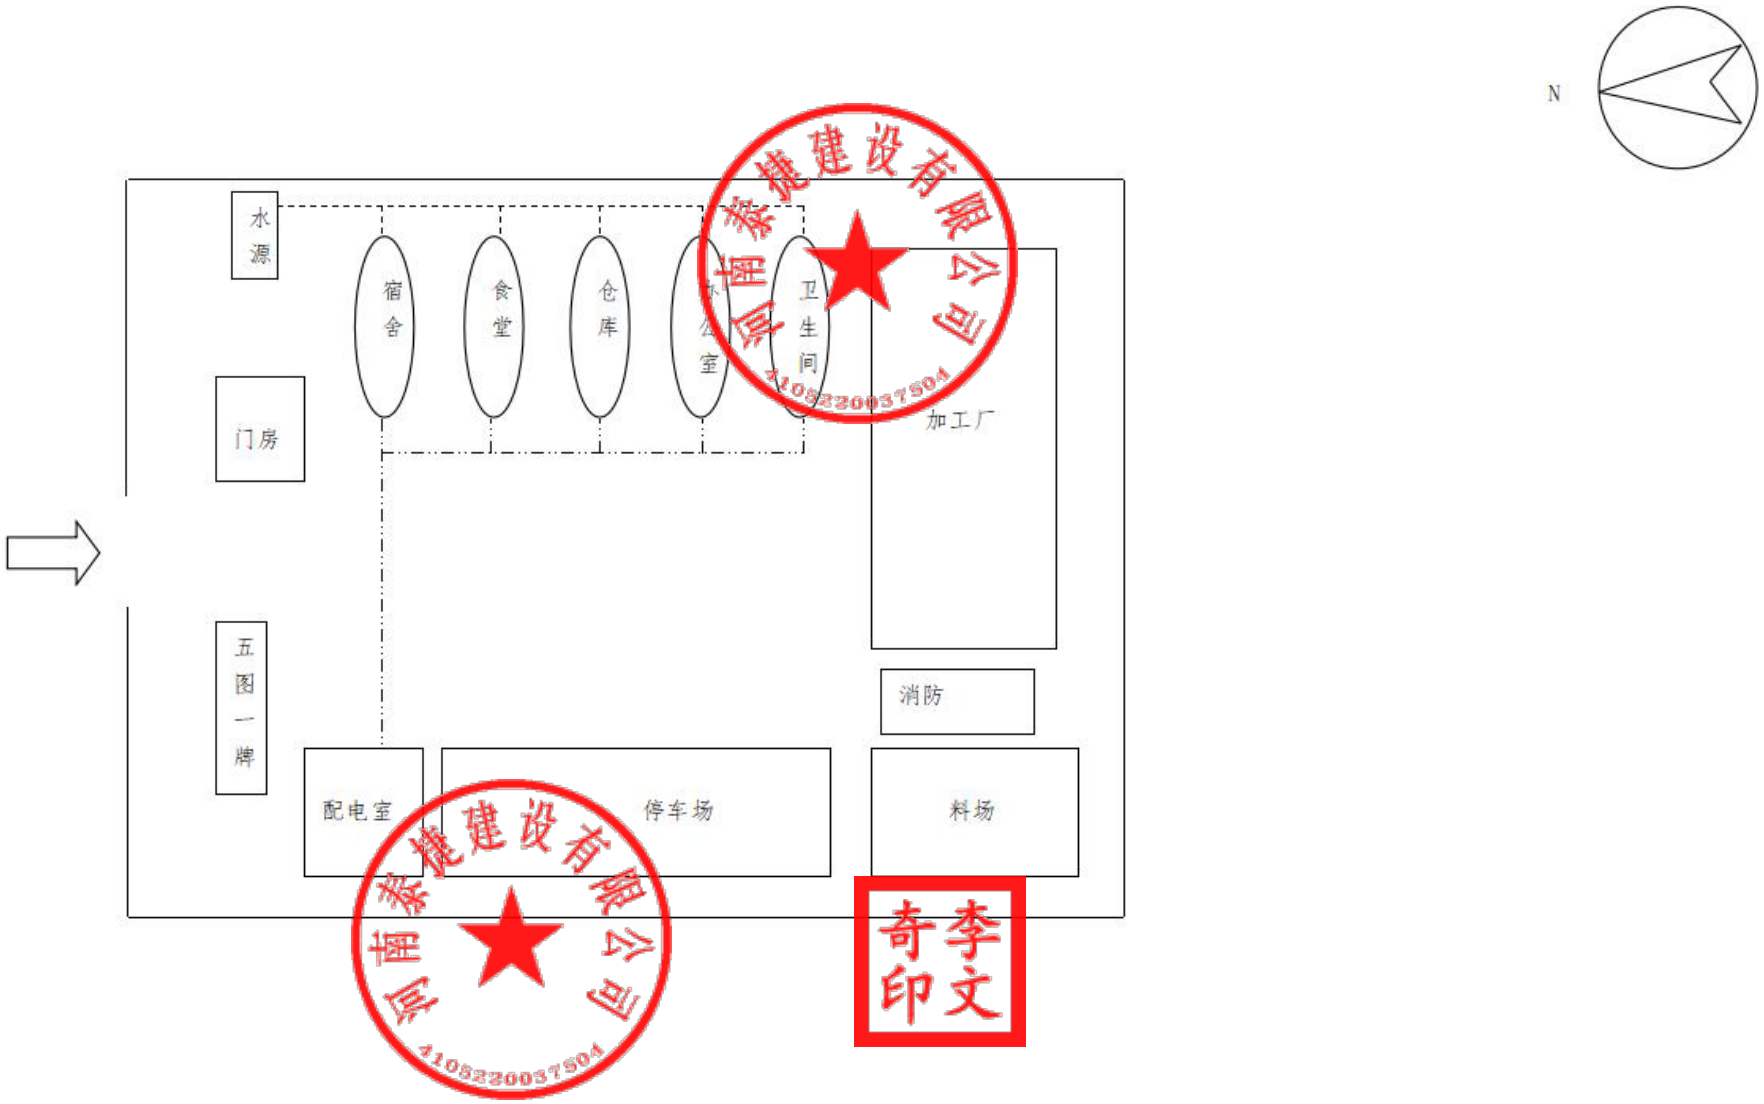

说明：

总平面布置力求科学、合理，充分利用有限的场地资源，最大限度的满足施工需要，确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工四大目标的实现。

根据现场实际情况和本次招标情况，本标段的施工平面布置总原则为：即节俭又文明，争创标准化工地。

1)临时设施：现场搭建。由于本工程涉及面积广，为方便施工，我公司在施工作业时设置一个施工临时设施区、一个办公区及钢筋制作房。

2)供电：结合本工程特点及所处环境条件，施工用电拟接引自沿线高压线，设主配电房 1 个，配电房跟当地电管局协商直接从附近的配电房接入，作为主要的搅拌场地用。

3)机械停放场：主要用于推土机等大型施工机械停放。

4)加工车间：用于施工材料的加工，设置在生产区内。

5)预用材料堆放场：现场临用材料的堆放，分区堆放，确保文明施工。

6)供水：根据施工组织设计要求及现场实际情况，本工程施工用水采用自当地农灌部门的提灌站提灌水。

7)值班室：设立于入口处，负责看管施工场地材料。

8)办公室：办公区现场搭建。包括业主、监理办公室，项目经理部。

9)生活区：设置了宿舍、厨房、厕所、盥洗室等必要的生活空间。

10)消防设施：在施工区内设置消防设施，全面做好防火措施。

11)仓储：用于存放施工材料及器具。

12)以上计划应根据施工现场安排做适当调整。

10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施

一、按报价合理控制工程成本

1）我公司项目部对施工现场认真勘察，针对本工程的特点和实际情况进行认真的测算和分析，加强施工中各个环节的管理，对影响工程造价的各种因素进行控制，制定合理的施工工期，把工程造价降低到合理的范围内。

2)严格把握材料关

对建筑材料的供应要货比三家，选择质优价廉的材料。对原材料的运输进行经济比选，确定经济合理的运输方案。利用新技术，减少消耗，把材料费控制在投标价范围内。

3）科学组织施工，提高劳动生产率

周密科学地安排计划，巧妙地组织工序间的衔接，合理安排劳动力，做到不停工、不窝工、不抢工，严格参照批准后的施工网络规划图进行组织施工。创造条件缩短单项工程工期，养活人力、机械、周转材料等费用。施工中采用先进的施工工艺和方法，提高机械化施工水平，力求达到劳动力组织合理，生产效益好、机械利用率高，工艺先进的要求。做到少投入多产出，最大限度地挖掘企业内部潜力。

4)完善和建立各种规章制度，加强质量管理，落实各种安全措施，进一步改善和落实经济责任承包制及成本核算制。在施工过程中的每一环节上，用责任制和经济手段切实加强管理，做到工完料清，以降低成本，提高经济效益，把成本管理建立在受控状态，发现偏差及时纠正。充分调动广大积极性，开展劳动竞赛，提高事业心、责任心。决不允许出现因质量问题而引返工损失和因安全事故引起的经济损失。

5）加强经营管理，降低工作成本

编制先进合理的施工组织设计，实事求是地进行施工优化组合，做到有标准、有目标。优化施工平面布置，减少二次助搬运，节省工时和机具。临时设施尽可能做到一房多用，减少面积和造价，并量利用废旧材料，将临时设施费用降下来。科学利用建筑材料，不要造成浪费，把废料降低到最低限度，向管理要效益。

6)施工调度高效运转

建立以项目经理部到各作业队的指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题，对重大、关键问题超前研究，制定措施。项目经理直接对公司负责，及时调整工序和调运人、财、物、机以保证工程的连续性和均衡性。

7)严格执行 ISO9001：2000“质量、环境、职业健康安全一体化”质量体系标准。

加强施工质量控制，避免返工浪费，做到所有项目一次验收合格，并达优良标准。

8)安排好子雨季夜间渐下根据当地气象、水文资料，有预见性调整各项工程的施工顺序，并做好预防工作，使工程有序不断地进行。

9)降低非生产人员的比例，减少管理费用开支公司派往工地的管理人员力求少而精，做到一专多能，提高工作效率，达到管理费用最低。

二、按投标工期完成施工任务，控制期间费用

为按投标工期，保质保量施工任务，制定以下保证措施：

1)挑选精兵强将，早进场，早开工

为加快本标段的施工进度，保证工期，我公司组织好精干的施工管理人员和施工队伍，集中了先进的机械设备。待接到中标通知书后，迅速做好施工前的各项准备工作。做到施工设计、桩位复测、熟悉设计文件和技术交底同步进行。压缩施工准备时间，准备充足的劳力和机械设备，为主体工程施工创造条件。

2)加强对全体施工人员的思想教育树立时间就是效益，进度就是信誉的思想，以战斗姿态投入工程施工。

3)加强宏观控制，重点工程重点突击针对本工程标段以混凝土排水管道，沥青混凝土路面为施工重点的特点，从设备配备和队伍的选择上，都要严格挑选。在人员、资金、物资、机械上优先保证重点工程的施工。

4)加强组织管理、科学安排施工选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各级主要负责人，严格各方面规章制度，上令下行。各级组织机构要高质量、高效率的运转、科学地安排施工，控制工程必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，做到环环相扣，有条不紊，加快工程进度。

5）搞好内部经济责任制，提高工作效率加强各级领导，建立健全岗位责任制，签订包保责任状，以周计划保旬计划，以旬计划保月计划，确实保证各项工程按计划完成。

完善奖惩制度，落实好按劳分配的原则。用不同形式的计件工资，计时工资、承包工资，以经济为杠杆，充分发挥施工人员积极性和主动性，提高生产效率，提前工期有奖，延误工期受罚。同时对班组加强现场管理，做到文明施工。

6)不断优化施工组织设计以本标书的初步施工组织为依据，及时编制实施性施工组织设计，充分发挥科技是第一生产力的优势，在施工中不断优化施工方案。采取目标管理、网络技术等现代化管理方法，使施工组织更加全面和严谨。在施工中要对实施性施工组织中的有关工序衔接、劳动组织、工期安排上不断优化，使其更加完善。

7)广泛开展技术革新和科研工作积极开展“小发明、小创造、小革新、小改进”的四小活动，对重点项目邀请设计、科研单位联合攻关。

8)做好选型及配件供应工作设备的选型力求实用、多效、耐用的原则，防止待机误工。在施工中要有计划地备足易损件，做到随坏随修，确保施工机械按计划正常运作。

9)抓好材料供应工作确保材料供应满足施工需要，同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

10)做好雨季施工安排，确保雨季施工不停顿

(1)随时与气象部门取得联络，掌握好天气预报，根据当地气象水文资料预报，有预见性地调整有关页目工作的顺序。尽量避免暴雨爆发时对施工的不利影响。

(2）修建好施工便道，保持施工场地和道路始处于良好的排水状态，保证雨季车辆的通行。

(3）备足车辆，赶晴天战雨天突击运料，使现场施工用料有足够的储备，确保雨季施工不停顿。

11）搞好与地方政府、当地村民的关系积极主动与地方联系，在征租土地方面不留后遗症，在交通干扰、车辆通行等方面，采取有力措施，减少地方的损失，有损失的及时补偿。

12)搞好后勤保障工作做好物资、机具零配件的采购供应，加强现场生活、卫生、治安管理，使全体施工人员无后顾之忧。

第二节确保报价完成工程建设的管理措施

1)组织均衡施工

合理安排施工进度，将工期控制在合理范围内，可使施工成本降低，而实际工期比合理工期提前或拖后，都意味着施工费用的增加，因此在安排施工工期时，要科学地处理工期与施工费用辨证关系，在进度计划安排上，各工种、各工序力求平衡地、有节奏地进行施工，其中包括顾客方分包出去的单项工程，在保证合同工期的同时，力求将工期控制在合理工期内。

2)合理组织劳动生产力，科学划分施工流水段，集中力量抓关键线路，避免停、窝工。严格控制人工费用的支出，单位工程开工前，需编制设计预算和施工预算，两者要做对比，量入而出，收入大于支出。

3)尽量减少临时工程设施、降低现场各种费用支出，现场管理办公室，机修间、木工间、材料仓库、临时宿舍、食堂等，尽量压缩临建面积，节省临建费用。

4)优化劳动组合，实行管理层与作业层的分离，使劳动力组织形成弹性结构，根据施工需要，合理的编制劳动力计划，随着工程的进展和作业量变化适时调整施工人员，不搞人海战术，在整个工期内尽量减少出勤人数，以便降低人工费支出。

5)合理使用施工机械设备，根据工程特点及工程量，合理选型及配套，提高施工机械利用率，以便减少设备折 1 旧、维修费用。6)合理布置施工，材料按计划进场，避免现场二次倒运。

7)尽量减少材料库存量，在满足施工需要的前提下，尽量减少材料库存量，尤其是钢材、水泥、砂石及红砖等，从而减少流动资金的占用量。

8)严格控制材料价格与量差损失，材料采购严格按《采购控制程序》文件执行，同时要做到货比三家，在同等质量的前提下，择优选购。进场后设专人认真检质验量，特别是钢材、水泥等，以避免量差损失，从而降低材料费支出。

9)优化施工方案，科学组织施工。充分利用空间和时间，提高时空利用率，实施平行交叉流水作业法，把室内和室外，地面和预埋等部分的土建、内部装修，水电和设备安装，顾客方分包出去的单项工程有机结合起来，实行上下左右，前后内外多工种、多工序相互穿插、紧密衔接，同时进行施工作业，从而减少施工中的停歇现象和时空损失，加快施工进度，从而保证工期目标的实现。

10)确保工程质量，降低质量成本主要采取以下控制措施：

①严格工序质量控制，每道工序达到合格品，或优良品，如砼模板质量不好，外形尺寸超差，给抹灰增厚度而浪费水泥砂浆。

②尽量减少不合格品和质量事故的发生，减少由此而带来的经济损失，从而降低“内部故障成本”。

六、工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：工程量清单、图纸及磋商文件包含的全部内容 以及双方约定的其他项

目。具体保修的内容如下：

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修范围包括与合同范围内的保修范围及双方约定的其他项目。

3、凡属于承包人原因造成的质量问题、缺陷或由于承包人维修造成业主（指房屋的产权拥有者，下同）的相关损失，均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任，但是经由发包人和承包人双方协商由承包人维修的，承包人应予以维修，费用由责任方承担。

4、如果是因设计缺陷或是业主使用不当造成的质量问题不在保修内容之内。

二、质量保修期：1年。（应符合或优于国家、地方或行业相关质量保修期规定，符合或优于本文件有关质量保修期规定；如质量保修期有各类别规定的，供应商可以按不同类别分别填列各类别质量保修期。）

注：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

七、质量、工期、安全承诺书

（对工程质量、工期、安全进行承诺，并描述责任承担。）

为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、安全、工期保修等方面的要求，最大限度的达到工程的建设目的，满足建设单位要求，我公司就工程缺陷责任期内服务项目向建设单位做如下郑重承诺：

1、严格履行法律、法规及标准规范规定的施工单位职责。保证按照静审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，保证施工过程符合法律法规和工程建设强制性标准的要求。坚决杜绝各类生产安全和工程质量事故，对因施工导致的工程质量安全事故或问题，本公司愿意承担责任。

2、保证到岗履职，落实项目负责人施工现场带班制。认真遵守建设主管部门的相关规定，服从监督和管理。对失职、渎职造成的工程质量安全事故和问题，愿意承担相关责任。

3、保证所承建的工程达到到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格，材料必须按招标文件质量技术参数执行。

4、工期按甲方指定工期 60 日历天内完成，保证科学施工。组织合理措施完备，实施进度管理，对其它协调工序及施工进度进全部管理。及时解决延误施工工期的因素并保证按时施工完毕。

5、对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程缺陷责任期阶段。在缺陷责任期，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。

6、由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程缺陷责任期期限的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。

7、因不可抗力原因对工程造成的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

八、偏差表

项目名称：安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

项目编号：安龙财磋商采购-2024-20

序号	《磋商文件》要求	《响应文件》响应	偏差描述
1	采购内容：工程量清单、图纸及磋商文件包含的全部内容	采购内容：工程量清单、图纸及磋商文件包含的全部内容	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
2	质量要求：合格	质量要求：合格	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
3	工程地址：安阳市龙安区龙泉镇	工程地址：安阳市龙安区龙泉镇	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
4	工期：60 日历天	工期：60 日历天	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
5	本项目是否接受联合体投标：否	本项目是否接受联合体投标：否	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
6	响应有效期：从《响应文件》开启之日起，响应有效期为90日历天	响应有效期：从《响应文件》开启之日起，响应有效期为90日历天	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
7	履约保证金：不需缴纳	履约保证金：不需缴纳	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
8	合同履行期限：60日历天	合同履行期限：60日历天	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差
9	我公司完全响应磋商文件要求	我公司完全响应磋商文件要求	与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差

注：1、“偏差表”应详细注明与《磋商文件》中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于《磋商文件》要求）。

2、如投标条款与《磋商文件》要求一致，仍需在本表填列“与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差”字样。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年1月8日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

十、供应商资格条件及履约承诺函

致：安阳市龙安区龙泉镇人民政府（采购人名称）

在采购编号为 安龙财磋商采购-2024-20 的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷，如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《磋商文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《磋商文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《磋商文件》技术、交验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

十一、资格要求相关证明材料（文件）

★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】

★★★【请注意：未按竞争性磋商公告要求电子签名<签章>的将导致无效投标，特此提醒】

承 诺 书

我方承诺：

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加安阳市龙安区龙泉镇人民政府（单位名称）的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 河南泰捷建设有限公司（企业名称），从业人员 60人，营业收入为 2323.52万元，资产总额为 394.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 河南泰捷建设有限公司（企业名称），从业人员 60人，营业收入为 2323.52万元，资产总额为 394.59万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

日期：2024年11月8日

注：1.符合上述条件的供应商，须在响应文件中提供相关声明函。不符合上述条件的供应商无须提供。“专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：：本项目采购标的序号1-16对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

承 诺 书

我方承诺：

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基础性资格要求。承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

（1）具有独立承担民事责任的能力



统一社会信用代码
91411628MA9FHH7J6D

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南泰捷建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李文奇

经营范围　许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　伍仟万圆整

成立日期　2020年08月04日

住　　所　河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

登记机关　安阳县市场监督管理局

2023　年　06　月　12　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	河南泰捷建设有限公司
报告生成时间	2024/11/01 14:08:16
申请人邮箱	935349019@QQ.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D　　**企业名称：**河南泰捷建设有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)　　**法定代表人：** 李文奇

注册资本： 5000 万人民币　　**成立日期：** 2020年08月04日

营业期限自：2020年08月04日　　**营业期限至：**

登记机关：安阳县市场监督管理局　　**核准日期：**2023年06月12日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所： 河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内019119号

经营范围： 许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	李爱英	非公示项	非公示项	自然人股东
2	马海弟	非公示项	非公示项	自然人股东

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	李文奇	执行董事兼总经理	2	李俊波	监事
3	李琳琳	财务负责人			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	无	无	2023年06月12日
2	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	马海弟(出资额：990.0000万元；出资比例：99%)，李爱英(出资额：10.0000万元；出资比例：1%)	马海弟:(出资额：4990.0000万元；出资比例：99.8%)，李爱英:(出资额：10.0000万元；出资比例：0.2%)	2023年06月12日
3	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	1000.000000	5000.000000	2023年06月12日
4	名称变更（字号名称、集团名称等）	河南寄景建筑工程有限公司	河南泰捷建设有限公司	2022年07月20日
5	章程备案	无	无	2022年07月20日
6	经营范围变更（含业务范围变更）	公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程、水利水电工程、地基与基础工程、凿井工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、体育场设施工程、电力工程、机电工程、输变电工程、机电设备安装工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、污水处理工程、古建筑工程、特种工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；建材销售。	许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2022年07月20日
7	章程备案	无	无	2022年02月09日

8	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市虞城县大杨集镇富民街60号	河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号	2022年02月09日
9	市场主体类型变更	有限责任公司（自然人独资）	有限责任公司(自然人投资或控股)	2022年01月07日
10	联络员备案	卫岩磊	李文奇	2022年01月07日
11	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	卫岩磊、李姓慧	李文奇、李俊波	2022年01月07日
12	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	卫岩磊:100%;	马海英:99%;李爱英:1%;	2022年01月07日
13	章程备案	无	无	2022年01月07日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	卫岩磊	李文奇	2022年01月07日
15	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	王靖妍	卫岩磊	2021年10月22日
16	联络员备案	王靖妍	卫岩磊	2021年10月22日
1	地址变更（住所地址、经营场所、	河南省周口市鹿邑县鸣鹿路	河南省商丘市虞城县大杨集	2021年10月22日

7	驻在地址等变更）	金汇城小区3单元201室	镇富民街60号	
18	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	王靖妍、卫岩磊	卫岩磊、李姝慧	2021年10月22日
19	章程备案	无	无	2021年10月22日
20	章程备案	无	无	2021年02月03日
21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王靖妍:51%;徐笑影:49%;	卫岩磊:100%;	2021年02月03日
22	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	徐笑影、王靖妍	王靖妍、卫岩磊	2021年02月03日
23	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）	2021年02月03日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1			2022年03月18日	2099年12月31日	国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批
			2021年07	2024年07	河南省住房和	

2			月30日	月30日	城乡建设厅	建筑施工企业安全生产许可证核发

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411628MA9[illegible]H7J6D

企业名称： 河南泰捷建设有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

邮政编码： 455000

企业联系电话： 15994109263

企业电子邮箱： 1113698750@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建设工程施工;路基路面养护作业;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	马海弟	990	2062年01月05日	货币	0		
2	李爱英	10	2062年01月05日	货币	0		

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	39 人	失业保险	39 人
职工基本医疗保险	36 人	工伤保险	39 人
生育保险	36 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示

	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411628MA9FHH7J6D

企业名称： 河南泰捷建设有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址： 河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

邮政编码： 455000

企业联系电话： 15994109263

企业电子邮箱： 1113698750@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态： 开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);园林绿化工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	25 人	**失业保险**	25 人
职工基本医疗保险	16 人	**工伤保险**	25 人
生育保险	16 人		
单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示	

	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

2021年度报告

基本信息[1]

统一社会信用代码/注册号： 91411628MA9FHH7J6D

企业名称： 河南寄景建筑工程有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址： 河南省商丘市虞城县大杨集镇富民街60号

邮政编码： 476300

企业联系电话： 18937077775

企业电子邮箱： 18937077775@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态： 开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程、水利水电工程、地基与基础工程、凿井工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、体育场设施工程、电力工程、机电工程、输变电工程、机电设备安装工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、污水处理工程、古建筑工程、特种工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；建材销售。

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示	

	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411628MA9FHH7J6D

企业名称： 河南寄景建筑工程有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：

隶属企业名称：

企业通信地址： 河南省周口市鹿邑县鸣鹿路金汇城小区3单元201室

邮政编码： 477200

企业联系电话： 15824855358

企业电子邮箱： 15824855358@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

营业场所：

企业经营状态： 开业

是否有对外担保信息： 否

是否有网站或网店： 否

企业主营业务活动： 公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程、水利水电工程、地基与基础工程、凿井工程、园林绿化工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、体育场设施工程、电力工程、机电工程、输变电工程、机电设备安装工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、污水处理工程、古建筑工程、特种工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；建材销售。

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	**失业保险**	0 人
职工基本医疗保险	0 人	**工伤保险**	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	**单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数**	企业选择不公示	


国家企业信用信息公示系统

	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度



河南盛益会计师事务所

审 计 报 告

盛益年审字[2024]第 152 号

河南泰捷建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南泰捷建设有限公司（以下简称泰捷建设公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表，2023 年度的现金流量表，2023 年度的所有者权益变动表，2023 年度的财务报表附注及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰捷建设公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰捷建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

泰捷建设公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰捷建设公司的持续经

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。

营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰捷建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰捷建设公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰捷建设公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰捷建设公司不能持续经营。

李奇文

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2023 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2023 年度利润表

（三）2023 年度现金流量表

（四）2023 年度所有者权益变动表

（五）2023 年度财务报表附注

（六）2023 年度财务情况说明书

河南盛益会计师事务所有限公司

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：安阳市北关区友谊路 263 号　　报告日期：2024 年 3 月 20 日

资产负债表

2023年12月31日

（会企01表）

编制单位：河南泰捷建设有限公司　　单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
货币资金	1	65,910.82	312,388.53	短期借款	45	1,100,000.00	5,850,000.00
短期投资	2			应付票据	46		
应收票据	3			应付账款	47	94,912.00	1,243,031.92
应收股利	4			预收账款	48		50,000.00
应收利息	5			应付工资	49		
应收账款	6	1,902,668.98	6,104,794.78	应付福利费	50		
其他应收款	7		1,250,000.00	应付利润（股利）	51		
预付账款	8		3,167,993.70	应付利息	52		
期货保证金	9			应付税金	53	26,757.91	-760,878.31
应收补贴款	10			其他应交款	54		
应收出口退税	11			其他应付款	55	137,381.97	12,110,850.41
存货	12		8,614,890.14	预提费用	56		
其中：原材料	13			预计负债	57		
[illegible]	14			递延收益	58		
待摊费用	15			[illegible]	59		
[illegible]	16			其他流动负债	60		
[illegible]	17			流动负债合计	61	1,359,081.88	18,493,004.02
其他流动资产	18			长期借款	62		
流动资产合计	19	1,968,579.80	19,451,167.29	应付债券	63		
长期投资	20			长期应付款	64		
其中：长期股权投资	21			专项应付款	65		
长期长权投资	22			其他长期负债	66		
*合并价差	23			其中：特准备基金	67		
长期投资合计	24			长期负债合计	68		
固定资产原值	25			递延税款贷项	69		
减：累计折旧	26			负债合计	70	1,359,081.88	18,493,004.02
固定资产净值	27			*少数股东权益	71		
[illegible]	28			实收资本（股本）	72		
固定资产净额	29			国家资本	73		
工程物资	30			集体资本	74		
在建工程	31			法人资本	75		
固定资产清理	32			其中：国有法人资本	76		
[illegible]	33			[illegible]	77		
固定资产合计	34			个人资本	78		
无形资产	35			外商资本	79		
其中：土地使用权	36			资本公积	80		
[illegible]	37			盈余公积	81		
其中：国家资产损失	38			其中：法定公益金	82		
[illegible]	39			*未确认的投资损失（以“-”）	83		
其他长期资产	40			未分配利润	84	609,497.92	958,163.27
其中：特准备物资	41			外币报表折算差额	85		
无形及其他资产合计	42			所有者权益合计	86	609,497.92	958,163.27
递延税款借项	43				87		
资产总计	44	1,968,579.80	19,451,167.29	负债及所有者权益总计	88	1,968,579.80	19,451,167.29

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利 润 表

2023年度

编制单位：河南泰捷建设有限公司　　单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	5,214,791.28	5,874,729.66
其中:出口产品(商品)销售收入	2		
进口产品（商品）销售收入	3		
减：折扣与折让	4		
二、主营业务收入净额	5	5,214,791.28	5,874,729.66
减：（一）主营业务成本	6	3,751,605.52	4,979,923.79
其中：出口产品（商品）销售成本	7		
（二）主营业务税金及附加	8	3,700.78	4,343.74
（三）经营费用	9		
（四）其他	10		
加：（一）递延收益	11		
（二）代购代销收入	12		
（三）其他			
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14	1,459,484.98	890,462.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15		
减：（一）营业费用	16		
（二）管理费用	17	1,009,767.17	529,845.04
（三）财务费用	18	100,049.72	17,931.10
（四）其他	18		
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	349,668.09	342,685.99
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）			
（二）期货收益	22		
（三）补贴收入	23		
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	24		
（四）营业外收入	25		60,000.00
其中：处置固定资产净收益	26		
非货币性交易收益	27		
出售无形资产收益	28		
罚款净收入	29		
（五）其他	30		
其中：用以前年度含量工资结合弥补利润	31		
减：（一）营业外支出	32		470.00
其中：处置固定资产净损失	33		
债务重组损失	34		
罚款支出	35		
捐赠支出	36		
（二）其他支出	37		
其中：结转的含量工资包干结余	38		
五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	349,668.09	402,215.99
减：所得税	40	1,002.74	9,650.90
*少数股东损益	41		
加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	42		
六、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	348,665.35	392,565.09

单位负责人：李文奇　　财务负责人：张玉冰　　制表人：张玉冰

李文奇印

现金流量表

编制单位：河南泰捷建设有限公司　　2023年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			四、汇率变动对现金的影响	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,53[illegible],996.70	五、现金及现金等价物净增加额	36	247,577.71
收到的税费返还	2			37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,973,468.41		38	
现金流入小计	5	13,505,465.14		39	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,991,044.03	补充资料：	40	
支付给职工以为职工支付的现金	7	340,926.00	[illegible]	41	
支付的各项税费	8	794,806.85	净利润	42	348,665.35
支付的其他与经营活动有关的现金	9	778,160.35	加：计提的资产减值准备	43	
现金流出小计	10	17,907,837.71	固定资产折旧	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	-4,402,372.57	无形资产摊销	45	
二、投资活动产生的现金流量：	12		长期待摊费用摊销	46	
收回投资所收到的现金	13		待摊费用减少（减：增加）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		预提费用增加（减：减少）	48	
[illegible]	15		[illegible]	49	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		[illegible]	50	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		财务费用	51	100,049.72
现金流入小计	18		投资损失（减：收益）	52	
[illegible]	19		[illegible]	53	
投资所支付的现金	20		存货的减少（减：增加）	54	-8,614,890.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		经营性应收项目的减少（减：增加）	55	-8,620,119.50
支付的其他与投资活动有关的现金	22		经营性应付项目的增加（减：减少）	56	12,383,922.14
现金流出小计	23		其他	57	
投资活动产生的现金流量净额	24		经营活动产生的现金流量净额	58	-4,402,372.57
三、筹资活动产生的现金流量	25		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	59	
吸收投资所收到的现金	26		债务转为资本	60	
取得借款所收到的现金	27	5,850,000.00	一年内到期的可转换公司债券	61	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		融资租入固定资产	62	
现金流入小计	29	5,850,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：	63	
偿还债务所支付的现金	30	1,100,000.00	现金的期末余额	64	313,488.53
分配股利、利润或偿付利息所支出的现金	31		减：现金的期初余额	65	65,910.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	100,049.72	加：现金等价物的期末余额	66	
现金流出小计	33	1,200,049.72	减：现金等价物的期初余额	67	
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,649,950.28	现金及现金等价物净增加	68	247,577.71

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

所有者权益变动表

编制单位：河南泰捷建设有限公司　　2023年度　　金额单位：人民币元

项目	行次	明细科目							
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1							609,497.92	609,497.92
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
其他	4								
二、本年年初余额	5							609,497.92	609,497.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	6							348,665.35	348,665.35
（一）净利润	7							348,665.35	348,665.35
（二）其他综合收益	8								
上述（一）和（二）小计	9							348,665.35	348,665.35
（三）所有者投入和减少资本	10								
1. 所有者投入资本	11								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12								
3. 其他	13								
（四）利润分配	14								
1. 提取盈余公积	15								
2. 提取一般风险准备	16								
3. 对所有者（或股东）的分配	17								
4. 其他	18								
（五）所有者权益内部结转	19								
1. 资本公积转增资本	20								
2. 盈余公积转增资本	21								
3. 盈余公积弥补亏损	22								
4. 其他	23								
（五）专项储备	24								
1、本期提取	25								
2、本期使用	26								
四、本年年末余额	27							958,163.27	958,163.27

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

河南泰捷建设有限公司
2023 年度财务报表附注

一、公司基本情况

河南泰捷建设有限公司成立于 2020 年 08 月 04 日，是一家自然人投资或控股的有限责任公司，公司住所位于河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内 010119 号，法定代表人李文奇，注册资本伍仟万圆整，公司经营范围如下：(1)许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(2)一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司采用的主要会计政策

1、会计准则：《企业会计准则》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币。

4、记账原则和计价基础：采取借贷记账法，记账原则是权责发生制，计价基础是实际历史成本。

5、现金等价物的确认标准

编制现金流量表时，公司持有的不超过 3 个月且价值变动风险较小、易于转换为已知金额的短期投资确认为现金等价物。

6、坏账核算方法:直接转销法。

7、存货的核算方法

（1）存货分类：库存商品。

（2）存货计价方法：公司存货取得、发出时采用加权平均法核算。

（3）低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

8、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资：公司对外长期股权投资按实际支付的价款记账，占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位 20%以下有表决权资本或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

（2）长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销。

9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产的标准为使用年限在一年以上、单位价值在2,000.00元以上的资产。（2）固定资产按实际成本计价。（3）固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧。

10、在建工程的核算方法：公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的支出转入固定资产；为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。

11、收入确认方法

（1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再保留对该商品的继续管理权和实施控制，相关的经济利益能够流入企业且相关的收入和成本能可靠的计量；当以上条件同时具备时，确认收入。

（2）让渡资产使用权：利息收入根据合同或协议规定的存、贷款利率和时间确认；使用费收入按公司与资产使用者合同或协议确定。

三、财务报表主要项目构成

1、货币资金：截至2023年12月31日余额为313,488.53元，其中：现金17,662.40元，银行存款295,826.13元。

2、应收帐款：截至2023年12月31日余额为6,104,794.78元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市龙安区交通运输局	4,000,000.00
安阳市殷都经济投资有限责任公司（殷都区财政局院内小会议室）	270,490.75
河南省公路工程局集团有限公司（安林高速）	160,311.26
其他	1,673,992.77
合计	6,104,794.78

3、其他应收款：截至2023年12月31日余额为1,250,000.00元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市瑞隆路桥工程处	1,250,000.00
合计	1,250,000.00

4、预付账款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 3,167,993.70 元，明细如下：

单位名称	金额
河南岚畅商贸有限公司	1,951,864.70
邯郸市肥乡区恒光水泥制品有限公司	463,220.00
安阳市鹏华环保工程有限公司	330,000.00
其他	372,909.00
合计	3,167,993.70

5、存货：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 8,614,890.28 元。

项目名称	金额
原材料	4,314,172.52
其他	4,300,717.76
合计	8,614,890.28

6、短期借款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 5,850,000.00 元，明细如下：

单位名称	金额
建行	5,850,000.00
合计	5,850,000.00

7、应付账款：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额 1,243,031.92 元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市兴晔造田有限责任公司	1,300,000.00
安阳汇佳建筑工程有限公司（高利光机械费/王涛、郜艳飞）	75,600.00
安阳金牛水泥制品有限责任公司	-282,020.00
其他	149,451.92
合计	1,243,031.92

8、预收账款：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额 50,000.00 元，明细如下：

单位名称	金额
河南润安建设集团有限公司（碧桂园玺悦二期）	50,000.00
合计	50,000.00

9、应付税金：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额-760,878.31 元。

10、其他应付款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 12,110,850.41 元，明细如下：

单位名称	金额
曹艳红	1,241,755.00
河南泰捷建设有限公司龙安分公司	1,150,045.63
安阳市恒捷建筑机械租赁有限公司	1,040,000.00
其他	8,679,049.78
合计	12,110,850.41

11、未分配利润：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 958,163.27 元，均为公司成立来的净盈余。

12、主营业务收入：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 5,214,791.28 元。

13、主营业务成本：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 3,751,605.52 元。

14、主营业务税金及附加：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 3,700.78 元。

15、管理费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 1,009,767.17 元。

16、财务费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 100,049.72 元。

17、所得税费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 1,002.74 元。

河南泰捷建设有限公司
2023 年度财务情况说明书

一、公司基本情况

河南泰捷建设有限公司成立于 2020 年 08 月 04 日，是一家自然人投资或控股的有限责任公司，公司住所位于河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内 010119 号，法定代表人李文奇，注册资本伍仟万圆整，公司经营范围如下：(1)许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(2)一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司采用的主要会计政策

1、会计准则：《企业会计准则》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币。

4、记账原则和计价基础：采取借贷记账法，记账原则是权责发生制，计价基础是实际历史成本。

5、现金等价物的确认标准

编制现金流量表时，公司持有的不超过 3 个月且价值变动风险较小、易于转换为已知金额的短期投资确认为现金等价物。

6、坏账核算方法:直接转销法。

7、存货的核算方法

（1）存货分类：库存商品。

（2）存货计价方法：公司存货取得、发出时采用加权平均法核算。

（3）低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

8、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资：公司对外长期股权投资按实际支付的价款记账，占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位 20%以下有表决权资本或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

（2）长期债权投资：公司对长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销。

9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产的标准为使用年限在一年以上、单位价值在2,000.00元以上的资产。（2）固定资产按实际成本计价。（3）固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧。

10、在建工程的核算方法：公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的支出转入固定资产；为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。

11、收入确认方法

（1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再保留对该商品的继续管理权和实施控制，相关的经济利益能够流入企业且相关的收入和成本能可靠的计量；当以上条件同时具备时，确认收入。

（2）让渡资产使用权：利息收入根据合同或协议规定的存、贷款利率和时间确认；使用费收入按公司与资产使用者合同或协议确定。

三、财务报表主要项目构成

1、货币资金：截至2023年12月31日余额为313,488.53元，其中：现金17,662.40元，银行存款295,826.13元。

2、应收帐款：截至2023年12月31日余额为6,104,794.78元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市龙安区交通运输局	4,000,000.00
安阳市殷都经济投资有限责任公司（殷都区财政局院内小会议室）	270,490.75
河南省公路工程局集团有限公司（安林高速）	160,311.26
其他	1,673,992.77
合计	6,104,794.78

3、其他应收款：截至2023年12月31日余额为1,250,000.00元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市瑞隆路桥工程有限公司	1,250,000.00
合计	1,250,000.00

4、预付账款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 3,167,993.70 元，明细如下：

单位名称	金额
河南岚畅商贸有限公司	1,951,864.70
邯郸市肥乡区恒光水泥制品有限公司	463,220.00
安阳市鹏华环保工程有限公司	380,000.00
其他	372,909.00
合计	3,167,993.70

5、存货：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 8,614,890.28 元。

项目名称	金额
原材料	4,314,172.52
其他	4,300,717.76
合计	8,614,890.28

6、短期借款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 5,850,000.00 元，明细如下：

单位名称	金额
建行	5,850,000.00
合计	5,850,000.00

7、应付账款：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额 1,243,031.92 元，明细如下：

单位名称	金额
安阳市兴晔造田有限责任公司	1,300,000.00
安阳汇佳建筑工程有限公司（高利光机械费/王涛、郜艳飞）	75,600.00
安阳金牛水泥制品有限责任公司	-282,020.00
[illegible]	149,451.92
合计	1,243,031.92

8、预收账款：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额 50,000.00 元，明细如下：

单位名称	金额
河南润安建设集团有限公司（碧桂园玺悦二期）	50,000.00
合计	50,000.00

9、应付税金：截至 2023 年 12 月 31 日期末余额-760,878.31 元。

10、其他应付款：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 12,110,850.41 元，明细如下：

单位名称	金额
曹艳红	1,241,755.00
河南泰捷建设有限公司龙安分公司	1,150,045.63
安阳市恒捷建筑机械租赁有限公司	1,040,000.00
其他	8,679,049.78
合计	12,110,850.41

11、未分配利润：截至 2023 年 12 月 31 日余额为 958,163.27 元，均为公司成立来的净盈余。

12、主营业务收入：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 5,214,791.28 元。

13、主营业务成本：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 3,751,605.52 元。

14、主营业务税金及附加：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 3,700.78 元。

15、管理费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 1,009,767.17 元。

16、财务费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 100,049.72 元。

17、所得税费用：截至 2023 年 12 月 31 日全年累计金额 1,002.74 元。



姓　　名
Full name 张佳

性　　别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1978-12-28

工作单位
Working unit 河南盛益会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 410503197812282010

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=151417225456611846[illegible]7089

河南盛建建设有限公司 4105220037504

证书编号:
No. of Certificate 410001380007

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 2011 月 /m 04 日 /d 19

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=151417225456611846[illegible]5

中华人民共和国财政部

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

河南盛建建设有限公司 4105220037504

张佳 410001380007

李奇文印



姓　　名 Full name	胡雪艳
性　　别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1969-09-26
工作单位 Working unit	河南盛益会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	410522196909260146

证书编号：No. of Certificate　410500110003

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance　2006 年 7 月 14 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91410503770899286 7
(1-1)

名　　称	河南盛益会计师事务所有限公司
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住　　所	安阳市北关区友谊路263号院内
法定代表人	张佳
注册资本	壹佰万圆整
成立日期	2005年02月28日
营业期限	2005年02月28日至2025年02月27日
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本金，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务（凭有关部门批文经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2019年09月21日

每年1月1日至6月30日报送上一年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://www.haaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南盛益会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张佳

经 营 场 所：河南省安阳市北关区友谊路263号院内

组 织 形 式：有限责任

执业证书编号：41050013

批准执业文号：豫财办会[2005]12号

批准执业日期：2005年02月03日

证书序号：0009875

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。



机动车销售统一发票

抵扣联

发票代码137171925306
发票号码00282562

开票日期 2021-09-06

机打代码	137171925306	税控码	13<1</771>+340654339335296/*6>5/-+++80 >3<8*-<0365/00*02*8--75-<+-642<<8<50268 /7309>3<1624328<65++749**+//7*892189*4 //7428-<<<3>1<19<7+/153<7347*914-/->
机打号码	00282562		
机器编号	661548516465		
购买方名称及身份证号码/组织机构代码	河南奇景建筑工程有限公司 91411628MA9FHH7J6D	纳税人识别号	91411628MA9FHH7J6D
车辆类型	粉料撒布车	厂牌型号	九州陆达牌SLD5256TFSE
产地	山东省		
合格证号	YU68921MX052501	进口证明书号	无
商检单号	无		
发动机号码	3621C003110	车辆识别代号/车架号码	LZGCL2R40MX052501
价税合计	⊗ 陆拾陆万圆整	小写	¥660000.00
销货单位名称	山东陆达机械设备有限公司	电话	0530-8158808
纳税人识别号	913717243130046356	账号	中国建设银行巨野支行37001817401050157036
地址	巨野县凤凰街道办事处东关（彭泽路东段路北）	开户银行	中国建设银行巨野支行37001817401050157036
增值税税率或征收率	13%	增值税税额	¥75929.20
主管税务机关及代码	国家税务总局巨野县税务局永丰税务分局 13717242700		
不含税价小写	¥584070.80	完税凭证号码	
吨位	8.67	限乘人数	2
销货单位盖章		开票人	杨忠民
备注：一车一票			

第二联 抵扣联（购货单位扣税凭证）

（手开无效）





准予变更登记通知书

(安县市监)登记内变字[2022]第115号

河南寄景建筑工程有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 河南寄景建筑工程有限公司 ，变更后名称 河南泰捷建设有限公司 ）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

安阳县市场监督管理局
企业注册登记专用章

2022年7月20日

河南泰捷建设有限公司
4105220037504

李奇文印

技术负责人资料


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汤阴县公安局
有效期限 2018.07.12-2038.07.12


姓名 杨荣
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 4 月 8 日
住址 河南省汤阴县五陵镇五陵四街村335号
公民身份号码 410523198304086523


河南水诚建设工程有限公司 4105220037504


从事专业 Speciality 交通
专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师
评审组织 Organization Of Evaluation 平顶山市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
评审通过时间 Time Of Adoption 2016.11
发证单位 Issuing Authority 平顶山市人民政府
姓名 Full Name 杨荣 性别 Sex 女
出生年月 Birthdate 1983.04 籍贯 Native Place
工作单位 Work Unit 河南水诚建设工程有限公司
证书编号 Credentials No. C0466616090035
2017 年 4 月 10 日


河南水诚建设工程有限公司 4105220037504


李奇文印

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：河南鑫建建筑有限公司　　法定代表人：李奇

注册地址：河南省洛阳市偃师区首阳路与府后路西北角

乙方：杨保　性别：女　年龄：40　身份证号：410321198304086423

家庭住址：河南省洛阳偃师区缑氏镇马陵四河村村北第一排

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为：1年　期限劳务合同。

本合同于2022年7月21日生效，其中试用期至2022年8月20日止。

本合同于2023年7月20日　终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在：/　岗位（工种）工作。

乙方工作应达到：尽职尽责　标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行：标准　工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周工作40小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月/日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行/工资制度。

乙方工资标准为每月3200元，其中基本工资每月/元。

乙方在试用期间的工资为每月/元。

甲乙双方对工资的其他约：/。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方应建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项

_____

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。


甲方（盖章）：　　乙方（签章）：杨保

法定代表或委托代理人（签章）：　　签订时间：2022年7月21日

签证机关（盖章）　签证人：（签章）　签证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

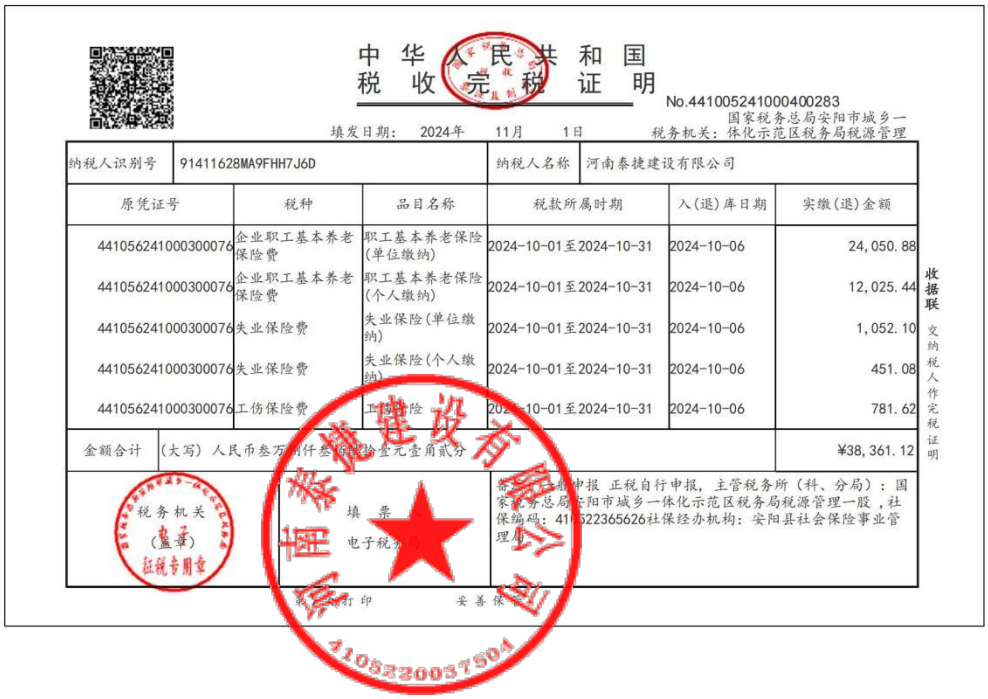

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000400283

填发日期：2024年 11月 1日　　税务机关：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理

纳税人识别号	91411628MA9FHH7J6D	纳税人名称	河南泰捷建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056241000300076	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	24,050.88
441056241000300076	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	12,025.44
441056241000300076	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	1,052.10
441056241000300076	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	451.08
441056241000300076	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	781.62
金额合计	(大写) 人民币叁万捌仟叁佰陆拾叁元壹角贰分				¥38,361.12


税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理一股，社保编码：41[illegible]22365626社保经办机构：安阳县社会保险事业管理局

第[illegible]次打印　　安善保管

收据联 交纳税人作完税证明

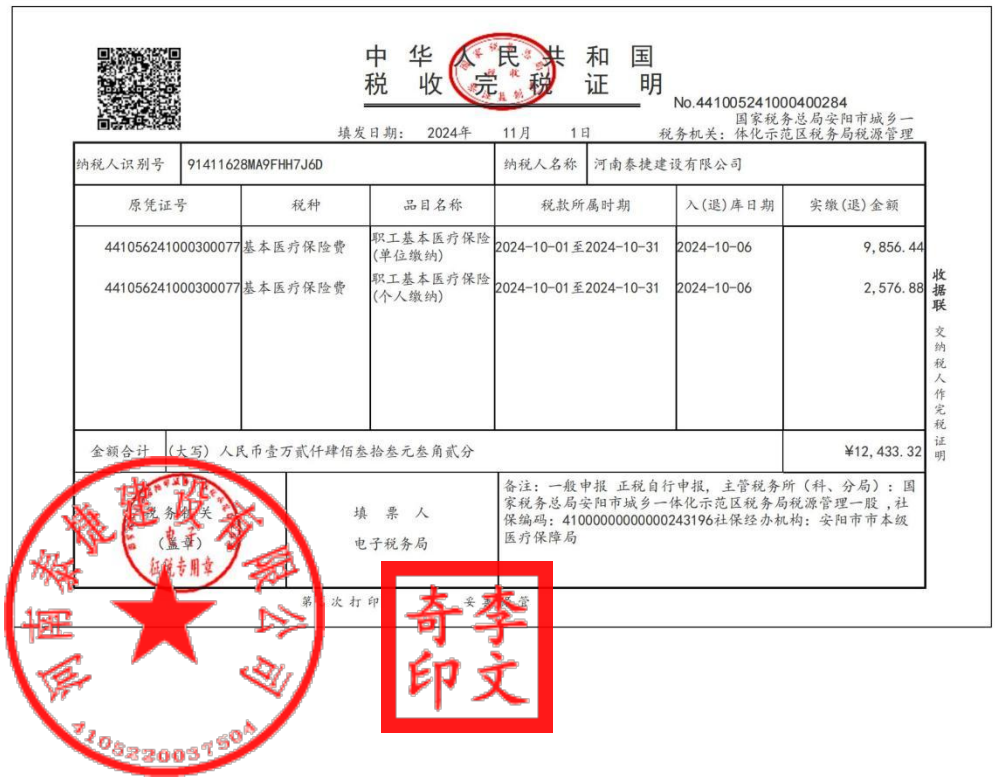

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005241000400284

填发日期：2024年 11月 1日　　税务机关：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理

纳税人识别号	91411628MA9FHH7J6D	纳税人名称	河南泰捷建设有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056241000300077	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	9,856.44
441056241000300077	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-06	2,576.88
金额合计	(大写) 人民币壹万贰仟肆佰叁拾叁元叁角贰分				¥12,433.32

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理一股，社保编码：41000000000000243196社保经办机构：安阳市市本级医疗保障局

第[illegible]次打印　　安善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341055241000053427

填发日期：2024年11月1日　　税务机关：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411628MA9FHH7J6D		纳税人名称	河南泰捷建设有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056241000063391	印花税	经济合同	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-17	181.86
341056241000063391	印花税	经济合同	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-17	9.59
金额合计	（大写）人民币壹佰玖拾壹元肆角伍分				¥191.45
税务机关（盖章）		填票人 电子税务	备注：一般申报 正税自行申报工程施工合同，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理一股		

征税专用章

第3次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 341055241000049771

填发日期：2024年11月1日　　税务机关：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局

纳税人识别号	91411628MA9FHH7J6D		纳税人名称	河南泰捷建设有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056241000060835	增值税	其他行业	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-17	132.18
341056241000060835	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-17	354.45
341056241000060835	教育费附加	增值税教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-17	531.68
341056241000060835	城市维护建设税	市区	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-17	1,240.58
341056241000060835	增值税	建筑服务	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-17	35,313.10
金额合计	（大写）人民币叁万柒仟伍佰柒拾壹元玖角玖分				¥37,571.99
税务机关（盖章）		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局税源管理一股		

征税专用章

第3次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

李奇文印

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

近三年无重大违法记录的声明函

河南博科工程管理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。特此承诺。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024 年 11 月 8 日

3.2项目（标段）资格要求，并提供相关资格证明材料

（1）供应商须具有公路工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。



统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2021]004223

企业名称：河南泰捷建设有限公司

法定代表人：李文奇

单位地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)


许可范围：建筑施工

有效期：2024 年08 月02 日 至 2027 年08 月02 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年08 月02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



建筑业企业资质证书（副本）

企业名称：河南泰捷建设有限公司

详细地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内0

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914[illegible]28MA9FHH7J6D 法定代表人：李文奇

注册资本：5000万元人民[illegible] 经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D341305127 有效期：至2026年01月27日

资质类别及等级：

建筑工程施工总[illegible]承包贰级

公路工程施工总[illegible]承包贰级

市政公用工程施[illegible]总承包贰级

地基基础工程专[illegible]业承包贰级

桥梁工程专业承[illegible]包贰级

公路路面工程专业承包贰级

公路路基工程专业承包贰级

环保工程专业承包贰级

施工劳务不分等级

****

发证机关：

2023年 11月 01日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

NO.DF 22773818

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

承 诺 书

我方承诺：

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

（2）供应商拟派项目经理须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证，项目经理承诺无在建。







中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：任静

性　　别：女

出生日期：1990-01-23

注册编号：豫241212288932

聘用企业：河南泰捷建设有限公司

注册专业：公路工程　　（2022年07月07日 至 2025年07月06日）



河南省
住房和城乡建设厅

签发日期：2022年7月7日

个人签名：任静

签名日期：2024年7月4日

河南省专业技术人员
职业资格证书

任静　参加　二级建造师

考试，全部成绩合格，具有　二级

建造师（公路工程）　职业资格。

资格取得时间　2021　年　05　月　23　日。



身份证号：410223199601235028

管 理 号：

查　　询：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号：94204146002

签发时间：2021 年 10 月 15 日

证书专用章

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方_河南秦捷建设有限公司_ 法定代表人_李文奇_

注册地址_河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号_

乙方_任静_ 性别_女_ 年龄_29_ 身份证号_410223199601235028_

家庭住址_河南省尉氏县门楼任乡赵存村三组_ 邮编_455000_

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为_5年_期限劳务合同。

本合同于_2023_年_12_月_30_日生效，其中试用期至_/_年_/_月_/_日止。本合同于_2028年12月29日_终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在_项目经理_岗位（工种）工作。

乙方工作应达到_尽职尽责_标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行_标准_工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月_15_日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行_/_工资制度。

乙方工资标准为每月_3600_元，试用期工资每月_/_元。

乙方在试用期间的工资每月_/_元。

甲乙双方对工资的其他约定_/_。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项_____

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签章）任静

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：2023 年 12 月 30 日

签证机关（盖章）　鉴证人：（签章）　鉴证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

项目经理无在建承诺书

安阳市龙安区龙泉镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 任静（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理，并承诺参与施工全过程，未经采购人书面同意不予更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

（3）无不良信用记录；（未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。




承　诺　书

我公司承诺：

我方在此声明，我方未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

日期：2024年11月8日

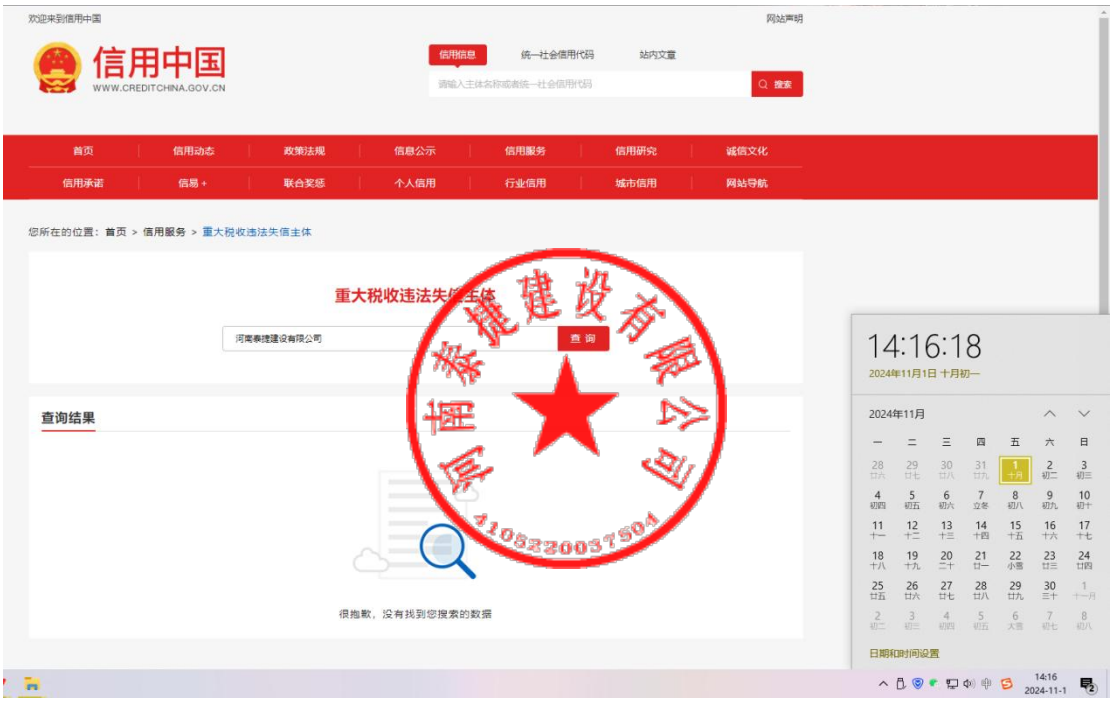
欢迎来到信用中国
网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
河南泰捷建设有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
14:16:18
2024年11月1日 十月初一
2024年11月
日期和时间设置
14:16
2024-11-1


财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线：400-810-1996
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：河南泰捷建设有限公司
执法单位：
至
查询前，请至少输入一个查询条件
查找
重置
序号
企业名称
统一社会信用代码
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
没有该企业的相关记录
本次查询的企业：河南泰捷建设有限公司
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕52号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：安阳市龙安区龙泉镇人民政府(采购人名称)

在项目编号为 安龙财磋商采购-2024-20 的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡二龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

（5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：安阳市龙安区龙泉镇人民政府(采购人名称)

在项目编号为 安龙财磋商采购-2024-20 的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡二龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：河南泰健建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

资料真实承诺书

我方承诺：

我公司承诺对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。投标文件中原件扫描件真实有效，公示期间被质疑的，经查实发现提供虚假证明的一一律按无效标处理，并取消中标候选人资格，上报行政主管管理部门，计入黑名单，清出安阳市场。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写*）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____/___单位的___/____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：河南泰捷建设有限公司

日　　期：2024年11月8日

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式由符合在册残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购）中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。

近三年无重大违法记录的声明函

河南博科工程管理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。特此承诺。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

项目经理无在建承诺书

安阳市龙安区龙泉镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 任静（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理，并承诺参与施工全过程，未经采购人书面同意不予更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：安阳市龙安区龙泉镇人民政府(采购人名称）

在项目编号为 安龙财磋商采购-2024-20 的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效，承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：安阳市龙安区龙泉镇人民政府(采购人名称）、河南博科工程管理有限公司

在项目编号为 安龙财磋商采购-2024-20 的 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照《磋商文件》规定，在提交《响应文件》截止时间后，在《磋商文件》规定的投标有效期限内不撤回《响应文件》；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗拒力或《磋商文件》认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及《磋商文件》规定的其他情况；

七、按《磋商文件》规定及时缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标的，中标（成交）无效；

2、支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业，不予办理其后相关业务。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：李奇文

日期：2024年1月8日

十二、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名〈签章〉。条款中对电子签名〈签章〉未作明确要求的，由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

/

十三、供应商须知所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

实质性响应

我公司承诺并响应招标文件以下内容：

一、项目基本情况

1、采购项目编号：安龙财磋商采购-2024-20

2、采购项目名称：安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1275058元

最高限价：1275058元

序号	包号	包名称	报预算（元）	包高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	安龙财磋商采购-2024-20	安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程	1275058元	1275058元	是	1275058元

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、技术要求或服务要求等）

5.1采购内容：工程量清单、图纸及磋商文件包含的全部内容；

5.2质量要求：合格

5.3工程地址：安阳市龙安区龙泉镇

5.4工期：60 日历天

5.5资金来源：财政

6、合同履行期限：60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺（格式自拟）并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚；

3.2项目（标段）资格要求，并提供相关资格证明材料

（1）供应商须具有公路工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）供应商拟派项目经理须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证，项目经理承诺无在建。

（3）无不良信用记录；（未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

注：（1）所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

2.资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由磋商小组对供应商的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

第二章　采购项目及技术服务要求

1.采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1采购项目名称：

1.2标段（包）划分及其工期、施工地点：本次采购项目划分为1个标段（包）。

标段（包）一览表				
项目名称	标段（包）名称	标段（包）内容（范围）	工期	施工地点
安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程	安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程	见“第二章第2条标段（包）内容（范围）及基本技术要求”	见竞争性磋商公告	安阳市龙安区龙泉镇

1.3磋商报价（价格构成）

1.3.1供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括：材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权（如有）、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2本次竞争性磋商共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格磋商）。磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据《磋商文件》“第三章3.5.5违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章“评审办法”第“3.4.7价格磋商”条款。

1.3.3如供应商的磋商报价未超过预算金额（见竞争性磋商公告）的供应商不足三

家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4遵循第三章“供应商须知”3.7.5项规定。

2.标段（包）内容（范围）及基本技术要求

2.1 标段（包）内容（范围）及基本技术要求

龙安区龙泉镇X005西王线(陈家坡-龙安大道)改造工程项目，位于安阳市龙安区龙泉镇，起点位于陈家坡，自东向西止于龙安大道，路线全长约1.19km。拟建项目路基宽度11.0米，具容体断面布置11.0米=1.0米(路肩)+9.0米(行车道)+1.0米(路肩)，沥青混凝土路面。本项目道路采用原三级公路标准建设，设计速度40km/h。主要内容为:中修罩面，局部破碎板挖补后统一铺筑5cmAC-16C中粒式沥青混凝土，并完善交通安全设施。

2.2 成交供应商需自行协调周边施工环境，不得延误工期。

2.3 编制说明

(一)建设单位提供的有关资料

施工图纸、预算书及其它相关资料。

(二)采用定额及取费

1、河南省2021公路工程概预算标准分项-豫交定【2021】1号;

2、定额及计价规范:《公路工程预算定额(JTG3832-2018)》《河南省普通公路养护工程预算定额》及配套的相关文件。

(三)材料价格的确定

材料价格均按《安阳建设工程造价信息》2024年第4期、《河南省交通工程造价信息》和现行市场价格执行。

(四)国家、省、市有关法律、法规及相关规定及相关政策文件。

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

十四、评审办法所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

供应商获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况

声明函

安阳市龙安区龙泉镇人民政[illegible]

因本公司 ISO 质量、环境、职业安全健康管理体系三项认证目前处于正在审核当中，全国认证认可信息公共服务平台上也有显示暂停开始日期 2023-08-24，暂停结束日期为 2024-02-23，因审核流程未走完，所以网上截图显示暂停状态，证书上显示注册有效期:2022 年 08 月 25 日至 2025 年 08 月 24 日。本证书目前在有效期内，真实有效。有其他后果有本公司承担。

特此声明！

河南泰捷建设有限公司

2024 年 11 月 7 日

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation | 全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

说明：以上结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

证书编号	672Q22080825246
证书状态	暂停
暂停开始日期	2023-08-24
暂停结束日期	2024-02-23
原证日期	2022-08-25
证书到期日期	2025-08-24
初次获证日期	2022-08-25
信息上报日期	2023-08-24
监督次数	0
再认证次数	0
认证项目	建设施工行业质量管理体系认证
认证依据	GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017
认证覆盖的业务范围	公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工。（需资质许可的凭资质经营）
是否覆盖多场所	否
认证覆盖的场所名称及地址	
证书使用的认可标识	
EC9000证书 建筑施工企业质量管理体系认证对应的QMS覆盖范围	公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工。（需资质许可的凭资质经营）

打印

获证组织基本信息

质量管理体系认证证书

兹证明

河南泰捷建设有限公司

证书编号：67202208080825246

统一社会信用代码：91411622MA9FHH7J6D

注册地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白壁镇原镇政府院内010119号

审核地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白壁镇原镇政府院内010119号；河南省安阳市文峰区海兴御花园33号楼二单元202室

经评审符合以下标准要求

ISO 9001:2015 idt GB/T 19001-2016

GB/T 50430-2017

认证范围

公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工。（需资质许可的凭资质经营）

本认证证书的范围和其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围及CCC认证等。在证书持有者的质量管理体系持续符合标准要求的运行条件下，本证书的注册有效期是三年，证书的有效性需经SCI定期的监督审核确认有效，本张证书使用期限至**2023年08月24日**，请于此日期前完成监督审核或再认证，逾期未通过审核，本张证书作废。

注册有效期：2022年08月25日至2025年08月24日

签发：

青岛标认检验认证有限公司

证书查询方式：1.全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/

2.公司官网：www.biaorenrenzheng.com

邮箱：biaorengroup@163.com

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

This is to certify that

Henan Taijie Construction Co., Ltd.

Certificate No.:G72Q22080825246

Organization code：91411628MA9FHH7J6D

Registered address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province.

Audit address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province;Room 202,Unit 2,Building 33,Haixing Royal Garden,Wenfeng District,Anyang City,Henan Province.

After evaluation, it meets the requirements of the following standards

ISO 9001:2015 idt GB/T 19001-2016

GB/T 50430-2017

Scope of certification

Highway engineering construction,municipal public works construction,building engineering construction.(The scope requiring qualification permission shall be operated with qualification)

The scope of this certificate shall be used together with the effective laws and regulations involved.The requirements include but are not limited to administrative license,qualification scope and CCC certification.Under the condition that the quality management system of the certificate holder continuously meets the requirements of the standard,the validity period of this certificate is three years.The validity of the certificate shall be confirmed by regular supervision and audit of SCI.This certificate is valid until **Aug.24,2023**. Please complete the supervision audit or recertification before this date. If you fail to pass the audit within the time limit, this certificate will be invalid.

Validity of registration: Aug.25,2022 to Aug.24,2025

Issuer：

Qingdao Standard Certification Inspection Co., Ltd

Certificate query method：

1.National certification and accreditation information public service platform：http://cx.cnca.cn/

2.Company website：www.biaorenrenzheng.com

E-mail：biaorengroup@163.com

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 证书编号 672E22080825246
- 证书状态 暂停
- 暂停开始日期 2023-08-24
- 暂停结束日期 2024-02-23
- 颁证日期 2022-08-25
- 证书有效期 2025-08-24
- 初次获证日期 2022-08-25
- 信息上报日期 2023-08-24
- 监督次数 0
- 再认证次数 0
- 认证项目 环境管理体系认证
- 认证依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证覆盖的业务范围 公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及相关场所所涉及的环境管理活动。（需资质许可的凭资质经营）
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址
- 证书使用的认可标识
- 证书附件下载

打印

获证组织基本信息

环境管理体系认证证书

兹证明

河南泰捷建设有限公司

证书编号：672E2208080825246

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

注册地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内 010119 号

审核地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内 010119 号；河南省安阳市文峰区海兴御花园 33 号楼二单元 202 室

经评审符合以下标准要求

ISO 14001:2015 idt GB/T 24001-2016

认证范围

公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及相关场所所涉及的环境管理活动。（需资质许可的凭资质经营）

本认证证书的范围和其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围及 CCC 认证等。在证书持有者的环境管理体系持续符合标准要求的运行条件下，本证书的注册有效期是三年，证书的有效性需经 SCI 定期的监督审核确认有效，本张证书使用期限至 2023 年 08 月 24 日，请于此日期前完成监督审核或再认证，逾期未通过审核，本张证书作废。

注册有效期：2022 年 08 月 25 日至 2025 年 08 月 24 日

签发：

青岛标认检验认证有限公司

证书查询方式：1. 全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/

公司官网：www.biaorenzheng.com

邮箱：biaorengroup@163.com

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

This is to certify that

Henan Taijie Construction Co., Ltd.

Certificate No.:072E22080825246

Organization code：91411628MA9FHH7J6D

Registered address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province.

Audit address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province;Room 202,Unit 2,Building 33,Haixing Royal Garden,Wenfeng District,Anyang City,Henan Province.

After evaluation, it meets the requirements of the following standards

ISO 14001:2015 idt GB/T 24001-2016

Scope of certification

Highway engineering construction,municipal public works construction,building engineering construction and environmental management activities involved in relevant sites.(The scope requiring qualification permission shall be operated with qualification)

The scope of this certificate shall be used together with the effective laws and regulations involved.The requirements include but are not limited to administrative license,qualification scope and CCC certification.Under the condition that the environmental management system of the certificate holder continuously meets the requirements of the standard,the validity period of this certificate is three years.The validity of the certificate shall be confirmed by regular supervision and audit of SCI.This certificate is valid until **Aug.24,2023**. Please complete the supervision audit or recertification before this date. If you fail to pass the audit within the time limit, this certificate will be invalid.

Validity of registration: Aug.25,2022 To:Aug.24,2025

Issuer:

Qingdao Standard Certification Inspection Co., Ltd

Certificate query method:

1.National certification and accreditation information public service platform:http://cx.cnca.cn/

2.Company website：www.biaorenrenzheng.com

E-mail：biaorengroup@163.com

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- 证书编号 672S22080825246
- 证书状态 暂停
- 暂停开始日期 2023-08-24
- 暂停结束日期 2024-02-23
- 颁证日期 2022-08-25
- 证书到期日期 2025-07-24
- 初次获证日期 2022-08-25
- 最近一次变更报告日期 2023-08-24
- 监督次数 0
- 再认证次数 0
- 认证项目 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据 GB/T45001-2020/ISO 45001：2018
- 认证覆盖的业务范围 公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及相关场所所涉及的职业健康安全管理活动。（需资质许可的凭资质经营）
- 是否覆盖多场所 否
- 认证覆盖的场所名称及地址
- 证书使用的认可标识
- 证书附件下载

打印

获证组织基本信息

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

河南泰捷建设有限公司

证书编号：672S2208080825246

统一社会信用代码：91411622M[illegible]9FHH7J6D

注册地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白壁镇原镇政府院内010119号

审核地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白壁镇原镇政府院内010119号；河南省安阳市文峰区海兴御花园33号楼二单元202室

经评审符合以下标准要求

ISO 45001:2018 idt GB/T 45001-2020

认证范围

公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及相关场所所涉及的职业健康安全管理活动。（需资质许可的凭资质经营）

本认证证书的范围和其涉及的有效法律法规要求一并使用，该要求包含但不限于行政许可、资质范围及CCC认证等。在证书持有者的职业健康安全管理体系持续符合标准要求的运行条件下，本证书的注册有效期是三年，证书的有效性需经SCI定期的监督审核确认有效，本张证书使用期限至**2023年08月24日**，请于此日期前完成监督审核或再认证，逾期未通过审核，本张证书作废。

注册有效期：2022年08月25日至2025年08月24日

签发：

青岛标认检验认证有限公司

证书查询方式：1.全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/

2.公司官网：www.biaorenrenzheng.com

邮箱：biaorengroup@163.com

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYMANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

This is to certify that

Henan Taijie Construction Co., Ltd.

Certificate No.:672S22080825246

Organization code: 91411628MA9FHH7J6D

Registered address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province.

Audit address:No.010119,Yuan Town Government Courtyard,Baibi Town,Urban-rural Integration Demonstration Zone,Anyang City,Henan Province;Room 202,Unit 2,Building 33,Haixing Royal Garden,Wenfeng District,Anyang City,Henan Province.

After evaluation, it meets the requirements of the following standards

ISO 45001:2018 idt GB/T 45001-2020

Scope of certification

Highway engineering construction,municipal public works construction,building engineering construction and occupational health and safety management activities involved in relevant sites.(The scope requiring qualification permission shall be operated with qualification)

The scope of this certificate shall be used together with the effective laws and regulations involved.The requirements include but are not limited to administrative license,qualification scope and CCC certification.Under the condition that the occupational health and safety management system of the certificate holder continuously meets the requirements of the standard,the validity period of this certificate is three years.The validity of the certificate shall be confirmed by regular supervision and audit of SCI.This certificate is valid until **Aug.24,2023**. Please complete the supervision audit or recertification before this date. If you fail to pass the audit within the time limit, this certificate will be invalid.

Validity of registration: Aug.25,2022 to Aug.24,2025

Issuer:

Qingdao Standard Certification Inspection Co., Ltd

Certificate query method:

1.National certification and accreditation information public service platform:http://cx.cnca.cn/

2.Company website: www.biaorenrenzheng.com

E-mail: biaorengroup@163.com

项目人员配备

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	任静	建造师	建造师	二级	豫241212288932	市政公用工程
技术负责人	杨荣	工程师	工程师	中级	C0466616090003 5	市政公用工程
施工员	李斌	技术员	施工员证	/	22010101000786 49	/
材料员	王勇	技术员	材料员证	/	04122111000010 00006	/
资料员	张宁心	技术员	资料员证	/	04122114000010 00006	/
安全员	陈智	技术员	安全生产考核证书	/	豫建安C3(2023)1149523	/
质量员	陈鹏	技术员	质量员证	/	22010301000785 06	/

（2）供应商拟派项目经理须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证，项目经理承诺无在建。







中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：任静

性　　别：女

出生日期：1990-01-23

注册编号：豫241212288932

聘用企业：河南泰捷建设有限公司

注册专业：公路工程　　（2022年07月07日 至 2025年07月06日）



河南省
住房和城乡建设厅

签发日期：2022年7月7日

个人签名：任静

签名日期：2024年7月4日

河南省专业技术人员
职业资格证书

任静　参加　二级建造师

考试，全部成绩合格，具有　二级

建造师（公路工程）　职业资格。

资格取得时间　2021　年　05　月　23　日。



身份证号：410223199601235028

管 理 号：

查　　询：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号：94204146002

签发时间：2021 年 10 月 15 日

证书专用章

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方_河南秦捷建设有限公司_ 法定代表人_李文奇_

注册地址_河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号_

乙方_任静_ 性别_女_ 年龄_29_ 身份证号_410223199601235028_

家庭住址_河南省尉氏县门楼任乡赵存村三组_ 邮编_455000_

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为_5年_期限劳务合同。

本合同于_2023_年_12_月_30_日生效，其中试用期至_/_年_/_月_/_日止。本合同于_2028年12月29日_终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在_项目经理_岗位（工种）工作。

乙方工作应达到_尽职尽责_标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行_标准_工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月_15_日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行_/_工资制度。

乙方工资标准为每月_3600_元，试用期工资每月_/_元。

乙方在试用期间的工资每月_/_元。

甲乙双方对工资的其他约定_/_。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项_____

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签章）任静

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：2023 年 12 月 30 日

签证机关（盖章）　鉴证人：（签章）　鉴证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

表单验证号码85c62c5535524a1997cd8644cabb4a90

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410223199601235028		
社会保障号码	410223199601235028	姓　名	任静	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202206	-
河南省高远公路养护技术有限公司	企业职工基本养老保险	201908	202205
河南省高远公路养护技术有限公司	工伤保险	202205	202310
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202206	-
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202206	-
河南省高远公路养护技术有限公司	失业保险	201908	202205
河南省高远公路养护技术有限公司	工伤保险	201908	202205

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-08-01	参保缴费	2019-08-01	参保缴费	2019-08-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2024-11-07

表单验证号码2766fdf56e5740be895972294ecaff63

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202411　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	任静	个人编号	41074090004700	证件号码	410223199601235028	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1996-01-23	
参加工作时间	2019-08-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2019-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201908-202312	0.00	0.00	13406.40	1641.18	15047.58	52	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	16269.60	1641.18	17910.78	62	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	3261	3261
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019								▲	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	2021	▲	●	▲	●	▲	●	●	●	▲	●	●	●
2022	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-11-06

项目经理无在建承诺书

安阳市龙安区龙泉镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 安阳市龙安区龙泉镇X005西王线（陈家坡-龙安大道）改造工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 任静（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目经理，并承诺参与施工全过程，未经采购人书面同意不予更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（电子签章）：河南泰捷建设有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2024年11月8日

技术负责人资料


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汤阴县公安局
有效期限 2018.07.12-2038.07.12


姓名 杨荣
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 4 月 8 日
住址 河南省汤阴县五陵镇五陵四街村335号
公民身份号码 410523198304086523


河南水诚建设工程有限公司 4105220037504


从事专业 Speciality 交通
专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师
评审组织 Organization Of Evaluation 平顶山市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
评审通过时间 Time Of Adoption 2016.11
发证单位 Issuing Authority 平顶山市人民政府
姓名 Full Name 杨荣 性别 Sex 女
出生年月 Birthdate 1983.04 籍贯 Native Place
工作单位 Work Unit 河南水诚建设工程有限公司
证书编号 Credentials No. C0466616090035
2017 年 4 月 10 日


河南水诚建设工程有限公司 4105220037504


李奇文印

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：河南鑫建建筑有限公司　　法定代表人：李奇

注册地址：河南省洛阳市偃师区首阳路与府后路西北角

乙方：杨保　性别：女　年龄：40　身份证号：410321198304086423

家庭住址：河南省洛阳偃师区缑氏镇马陵四河村村北第一排

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为：1年　期限劳务合同。

本合同于2022年7月21日生效，其中试用期至2022年8月20日止。

本合同于2023年7月20日　终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在：/　岗位（工种）工作。

乙方工作应达到：尽职尽责　标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行：标准　工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周工作40小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月/日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行/工资制度。

乙方工资标准为每月3200元，其中基本工资每月/元。

乙方在试用期间的工资为每月/元。

甲乙双方对工资的其他约：/。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方应建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项

_____

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）：　　乙方（签章）：杨保

法定代表或委托代理人（签章）：　　签订时间：2022年7月21日

签证机关（盖章）　签证人：（签章）　签证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

表单验证号码d155231941894a09a89b897a2e515467

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410523198304086523		
社会保障号码	410523198304086523	姓　名	杨荣	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南鹤建消防科技有限公司	企业职工基本养老保险	201404	201409
安阳市恒达公路发展有限责任公司	企业职工基本养老保险	201911	202203
安阳市恒达公路发展有限责任公司	失业保险	201911	202203
安阳市恒达公路发展有限责任公司	工伤保险	201911	202203
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202310	-
林州市红旗渠公路工程有限公司	工伤保险	201904	201910
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202203	-
林州市红旗渠公路工程有限公司	企业职工基本养老保险	201902	201910
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202203	-
林州市中宏建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201512	201601

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-12-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费	2019-04-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，-表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象在在多个单位参保时，只参加养老保险所在单位为准。

表单验证号码d155231941894a09a89b897a2e515467

打印时间：2024-11-07

表单验证号码0a8316de42274711b1b7c537699f7278

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	杨荣	个人编号	41058190167730	证件号码	410523198304086523	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1983-04-08	
参加工作时间	2015-12-01	参保缴费时间	2015-12-01	建立个人账户时间	2014-04	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201404-202312	0.00	0.00	15638.96	2726.64	18365.60	66	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	18502.16	2726.64	21228.80	76	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	1699	1869	2056	2262	2488	2737	3011	3020	3322
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014				●	●	●	▲	▲	▲				2015												●
2016	▲												2017												
2018													2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
2020	●	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
2022	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08


河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

施工员







姓　　名　李斌

身份证号　410522198911115283X

证书编号　[illegible]

工作单位　河南嘉晟建筑工程有限公司

同志于　2022　年　李斌　02月25日至　2022年03月09日　参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2022　年03月12日

有效期至：2025年03月12日

准予变更登记通知书

(安县市监)登记内变字[2022]第115号

河南寄景建筑工程有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称：河南寄景建筑工程有限公司，变更后名称：河南泰捷建设有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

安阳县市场监督管理局
企业注册登记专用章

2022年7月20日

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方 河南鑫捷建设有限公司 法定代表人 李涛

注册地址 河南省郑州市城乡一体化示范区白坡镇后胡及后陈内01101号

乙方 [illegible] 性别 男 年龄 33 身份证号 41052219891115283X

家庭住址 河南省郑州市荥阳市豫龙镇刘乡北大顺村 邮编 _____

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 5年 期限劳务合同。

本合同于 2022 年 7 月 21 日生效，其中试用期至 / 年 / 月 / 日止。

本合同于 2027年 7月 20日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 _____ 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 尽职尽责 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方休息休假，加需加班应按相关标准支付报酬。

第四条 劳动报酬

甲方每月 [illegible] 日以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 _____ 工资制度。

乙方工资标准为 [illegible]197 元，其中基本工资每月 [illegible] 元。

乙方在试用期间的工资每月 _____ 元。

甲乙双方对工资的其他约 _____ /。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条 劳动合同的解除和终止

劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条 甲乙双方约定的其他事项 _____

/

第十一条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章） 乙方（签章）[illegible]

法定代表或委托代理人（签章） 签订时间：2022 年 7 月 21 日

签证机关（盖章） 签证人：（签章） 签证时间： 年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

表单验证号码0f10d8b5101c4da6b91e3b7e0f7d04ec

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410522198911115283X		
社会保障号码	410522198911115283X	姓　名	李斌	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201704	201811
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202203	202301
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202203	-
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202304	-
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202203	202301
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202001	202203
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201901	202203
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201603	201611
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202001	202203
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202304	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-01-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2016-03-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险若人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，表示正常参保。

表单验证号码0f10d8b5101c4da6b91e3b7e0f7d04ec

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

社会保险 业务查询专用章

打印时间：2024-11-07

表单验证号码4debe030f85c4f05a90b93fe8b4a430b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	李斌	个人编号	41052290075963	证件号码	410522198911152 83X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1989-11-15	
参加工作时间	2016-03-01	参保缴费时间	2020-01-01	建立个人账户时间	2020-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202002-202312	0.00	0.00	12043.92	1257.51	13301.43	47	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	14907.12	1257.51	16164.63	57	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费总额	0.00	个人欠费总额	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	3020	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020		▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08

社会保险 业务查询专用章

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

材料员


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 安阳市公安局文峰分局
有效期限 2005.12.18-2025.12.18


王勇
男 汉
1977 8 10
河南省安阳市文峰区相州路215号院3号楼1号
410511197708105014


证书编码：04122111000001000006
住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证
姓 名：王勇
身份证号：410511197708105014
岗位名称：材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。
培训机构：郑州建设教育培训中心
发证日期：2022年03月17日
查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：河南省捷建设有限公司　　法定代表人：赵涛

注册地址：河南省安阳市文峰区-殷化示范区白里镇原镇政府院内01119号

乙方：王勇　　性别：男　　年龄：46　　身份证号：410511197108105014

家庭住址：河南省安阳市文峰区扬州路245号院3号楼1号　　邮编：_____

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 5年 期限劳务合同。

本合同于 2022 年 7 月 21 日生效，其中试用期至 / 年 / 月 / 日止。

本合同于 2027年7月20 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 / 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 尽职尽责 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 标准 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方法定节假休假，加需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月 / 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 / 工资制度。

乙方工资标准为每月 3200 元，其中基本工资每月 / 元。

乙方在试用期间的工资每月 / 元。

甲乙双方对工资的其他约定 / 。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项_____

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签字）：王勇

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：2022 年 7 月 21 日

签证机关（盖章）　签证人：（签章）　签证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动合同书监制

表单验证号码e5924548864d4a5f8a9cd372f294258d

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410511197708105014		
社会保障号码	410511197708105014	姓　名	王勇	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南润安建设集团有限公司	失业保险	200602	201410
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202001	202206
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202206	-
河南润安建设集团有限公司	工伤保险	200602	201410
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202206	-
河南润安建设集团有限公司	工伤保险	201411	201410
劳务市场灵活就业人员缴费专库	企业职工基本养老保险	201411	202001
河南润安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	200602	201410
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202206	-
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202001	202206
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	202102	202206

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2006-02-01	参保缴费	2006-02-01	参保缴费	2006-02-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示转地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保人对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险的单位为准。

李印文

安阳县人力资源和社会保障局 社会保险业务查询专用章

表单验证号码e5924548864d4a5f8a9cd372f294258d

打印时间：2024-11-07

表单验证号码c08007801cf346829a9275dd2aa2c5c2

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	王勇	个人编号	41059990229647	证件号码	410511197708105014	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1977-08-10	
参加工作时间	2005-10-15	参保缴费时间	2006-02-01	建立个人账户时间	2006-02	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200602-202312	105.00	143.65	37630.08	19004.67	56883.40	215	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	105.00	143.65	40493.28	19004.67	59746.60	225	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费总额	0.00	个人欠费总额	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
			700	671	900	927	1100	1360	2550
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2745	3020	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	●	▲	●	2019	▲	●	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲
2020	▲	▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08

社会保险 业务查询专用章

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

资料员


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 安阳县公安局
有效期限 2023.09.08-2043.09.08


姓名 张宁心
性别 女 民族 汉
出生 1995 年 4 月 20 日
住址 河南省安阳县崔家桥乡高村579号
公民身份号码 410522199504204043


证书编号：04122114000001000006
住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证
姓 名：张宁心
身份证号：410522199504204043
岗位名称：资料员
参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。
扫码验证
410522003750A
培训机构：郑州建设教育培训中心
发证时间：2022年03月17日
查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：河南泰捷建设有限公司　　法定代表人：崔彩涛

注册地：河南省安阳市林州一九九示范区合里镇原镇政府院内0-0119号

乙方：张守心　　性别：女　　年龄：27　　身份证号：410522199504264043

家庭住址：安阳县崔家桥乡南村　　邮编：_____

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 5年 期限劳务合同。

本合同于 2022年7月21日 生效，其中试用期至 ___年___月___日止。

本合同于 2027年7月21日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在_____岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 尽职尽责 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方享受法定节日休假。如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月___日以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行_____工资制度。

乙方工资标准为每月 3147 元，其中基本工资每月_____元。

乙方在试用期间的工资每月_____元。

甲乙双方对工资的其他约 / 。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

第九条　赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十条　甲乙双方约定的其他事项_____

/

第十一条　劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十二条　本合同未尽事宜或约定条款与今后国家或省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签章）：

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：2022 年 7 月 21 日

签证机关（盖章）　鉴证人：（签章）　鉴证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

奇李印文

表单验证号码405046aa0a3e406c9b474632c1b1e0c8

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410522199504204043		
社会保障号码	410522199504204043	姓　名	张宁心	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
牧原食品股份有限公司	工伤保险	202007	202012
牧原食品股份有限公司	企业职工基本养老保险	202007	202012
牧原食品股份有限公司	失业保险	202007	202012
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202203	-
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202203	-
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202203	-
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	202107	202203

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-07-01	参保缴费	2020-07-01	参保缴费	2020-07-24	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

安阳县人力资源和社会保障局 社会保险 业务查询专用章

打印时间：2024-11-07

表单验证号码ac0d649df3c1494b8be49c04ddf08e5c

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	张宁心	个人编号	41132520094634	证件号码	410522199504204043	
性别	女	民族	其他	出生日期	1995-04-20	
参加工作时间	2020-07-01	参保缴费时间	2020-07-01	建立个人账户时间	2020-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202312	0.00	0.00	6997.84	464.11	7461.95	26	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	9861.04	464.11	10325.15	36	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费总额	0.00	个人欠费总额	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								3100	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	▲	●	▲	●	2021												
2022				▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08

社会保险 业务查询专用章

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

安全员


中华人民共和国
居民身份证
陈智
男
1993 年 12 月 21 日
河南省安阳市龙安区乌投
镇陈贺驼村二胡同 2 号
410522199312212815
2017.12.04-2027.


建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书
编号：豫建安C3（2023）1149523
姓名：陈智
性别：男
出生年月：1993年12月21日
企业名称：河南泰捷建设有限公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2017年06月05日
有效期：2023年04月10日至2026年04月09日
发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年04月10日
河南泰捷建设有限公司
4105220037504
李奇文印

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方（盖章）　　乙方（签章）

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：　年　月　日

签证机关（盖章）　签证人：（签章）　签证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

甲方：河南泰捷建设有限公司　法定代表人 李涛

注册地址：河南省郑州市 城乡一体化示范区自贸路辰顺及南侧内01001号

乙方 陈浩　性别 男　年龄 24　身份证号 410522199312127815

家庭住址：兰考县 考城镇陈厚贾砦村　邮编_____

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 5年 期限劳务合同。

本合同于 2022 年 7 月 21 日生效，其中试用期至 / 年 / 月 / 日止。

本合同于 2027年 7月 20日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在_____岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 尽职尽责 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 7 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月_____日前以_____形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行_____工资制度。

乙方工资标准为每月_____元，其中基本工资每月_____元。

乙方在试用期间的工资每月_____元。

甲乙双方对工资的其他约_____。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

表单验证号码e662f30bf7304020ab8e21ac1266385a

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	410522199312212815		
社会保障号码	410522199312212815	姓　名	陈智	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201704	201811
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202203	202301
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201405	201411
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	202008	202203
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202203	-
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202304	-
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202001	202203
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202203	202301
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202001	202203
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201603	201611
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202304	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-01-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2014-05-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12				-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及近本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已缴实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

表单验证号码e662f30bf7304020ab8e21ac1266385a

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

社会保险
业务查询专用章

打印时间：2024-11-07

表单验证号码adb285f63a29471b83ce57f019226a30

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	陈智	个人编号	41052290073358	证件号码	410522199312212815	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-12-21	
参加工作时间	2014-05-01	参保缴费时间	2020-01-01	建立个人账户时间	2020-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202002-202312	0.00	0.00	12043.92	1257.51	13301.43	47	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	14907.12	1257.51	16164.63	57	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费总额	0.00	个人欠费总额	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	3020	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020		△	△	●	●	●	△	△	△	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08

社会保险 业务查询专用章

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

质量员


中华人民共和国
居民身份证
有效期限 2019.10.31-2039.10.31


陈鹏
男
1992 年 10 月 6 日
公民身份号码 41052219921006281


同志于 2022 年
陈鹏
02 月 25 日至 2022 年 03 月 09 日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 质量员（土建）职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。
姓 名 陈鹏
身份证号 41052219921006281X
证书编号 2201030100079
工作单位
发证单位
2022 年 03 月 12 日
有效期至：2025 年 03 月 12 日

准予变更登记通知书

(安县市监)登记内变字[2022]第115号

河南寄景建筑工程有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称：河南寄景建筑工程有限公司，变更后名称：河南泰捷建设有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

安阳县市场监督管理局
企业注册登记专用章

2022年7月20日

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：河南孝捷建设有限公司　　法定代表人：李孝飞

注册地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白壁镇辰悦府北门6119号

乙方：[illegible]　性别：男　年龄：30　身份证号：410521992****6281X

家庭住址：安阳市龙安区马投涧镇陌资驻村　　邮编：_____

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条　劳动合同期限

本合同为 5年 期限劳务合同。

本合同于 2022年7月21日生效，其中试用期至 /年/月/日止。

本合同于 2027年7月20日 终止。

第二条　工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在_____岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 尽职尽责 标准。

第三条　工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 9 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周工作 40 小时。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方在法定节假日休假，如需加班应按相关标准支付报酬。

第四条　劳动报酬

甲方每月_____日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行_____工资制度。

乙方工资标准为每月[illegible]元，其中基本工资每月[illegible]元。

乙方在试用期间的工资每月_____元。

甲乙双方对工资的其他约定：_____。

第五条　保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条　规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训等，对职工有计划的进行定期培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条　劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方依法建立安全生产制度，乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，[illegible]章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格证书后方可上岗。

第八条　劳动合同的解除和终止

本劳动合同的解除或终止，依照《中华人民共和国劳动合同法》及甲方的规章制度规定执行。

甲方（盖章）　　乙方（签章）：[illegible]

法定代表或委托代理人（签章）　　签订时间：2022年7月21日

签证机关（盖章）　鉴证人：（签章）　鉴证时间：　年　月　日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁监制

表单验证号码e1ee8cb4006f484ca6e76bd9c246904a

河南省社会保险个人参保证明

（ 2024 年）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	41052219921006281X		
社会保障号码	41052219921006281X	姓　名	陈鹏	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202301	202303
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201704	201811
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202203	202301
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201405	201411
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202304	-
河南泰捷建设有限公司	工伤保险	202203	-
河南泰捷建设有限公司	失业保险	202203	202301
安阳市宇捷市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202001	202203
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	202001	202203
安阳市宇捷市政工程有限公司	工伤保险	201603	201611
安阳市宇捷市政工程有限公司	失业保险	201903	202203
河南泰捷建设有限公司	企业职工基本养老保险	202304	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-01-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2014-05-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	△	3579	△	3579	-
12				-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及完本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已缴实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

表单验证号码e1ee8cb4006f484ca6e76bd9c246904a

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

社会保险
业务查询专用章

打印时间：2024-11-07

表单验证号码c939cdbd7cbb4d61ba927e75a49fd9a3

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410522365626　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	河南泰捷建设有限公司					
姓名	陈鹏	个人编号	41052290040862	证件号码	410522199210062811X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-10-06	
参加工作时间	2014-05-01	参保缴费时间	2020-01-01	建立个人账户时间	2020-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202002-202312	0.00	0.00	12043.92	1257.51	13301.43	47	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	14907.12	1257.51	16164.63	57	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费总额	0.00	个人欠费总额	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	3020	3197
2022年	2023年								
3409	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020		▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-08

社会保险 业务查询专用章

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

供应商获信用等级情况


格兰德
saas.x315.com
企业信用等级证书
河南寄景建筑工程有限公司
统一社会信用代码: 91411628MA9FHH7J6D
根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：
AAA 级
证书编号：XY308421268638000
有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24
查验网址：saas.x315.com/certification
（信用视界｜认证服务平台）
扫描二维码
核验证书有效性
信用就是资本
国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年
企业征信备案机构
中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
认证专用
企业信用评价报告
--河南寄景建筑工程有限公司
格兰德
为守信者见证
CREDIT EVALUATION
格兰德信用管理咨询有限公司
GladTrust Management Co.,LTD
格兰德
saas.x315.com
企业信用认证证书
河南寄景建筑工程有限公司
统一社会信用代码: 91411628MA9FHH7J6D
根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：
AAA级诚信供应商
证书编号：XY308471268638000
有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24
查验网址：saas.x315.com/certification
（信用视界｜认证服务平台）
扫描二维码
核验证书有效性
信用就是资本
国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年
企业征信备案机构
中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
认证专用
格兰德
saas.x315.com
企业信用认证证书
河南寄景建筑工程有限公司
统一社会信用代码: 91411628MA9FHH7J6D
经审核，贵单位积极参与企业信用体系建设和实施，规范合同管理，完善企业信用管理制度，评定为：
AAA级重合同守信用企业
证书编号：XY308441268638000
有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24
查验网址：saas.x315.com/certification
（信用视界｜认证服务平台）
扫描二维码
核验证书有效性
信用就是资本
国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年
企业征信备案机构
中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
认证专用

格兰德
saas.x315.com

企业资信等级证书

河南寄景建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

AAA 级

证书编号：XY308461268638000

有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24

查验网址：saas.x315.com/certification

（信用视界 | 认证服务平台）

扫描二维码
核验证书有效性

格兰德信用管理咨询有限公司 认证专用

信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构
中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

格兰德
saas.x315.com

企业信用认证证书

河南寄景建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

李文奇 诚信企业家

证书编号：XY308401268638000

有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24

查验网址：saas.x315.com/certification

（信用视界 | 认证服务平台）

扫描二维码
核验证书有效性

格兰德信用管理咨询有限公司 认证专用

信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构
中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

格兰德
saas.x315.com

企业信用认证证书

河南寄景建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

AAA级质量服务诚信单位

证书编号：XY308491268638000

有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24

查验网址：saas.x315.com/certification

（信用视界 | 认证服务平台）

扫描二维码
核验证书有效性

格兰德信用管理咨询有限公司 认证专用

信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构
中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

格兰德
saas.x315.com

企业信用认证证书

河南寄景建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411628MA9FHH7J6D

根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

AAA级诚信经营示范单位

证书编号：XY308481268638000

有效期限：2022-03-25 至 2025-03-24

查验网址：saas.x315.com/certification

（信用视界 | 认证服务平台）

扫描二维码
核验证书有效性

格兰德信用管理咨询有限公司 认证专用

信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构
全面信用风险管理体系服务商
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构
中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

投标人承接过类似工程情况

业绩 01

项目名称	龙安区田村街道办事处郜家庄村内新建道路
项目所在地	安阳市龙安区郜家庄村
发包人名称	安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村村民委员会
发包人地址	安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村村民委员会
发包人联系人电话	武先生、13783826567
合同价格	299000.00元
开工日期	2023.11.01
竣工日期	2023.11.30
承担的工作	工程量清单内的全部内容
工程质量	达到国家现行工程质量验评合格标准
项目经理	陈吉
技术负责人	杨荣
项目描述	路床(槽)整形2500平方、水泥混凝土2250平方
备注	/

中标通知书

河南泰捷建设有限公司：

我们荣幸的通知，贵方在 龙安区田村街道办事处郜家庄村内新建道路（采购编号：SX202309-009）采购中，您单位以人民币 贰拾玖万玖仟整（￥299000.00元）中标。

请根据本通知书、谈判文件、响应文件等，于发出本通知书之日起七日内与安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村村民委员会订合同等事宜。

采购人：安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村村民委员会

采购代理机构：河南晟祥招标代理服务有限公司

2023年9月19日

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村民委员会

承包人（全称）：河南泰捷建设有限公司龙安分公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙安区田村街道办事处郜家庄村内新建道路及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：龙安区田村街道办事处郜家庄村内新建道路。

2. 工程地点：安阳市龙安区郜家庄村。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：工程量清单范围内。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图及工程量清单项目全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 01 日。

计划竣工日期：2023 年 12 月 30 日。

工期总日历天数：签订合同之日起30日内完工 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到 达到国家现行工程质量验评合格标准 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰拾玖万玖仟元整（¥ 299000.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

2.合同价格形式：____固定单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____陈吉_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 9 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 安阳市龙安区田村街道办事处郜家庄村民委员会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签订后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
组织机构代码：_____	组织机构代码：91410506MA9M6EJD1E
地　址：_____	地址：河南省安阳市龙安区马投涧乡宝鹤路 58 号 105 室
邮政编码：_____	邮政编码：455000
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司安阳万达广场支行
账　号：	账　号：41050160284700000688

田村街道办事处郜家庄村内新建道路

申请验收单位：河南泰捷建设有限公司

施工单位	河南泰捷建设有限公司		
建设地点及内容	地点：田村街道办事处郜家庄村，主要建设内容：路床（槽）整形2500平方、水泥混凝土2250平方		
批准文号		监理单位	河南联达工程管理有限公司
工程竣工验收日期	2023年12月25日	项目复验日期	2024年1月19日
验收组复验意见	合格		
管护单位意见	合格		

验收组成员	单位名称	职称（职务）	签名
	田村办事处		
	河南联达工程管理有限公司		
	河南泰捷建设有限公司		

郜家庄村委会

袁秋生

李奇文印

业绩02

序号	02
项目名称	龙安区李许线养护工程
项目所在地	安阳市龙安区
发包人名称	安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会
发包人地址	安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会
发包人联系人及电话	王先生：139 3720 0103
合同价格	1398600.00元
开工日期	2024.5.15
竣工日期	2024.5.27
承担的工作	工程量清单及招标文件范围内的所有内容
工程质量	合格
项目经理	郭俊鹏
技术负责人	杨荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	进行路面病害修复，对原路面病害严重路段，挖除20cm厚水泥混凝土面板，重新铺筑20cm水泥稳定碎石。对原路面喷洒透层油，铺筑5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)
备注	/

中标通知书

河南泰捷建设有限公司：

我们荣幸的通知，贵方于2024年5月10日所提交的龙安区李许线养护工程（采购编号：SX2024-4-5）采购中，您单位以人民币壹佰叁拾玖万捌仟陆佰元整（¥1398600.00元）中标。

请根据本通知书、磋商文件、响应文件等，于发出本通知书之日起七日内与安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会签订合同等事宜。

采购人：安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会

采购代理机构：河南晟祥招标代理服务有限公司

2024年5月10日

合同协议书

安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会 为实施 龙安区李许线养护工程 已接受 河南泰捷建设有限公司 对该项目建设的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）目标承诺书；

（11）投标文件中的施工组织设计；

（12）拟投入关键人员承诺书；

（13）拟投入关键设备承诺书；

（14）廉政合同、安全生产合同等其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写元）壹佰叁拾玖万捌仟陆佰元整（¥ 1398600.000 元）。

4. 承包人项目经理：郭俊鹏 。

5. 工程质量符合国家现行施工及质量验收合格标准。

6. 付款方式：**按月进度付款，支付已完合格工程量的 80%，竣工验收合格后支付至合同价的 95%，结算评审后支付至评审价的 97%，3%质保金质保期满无质量问题一次付清**。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天。

9. 本协议书正本肆份，副本 肆 份，合同双方各执正本贰份，副本 贰 份。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

2024 年 5 月 14 日　　2024 年 5 月 14 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，龙安区李许线养护工程 项目法人 安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会 与该项目的施工单位 河南泰捷建设有限公司 ，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 龙安区李许线养护工程 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 龙安区李许线养护工程 （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本协议书正本肆份、副本 肆 份，合同双方各执正本贰份，副本 贰 份

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

2024年 5月 14日　　2024年 5月 14日

安全生产合同

为在 龙安区李许线养护工程 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会与承包人 河南泰捷建设有限公司 特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技

术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本肆份、副本_肆_份，合同双方各执正本贰份，副本_贰_份

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

2024年5月14日　　2024年5月14日

河南泰捷建设有限公司工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

一、开工前与农民工签定劳动合同。

二、按时支付农民工工资、加班加点工资。

三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准___/___元

四、不无故拖欠、克扣农民工工资。

五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，我在一个星期内补足保障金。

承诺人：

法定代表人：李文奇

2024年5月14日

公路工程施工扬尘污染防治目标责任书

为有效防治公路工程施工扬尘污染，保护和改善大气质量，促进扬尘防治标准化管理，确保 龙安区李许线养护工程 ） 工地扬尘污染防治措施达到各项标准要求。现 安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会 （以下简称“发包人 河南泰捷建设有限公司 签订以下责任书：

一、目标：

认真执行《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）等有关要求，采取切实措施有效控制公路工程施工扬尘污染。

二、责任：

（一）、发包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。负责传达省、市政府及有关部门对公路工程施工扬尘治理有关文件、规定、部署和通知要求，组织有关督促、协调工作。

2、发包人承担工程施工扬尘防治工作的监管责任。负责施工工地扬尘污染防治的检查、督导工作，对承包人在施工期间达不到有关扬尘污染防治标准及要求的，应采取相应措施及处罚手段。

3、定期召开施工工地扬尘污染防治会议，及时传达有关扬尘污染防治精神。

（二）、承包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。承包人要严格按照《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）标准要求对公路工程施工现场进行管理和控制，工程现场控制施工扬尘达到标准要求。

2、承包人应认真贯彻落实河南省及安阳市委、市政府及有关部门对建设工程施工扬尘控制的有关规定、文件、部署和通知要求，把控制扬尘污染工作纳入重要工作，统筹安排，建立标准化施工场地，积极开展“绿色环保工地”创建活动。

3、承包人承担施工工地扬尘防治主体责任，应认真落实有关公路工程施工扬尘防治的责任。在工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订控制扬尘污染责任书。

4、工程施工扬尘防治必须方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实和监控到位。

5、施工现场主要区域必须做到周边全部围挡、土方和散碎物料全部覆盖或绿化、出场

车辆全部冲洗干净，主要场区及道路全部硬化，散碎物料全部密闭运输，拆除工程和土方工程全部湿法作业。

6、承包人应建立扬尘污染防治检查制度，设专人组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，填写相关检查记录。建立考核制度，定期考核。

7、承包人应加强扬尘污染防治教育培训，定期或及时召开扬尘污染防治会议，学习有关法律法规、标准及规范，传达落实有关文件精神及要求。

8、承包人应做好扬尘防治工作记录，建立完善的扬尘防治管理台账，收集、保存完整的扬尘防治档案资料。

9、当启动重污染天气应急预警时，严格按照上级重污染天气应急管控要求，落实各项扬尘控制和应急措施。

10、承包人应当使用符合环保要求的非道路移动机械。

三、责任书作为合同协议书附件，发包人和承包人各执贰份。

发包人：（盖单位章）　　承包人：（盖单位章）

法定代表人或　　法定代表人或

其委托代理人：王秋顺（签字）　　其委托代理人：李奇（签字）

2024年 5月 14日　　2024年 5月 14日

龙安区李许线养护工程

交（竣）工验收证书

工程地点：安阳市龙安区李许线

建设单位：安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会

验收日期：2024年6月03日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

公路工程竣工验收报告

工程名称	龙安区李许线养护工程	工程地点	龙安区李许线
建设规模	3097.59m	结构类型	沥青混凝土
建设单位	安阳市龙安区龙泉镇高北河村村民委员会	开工日期	2024 年 05 月 15 日
勘察单位		竣工日期	2024 年 05 月 27 日
设计单位	中图设计有限公司	工期	13 日
承包单位	河南泰捷建设有限公司	合同造价	1398600 元
监理单位	河南省仁哲工程管理有限公司	施工造价	元

验收范围及数量：

1、挖除混凝土旧路面：68.3m³；
2、5%水泥稳定碎石：341.69 ㎡；
3、透层油：16113.75 ㎡；
4、AC-13C 沥青混凝土：16113.75 ㎡。

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

112

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

对工程评定：

符合设计及规范要求，工程合格

2024年 6 月 3 日

参加交（竣）工验收人员及单位			
建设单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2024年 6月3日	监督单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2024年06 月03日
设计单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2024 年 6 月 3 日	监理单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2024年 6月3日
施工单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2024年 6 月 3 日		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

参加交（竣）工验收人员签到表

单位名称	姓名	单位	电话	备注
建设单位	郭福林		13598108844	
监督单位				
设计单位	张智玲	中国设计		
监理单位	谢新伟	湖南仁建	18711949142	
施工单位			13346636361	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

业绩03

序号	03
项目名称	安阳市北关区国省道农村平交路口整治提升工程
项目所在地	安阳市北关区
发包人名称	安阳市北关区交通运输局
发包人地址	安阳市北关区交通运输局
发包人联系人及电话	王经、13937209667
合同价格	291000.00元
开工日期	2024.3.27
竣工日期	2024.4.24
承担的工作	工程量清单及招标文件范围内的所有内容
工程质量	合格
项目经理	郭俊鹏
技术负责人	杨荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	悬臂式交通标志(3个警告牌+1个爆闪灯，立柱、横臂、面板、钢筋混凝土基础等)33套，路口警示桩60个，橡胶减速带1035米
备注	/

安阳市北关区国省道农村平交路口整治提升工程中标通知书

河南泰捷建设有限公司：

我们荣幸的通知，贵方在采购编号为GCZB-2024-03-01**安阳市北关区国省道农村平交路口整治提升工程**项目中，您单位以人民币贰拾玖万壹仟元整（￥291000.00元）中标。

请根据本通知书、磋商文件、响应文件等，于发出本通知书之日起三日内与安阳市北关区交通运输局签订合同等事宜。

政府采购合同融资：根据豫财购[2017]10号和安财购[2017]7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同 融资，详情请登陆安阳市政府采购网（http://anyang.hngp.gov.cn/anyang/），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

采　购　人：安阳市北关区交通运输局

采购代理机构：河南晟祥招标代理服务有限公司

2024年3月25日

合同协议书

发包人（全称）： 北关区交通运输局

承包人（全称）： 河南泰捷建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北关区国省道农村平交路口整治提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北关区国省道农村平交路口整治提升工程

2. 工程地点：安阳市北关区

3. 工程内容：悬臂式交通标志（3个警告牌+1个爆闪灯，立柱、横臂、面板、钢筋混凝土基础等）33套，路口警示桩60个，橡胶减速带1035米。

二、合同工期

计划开工日期：2024年3月27日。

计划竣工日期：2024年5月16日。

工期总日历天数：50天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

如遇下列情况，经发包代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

（2）在施工中因停水、停电连续影响 8 小时以上者。

（3）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰拾玖万壹仟元整（￥291000.00 元）；合同形式，固定总价合同。

2、质量保证金：本工程以评审结果为准对工程进行结算，全部工程验收后付至评审后的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。质量期满无质量问题后付清（不计息）质保期一年。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包人在施工过程中必须严格落实《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准（试行）》的要求，做到“六个百分之百”。未按照工地施工扬尘污染防治标准执行所造成的一切后果有承包人负责，发包人概不负责。承包人必须强化现场施工监管，确保施工安全，在施工过程中造成的安全事故，一切后果有承包人负责，发包人概不负责。

七 违约责任

1. 承包方的责任

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的 1 %偿付逾期违约金。

（2）工程交付时间不符合规定，按合同总价的 1 %偿付逾期违约金。

2. 发包方的责任

（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

（3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

八、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 26 日签订。

九、签订地点

本合同在 北关区交通运输局 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 签字及盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　址：北关区红旗路 158 号
邮政编码：455000
电　话：0372-2263655
开户银行：建行永安支行
账　号：41001505210050211039
账户名称：安阳市北关区财政局财政专户

地　址：
邮政编码：
电　话：
开户银行：
账　号：
账户名称：

竣工验收报告

建设单位名称：北关区交通运输局

工程项目名称：北关区省道农村平交路口整治提升工程

竣工验收时间：2024 年 4 月

建设工程竣工验收报告

工程项目名称	北关区国省道农村平交路口整治提升工程		
施工单位名称	河南泰捷建设有限公司		
组织验收部门	北关区交通运输局		
参加验收部门	交通运输局、监理单位、施工单位		
工程开工时间	2024 年 3 月 27 日	工程竣工时间	2024 年 4 月 24 日
工程造价	291000.00 元		
工程概况	悬臂式交通标志（3 个警告牌+1 个爆闪灯，立柱、横臂、面板、钢筋混凝土基础等）33 套，铝合警示桩 60 个，橡胶减速带 1035 米。		
竣工验收内容	工程量、质量		
竣工验收结论： 经实地测量工程量与合同和投标文件相符，质量合格，该工程为合格工程			

注：结论为是否符合相关标准；能否同意使用。

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

工程名称：北关区国省道农村平交路口整治提升工程

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

北关区国省道农村平交路口整治提升工程

竣工验收小组名单

	姓名	职务或职称	所在单位	备注
组长				
成员				
	王旭		公路建设中心	
	赵刚			
		工程师		
			奉捷公司	







业绩 04

项目名称	安阳市龙安区X005西王线《龙泉至梨树厂段)提升改造工程
项目所在地	安阳市龙安区
发包人名称	安阳市龙安区交通运输局
发包人地址	安阳市龙安区交通运输局
发包人联系人电话	李红旗 13513724800
合同价格	5656161.00元
开工日期	2022.7.18
竣工日期	2022.8.17
承担的工作	沥青混凝土路面
工程质量	合格
项目经理	李会杰
技术负责人	
项目描述	1、挖除旧水泥混凝土路面3363.595m3,挖除旧沥青混凝土路面74.008m3,挖除稳定土基层3256.52m3,挖土方5833.596m3,软基处理砂砾垫层2102.4m3。 2、18cm厚10%石灰稳定土垫层,16387.25m,18cm厚4%水泥稳定碎石下基层15787.25m3,18cm厚4.5%水泥稳定碎石上基层16288.35m2,粘层16288.35m2,粘层16152.25m2,4cm厚细粒式沥青混凝土下面层(AC-13C)16288.35m2,3cm厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)15787.25m2,封层15787.25m2,18cm厚C30混凝土路面312.2m2,路肩培土2009m2,混凝土预制块路缘石145.44m’。 3、DN75给水管480m,DN25给水管572.5m,镀锌钢管27m。 4、B级波形钢板护栏46.5m,圆形D=60单柱式铝合金标志牌2个,三角形L=70单柱式铝合金标志牌12个,里程碑2块,百米桩18个,路口警示桩36个,沥青路面热熔标线883.4m2,减速带46m。
备注	/

中 标 通 知 书

河南睿景建筑工程有限公司 ：

项目名称：安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段）提升改造工程，招标编号：GBGL2022SG002，招标方式：公开招标，该项目评标工作于2022年6月28日已经结束，经评标委员会评定，媒体公示评审结果公示并报主管部门备案，确定贵单位为本项目中标人。

中标价格（人民币）：5656161.00元

大写：伍佰陆拾伍万陆仟壹佰陆拾壹元

工期：30 日历天

拟任项目经理：李会杰　证书编号：一级建造师（公路工程）豫 1412020202101102

工程质量：　交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

安全目标：　施工期间无安全生产事故

请贵单位在收到本通知书后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

招标人：（盖章）　　经 办 人：（签字或盖章）李红强

2022年7月7日

招标代理：（盖章）　　经 办 人：（签字或盖章）

2022年7月7日

合同协议书

安阳市龙安区交通运输局为实施 安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段）工程已接受 河南寄景建筑工程有限公司 对该项目建设的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）目标承诺书；

（11）投标文件中的施工组织设计；

（12）拟投入关键人员承诺书；

（13）拟投入关键设备承诺书；

（14）廉政合同、安全生产合同等其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写元）伍佰陆拾伍万陆仟壹佰陆拾壹元整（¥ 5656161.00元）。

4. 承包人项目经理： 李会杰 。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 付款方式:三年内付清。财政结算评审后支付至评审价的97%，3%质保金质保期满无质量问题一次付清。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天。

9. 本协议书正本2份、副本 2 份，合同双方各执正本一份，副本 1 份。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　2022年7月18日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段）工程项目法人安阳市龙安区交通运输局与该项目的施工单位 河南寄景建筑工程有限公司，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 安阳市龙安区 X005 西王线（龙泉至梨树厂段） （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段） （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式肆份，由发包人和承包人各执贰份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　2022年7月18日

安全生产合同

为在 安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段） 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 安阳市龙安区交通运输局 与承包人 河南奇景建筑工程有限公司 特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技

奇李印文

术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式肆份，副本 二 份，合同双方各执正本贰份，副本 一 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2022年7月18日

河南寄景建筑工程有限公司 项目经理委任书

致：安阳市龙安区交通运输局

河南寄景建筑工程有限公司 法定代表人 李文奇 （职务、姓名） 代表本单位委任 项目经理、李会杰、（职务、姓名） 为 安阳市龙安区 X005 西王线（龙泉至梨树厂段） 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 李会杰（姓名） 代表本单位全面负责。

承 包 人：河南寄景建筑工程有限公司

法定代表人：

（职务）：项目经理

（姓名）：李会杰

2022年 7月 18日

河南寄景建筑工程有限公司工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

一、开工前与农民工签定劳动合同。

二、按时支付农民工工资、加班加点工资。

三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准_____元

四、不无故拖欠、克扣农民工工资。

五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，并在一个星期内补足保障金。

承诺人：

法定代表人：李奇

2022年 7月 18日

公路工程施工扬尘污染防治目标责任书

为有效防治公路工程施工扬尘污染，保护和改善大气质量，促进扬尘防治标准化管理，确保 安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段） 工地扬尘污染防治措施达到各项标准要求。现安阳市龙安区交通运输局（以下简称“发包人 河南寄景建筑工程有限公司 签订以下责任书：

一、目标：

认真执行《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）等有关要求，采取切实措施有效控制公路工程施工扬尘污染。

二、责任：

（一）、发包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。负责传达省、市政府及有关部门对公路工程施工扬尘治理有关文件、规定、部署和通知要求，组织有关督促、协调工作。

2、发包人承担工程施工扬尘防治工作的监管责任。负责施工工地扬尘污染防治的检查、督导工作，对承包人在施工期间达不到有关扬尘污染防治标准及要求的，应采取相应措施及处罚手段。

3、定期召开施工工地扬尘污染防治会议，及时传达有关扬尘污染防治精神。

（二）、承包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。承包人要严格按照《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）标准要求对公路工程施工现场进行管理和控制，工程现场控制施工扬尘达到标准要求。

2、承包人应认真贯彻落实河南省及安阳市委、市政府及有关部门对建设工程施工扬尘控制的有关规定、文件、部署和通知要求，把控制扬尘污染工作纳入重要工作，统筹安排，建立标准化施工场地，积极开展“绿色环保工地”创建活动。

3、承包人承担施工工地扬尘防治主体责任，应认真落实有关公路工程施工扬尘防治的责任。在工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订控制扬尘污染责任书。

4、工程施工扬尘防治必须方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实和监控到位。

5、施工现场主要区域必须做到周边全部围挡，土方和散碎物料全部覆盖或绿化、出场

车辆全部冲洗干净，主要场区及道路全部硬化，散碎物料全部密闭运输，拆除工程和土方工程全部湿法作业。

6、承包人应建立扬尘污染防治检查制度，设专人组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，填写相关检查记录。建立考核制度，定期考核。

7、承包人应加强扬尘污染防治教育培训，定期或及时召开扬尘污染防治会议，学习有关法律法规、标准及规范，传达落实有关文件精神及要求。

8、承包人应做好扬尘防治工作记录，建立完善的扬尘防治管理台账，收集、保存完整的扬尘防治档案资料。

9、当启动重污染天气应急预警时，严格按照上级重污染天气应急管控要求，落实各项扬尘控制和应急措施。

10、承包人应当使用符合环保要求的非道路移动机械。

三、责任书作为合同协议书附件，发包人和承包人各执贰份。

发包人：（盖单位章）　　承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年　月　日　　2022年7月18日

安阳市龙安区 **X005** 西王线（龙泉至梨树厂段）提升改造工程

交 工 验 收 证 书

工程地点： 龙安区

建设单位： 安阳市龙安区交通运输局

验收日期： 2022 年 8 月 26 日

基础设施工程交工报告

工程名称	安阳市龙安区X005西王线（龙泉至梨树厂段）提升改造工程	工程地点	龙安区龙泉镇
建设规模	改建工程	结构形式	改建工程
建设单位	安阳市龙安区交通运输局	开工日期	2022 年 7 月
勘察单位		竣工日期	一月
设计单位	河南永皓工程设计有限公司	竣工日期	2022 年 8 月
承包单位	河南泰捷建设有限公司	合同造价	565.6161 万元
监理单位	河南路星工程管理有限公司	施工造价	615.5775 万元

验收范围及数量：

1、挖除旧水泥混凝土路面 3363.595m3，挖除旧沥青混凝土路面 74.008m3，挖除稳定土基层 3256.52m3，挖土方 5833.596m3，软基处理砂砾垫层 2102.4m3。

2、18cm 厚 10%石灰稳定土垫层，16387.25 ㎡，18cm 厚 4%水泥稳定碎石下基层 15787.25m3，18cm 厚 4.5%水泥稳定碎石上基层 16288.35m2，粘层 16288.35m2，粘层 16152.25m2，4cm 厚细粒式沥青混凝土下面层(AC-13C)16288.35m2，3cm 厚细粒式沥青混凝土上面层(AC-10C)15787.25m2，封层 15787.25m2，18cm 厚 C30 混凝土路面 312.2m2，路肩培土 2000m2，混凝土预制块路缘石 145.44m³。

3、DN75 给水管 480m，DN25 给水管 572.5m，镀锌钢管 27m。

4、B 级波形钢板护栏 435m，圆形 D=60 单柱式铝合金标志牌 2 个，三角形 L=70 单柱式铝合金标志牌 12 个，里程碑 2 块，百米桩 18 个，路口警示桩 36 个，沥青路面热熔标线 839.4m2，减速带 46m。

基础设施工程交工报告

对工程评定：

经现场检验，符合国家相关规范及设计要求，达到合格标准，验收组一致认定龙安区 X005 西王线龙泉至梨树厂段提升改造工程为合格工程。

年　月　日

参加竣工验收人员及单位

监督单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日	建设单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日
设计单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日	施工单位	参加验收人员（签名） （盖章） 2022 年 8 月 26 日
监理单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日		

参加竣工验收人员签到表

单位名称	姓名	职务	电话	备注
监督单位				
建设单位				
	范小楠			
设计单位				
施工单位				
监理单位				







准予变更登记通知书

(安县市监)登记内变字[2022]第115号

河南睿景建筑工程有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 河南睿景建筑工程有限公司，变更后名称 河南泰捷建设有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记，我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

安县市场监督管理局

2022年7月20日

企业注册登记专用章

业绩05

序号	05
项目名称	安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程
项目所在地	安阳市龙安区马投涧镇高白塔村
发包人名称	安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会
发包人地址	安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会
发包人联系人及电话	高先生、13598140069
合同价格	1596000.00元
开工日期	2023.11.11
竣工日期	2023.11.26
承担的工作	工程量清单及招标文件范围内的所有内容
工程质量	合格
项目经理	郭俊鹏
技术负责人	杨荣
总监理工程师及电话	/
项目描述	道路工程: 1、病害路面治理(热沥青灌缝、铺抗裂贴)，拆除损坏严重旧水泥混凝土路面，新建 20cm厚 C30混凝土路面，新旧路面交接处、沉降缝处铺土工织物2、凿毛原混凝土路面，喷洒乳化沥青透层油(1Kg/m2)，摊铺 6cm 厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)，摊铺5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)。3、灰土路肩填土,素土路肩填土。
备注	/

中标通知书

河南泰捷建设有限公司：

我们荣幸的通知，贵方在 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 （采购编号：SX-202309-009）采购中，您单位以人民币 壹佰伍拾玖万陆仟元整 （￥1596000.00元）中标。

请根据本通知书、磋商文件、响应文件等，于发出本通知书之日起七日内与 安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会 签订合同等事宜。

采购人：安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会

采购代理机构：河南晟祥招标代理服务有限公司

2023年11月07日

合同协议书

安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会 为实施 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 已接受 河南泰捷建设有限公司 对该项目建设的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）目标承诺书；

（11）投标文件中的施工组织设计；

（12）拟投入关键人员承诺书；

（13）拟投入关键设备承诺书；

（14）廉政合同、安全生产合同等其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写元）壹佰伍拾玖万陆仟元整（¥ 1596000.00元）。

4. 承包人项目经理： 郭俊鹏 。

5. 工程质量符合国家现行施工及质量验收合格标准。

6. 付款方式：**按月进度付款，支付已完合格工程量的80%，竣工验收合格后支付至合同价的95%，结算评审后支付至评审价的97%，3%质保金质保期满无质量问题一次付清**。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

9. 本协议书正本肆份、副本 肆 份，合同双方各执正本贰份，副本 贰 份。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2023年11月9日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 项目法人 安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会 与该项目的施工单位 河南泰捷建设有限公司 ，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至二年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本协议书正本肆份、副本 肆 份，合同双方各执正本 贰 份，副本 贰 份

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　2023年11月9日

安全生产合同

为在 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会与承包人 河南泰捷建设有限公司 特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技

术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本肆份、副本 肆 份，合同双方各执正本贰份，副本 贰 份

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日　　2023年11月9日

李奇文印

河南泰捷建设有限公司工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

一、开工前与农民工签定劳动合同。

二、按时支付农民工工资、加班加点工资。

三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准__/__元

四、不无故拖欠、克扣农民工工资。

五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保证金中支付，且在一个星期内补足保障金。

承诺人：

法定代表人：

2023年11月9日

公路工程施工扬尘污染防治目标责任书

为有效防治公路工程施工扬尘污染，保护和改善大气质量，促进扬尘防治标准化管理，确保 安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程 ）工地扬尘污染防治措施达到各项标准要求。现 安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会 （以下简称“发包人 河南泰捷建设有限公司 签订以下责任书：

一、目标：

认真执行《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）等有关要求，采取切实措施有效控制公路工程施工扬尘污染。

二、责任：

（一）、发包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。负责传达省、市政府及有关部门对公路工程施工扬尘治理有关文件、规定、部署和通知要求，组织有关督促、协调工作。

2、发包人承担工程施工扬尘防治工作的监管责任，负责施工工地扬尘污染防治的检查、督导工作，对承包人在施工期间达不到有关扬尘污染防治标准及要求的，应采取相应措施及处罚手段。

3、定期召开施工工地扬尘污染防治会议，及时传达有关扬尘污染防治精神。

（二）、承包人责任：

1、严格遵守国家、行业及河南省有关环境污染防治有关法律法规。承包人要严格按照《公路水运工程施工扬尘污染防治要求》（DB41/T1582-2018）标准要求对公路工程施工现场进行管理和控制，工程现场控制施工扬尘达到标准要求。

2、承包人应认真贯彻落实河南省及安阳市委、市政府及有关部门对建设工程施工扬尘控制的有关规定、文件、部署和通知要求，把控制扬尘污染工作纳入重要工作，统筹安排，建立标准化施工场地，积极开展“绿色环保工地”创建活动。

3、承包人承担施工工地扬尘防治主体责任，应认真落实有关公路工程施工扬尘防治的责任。在工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订控制扬尘污染责任书。

4、工程施工扬尘防治必须方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实和监控到位。

5、施工现场主要区域必须做到周边全部围挡，土方和散碎物料全部覆盖或绿化、出场

河南泰捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

车辆全部冲洗干净，主要场区及道路全部硬化，散碎物料全部密闭运输，拆除工程和土方工程全部湿法作业。

6、承包人应建立扬尘污染防治检查制度，设专人组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，填写相关检查记录。建立考核制度，定期考核。

7、承包人应加强扬尘污染防治教育培训，定期或及时召开扬尘污染防治会议，学习有关法律法规、标准及规范，传达落实有关文件精神及要求。

8、承包人应做好扬尘防治工作记录，建立完善的扬尘防治管理台账，收集、保存完整的扬尘防治档案资料。

9、当启动重污染天气应急预警时，严格按照重级重污染天气应急管控要求，落实各项扬尘控制和应急措施。

10、承包人应当使用符合环保要求的非道路移动机械。

三、责任书作为合同协议书附件，发包人和承包人各执贰份。

发包人：（盖单位章）　　承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年　月　日　　2023年11月9日

李奇文印

合同补充协议书

甲方　安阳市龙安区马投涧镇高白塔村民委员会

乙方　河南泰捷建设有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明外，否则其定义与双方 2023 年 11 月 9 日，签订的《 合同协议书》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：

甲乙双方经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同部分内容，特订以下补充协议。

协议内容变更部分为：第 3 条签约款 1596000 元，变更为 1400000 元（其中 1250000 元由上级财政补助，其余部分由村内自筹），如有修路捐款，都用于原合同签约款直至 1596000 元。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分。与原合同具有同等法律效力。

本协议中明确所作修改的条款外，原合同的其他部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

高白塔村法人代表或其委托代理人：　　河南泰捷建设有限公司或其委托代理人：

年　月　日　　年　月　日

安阳市龙安区马投涧镇 X003 高白塔段修复养护工程

交 工 验 收 证 书

工程地点：龙安区马投涧镇

建设单位：安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会

验收日期：2023 年 12 月 12 日

基础设施工程交工报告

工程名称	安阳市龙安区马投涧镇X003高白塔段修复养护工程	工程地点	龙安区马投涧镇
建设规模	改建工程	结构形式	改建工程
建设单位	安阳市龙安区马投涧镇高白塔村村民委员会	开工日期	2023 年 11 月 11 日
勘察单位	/	计划工期	60 日历天
设计单位	中图设计有限公司	设计交工日期	2023 年 11 月 26 日
承包单位	河南泰捷建设有限公司	合同造价	159.6 万元
监理单位	河南省仁哲工程管理有限公司	施工造价	

验收范围及数量：

道路工程：

1、病害路面治理（热沥青灌缝、铺抗裂贴），拆除损坏严重旧水泥混凝土路面，新建 20cm 厚 C30 混凝土路面，新旧路面交接处、沉降缝处铺土工织物。

2、凿毛原混凝土路面，喷洒乳化沥青透层油（1Kg/m2），摊铺 6cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-16C），摊铺 5cm 厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）。

3、灰土路肩填土，素土路肩填土。

路面工程交工报告

对工程评定：

经六大责任主体联合验收，本工程完成合同约定内容，主体结构和使用功能满足设计文件要求，技术资料齐全，工程质量符合相关设计、规范及工程强制性标准要求，质量评定合格。

年　月　日

参加竣工验收人员及单位

建设单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日	监理单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日
设计单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日	监理单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日
监督单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日	监管单位	参加验收人员（签名） （盖章） 年　月　日

参加竣工验收人员签到表

单位名称	姓名	职务	电话	备注
建设单位	[illegible]		13598140069	
监督单位	[illegible]			
	[illegible]			
监管单位	[illegible]			
	[illegible]			
	[illegible]			
设计单位				
监理单位	谢裕博	总监	18703124842	
施工单位	[illegible]		13346636361	
	郭俊鹏			

[illegible]建设有限公司 4105220037504

[illegible]建设有限公司 4105220037504

李奇文印

业绩06

项目名称	安阳市北关区唐庄村村道工程
项目所在地	安阳市北关区唐庄村
发包人名称	安阳市北关区民航路街道办事处
发包人地址	安阳市北关区民航路街道办事处
发包人联系人及电话	赵先生、18537200521
合同价格	233576元
开工日期	2022年8月
竣工日期	2022年9月
承担的工作	工程量清单范围内
工程质量	合格
项目经理	许艳娜
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	村道路沥青混凝土面层

恒之宇工程集团有限公司
成交通知书

河南寄景建筑工程有限公司：

你方于2022年7月13日所递交的安阳市北关区唐庄村村道工程的投标文件已被我方接受，被确定为安阳市北关区唐庄村村道工程的成交供应商。

成交金额（元）：大写：**贰拾叁万叁仟伍佰柒拾陆元整**

小写:**233576元**

招标内容：招标文件所有内容

请你方在接到本通知书后的 30 天内，与采购人**安阳市北关区民航路街道办事处**签订承包合同。

特此通知。

采购人：**安阳市北关区民航路街道办事处**(盖单位公章)

招标代理机构：**恒之宇工程集团有限公司**(盖单位公章)

2022年7月15日

建设工程施工合同



住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定





第一部分　合同协议书

发包人（全称）：　安阳市北关区民航路街道办事处

承包人（全称）：　河南寄景建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安阳市北关区唐庄村村道工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：安阳市北关区唐庄村村道工程。

2. 工程地点：　安阳市北关区　。

3. 资金来源：　　。

4. 工程内容：　工程量清单范围内　。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图及工程量清单项目全部内容　。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　　月　　日。

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：　　天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到　　合格　　标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）　贰拾叁万叁仟伍佰柒拾陆元整　(¥　233576　元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）　　/　　(¥　　/　　元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）　　/　　(¥　　/　　元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：许艳娜。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，甲方提供水电及部分材料。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在____安阳市北关区民航路街道办事处____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自__双方签订后__生效。

十三、合同份数

本合同一式_肆_份，均具有同等法律效力，发包人执_贰_份，承包人执_贰_份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：_____

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91411628MA9FHH7J6D

地址：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原镇政府院内010119号

邮政编码：455000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司安阳万达广场支行

账　号：41050160284700000579

竣工验收报告

建设单位名称：安阳市北关区民航路街道办事处

工程项目名称：安阳市北关区唐庄村村道工程

监理单位：河南省仁哲工程管理有限公司

施 工单位：河南寄景建筑工程有限公司

竣工验收时间：2022 年 9 月

建设工程竣工验收报告

工程项目名称	安阳市北关区唐庄村村道工程		
施工单位名称	河南寄景建筑工程有限公司		
组织验收部门	安阳市北关区民航路街道办事处		
参加验收部门	建设单位、监理单位、施工单位		
工程开工时间	2022.8.1	工程竣工时间	2022.8.30
工程造价	233576元		
工程概况	村道路沥青混凝土面层		
竣工验收内容	工程量、质量		

竣工验收结论：

经实地测量工程量与合同和投标文件相符，质量检测合格，该工程为合格工程。

河南寄景建设有限公司 4105220037504

李奇文印

工程名称：安阳市北关区唐庄村村道工程

施工单位： 施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 2022 年 9 月23 日
监理单位： 监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 2022 年 9 月23 日
建设单位： 建设单位代表或授权人（签字） 单位盖章 2022年 9月23 日

竣工验收名单

工程名称：安阳市北关区唐庄村村道工程

	姓名	职务或职称	所在单位	备注
组长	赵亮		安阳市北关区[illegible]办事处	
成员	[illegible]	负责人	河南[illegible]	
	张[illegible]	监理	河南仁哲	

河南奇捷建设有限公司 4105220037504

河南奇捷建设有限公司 4105220037504

李奇文印

准予变更登记通知书

(安县市监)登记内变字[2022]第115号

河南寄景建筑工程有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 河南寄景建筑工程有限公司，变更后名称 河南泰捷建设有限公司 ）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

安阳县市场监督管理局

2022年7月20日

企业注册登记专用章

河南泰捷建设有限公司

4105220037504

李奇文印

物料供给

TOPP

融资租赁合同

合同编号：RZ-Z-2019002

出租人：拓菩融资租赁（上海）有限公司

承租人：安阳市宇捷市政工程有限公司

TOPP

融资租赁合同

出租人：拓菩融资租赁（上海）有限公司

法定代表人或授权代表人：吴哲夫

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

联系人：刘志军

联系地址：中国上海市浦东新区民生路 1403 号信息大厦 306 室　邮编：200135

电话：021-68866930　传真：021-68866950

承租人：安阳市宇捷市政工程有限公司

法定代表人或授权代表人：李保平

注册地址：安阳市文峰区文明大道与光明路交叉口西北角

业务联系人：李文奇　财务联系人：魏晓敏

电话：13346636351　电话：18537272798

邮箱：446380508@qq.com　邮箱：2868414143@qq.com

联系地址：安阳市文峰区文明大道与光明路交叉口往西 50 米路北安阳市宇捷市政工程有限公司

连带保证人：李保平

身份证号或护照号：41052219670104281X

家庭住址：河南省安阳市文峰区朝阳花园小区 1 号楼 2 单元 302 室

手机号码：13569012822　邮箱：

连带保证人：李振

身份证号或护照号：410522198908052838

家庭住址：河南省安阳市北关区凯龙国际小区 3 号楼 902 室

手机号码：18567836999　邮箱：

连带保证人：李文鹏

身份证号或护照号：410522198901022839

家庭住址：安阳市北关区榕树湾小区东区 2 号楼 3 单元 6 楼西

手机号码：18537217770　邮箱：

TOPP

合同签订地点：中国 上海 市

合同签订日期：2019 年 1 月 4 日

鉴于，出租人同意根据承租人对租赁物以及供应商的选择购买租赁物并签署《买卖合同》，并将租赁物出租给承租人使用，承租人同意向出租人承租租赁物，并支付租金。承租人与出租人本着平等、自愿、诚信、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定，经友好协商同意按以下条款签署本《融资租赁合同》（“本合同”）：







（本页无正文，为拓菩融资租赁（上海）有限公司《融资租赁合同》合同编号：RZ-Z-2019002 签署页）

出租人（盖章）：拓菩融资租赁（上海）有限公司

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

承租人（盖章）：安阳市宇捷市政工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

连带保证人：李保平

连带保证人（签字）：

连带保证人：李振

连带保证人（签字）：

连带保证人：李文鹏

连带保证人（签字）：

TOPP

附表：

（1）租赁物
名称：环保型沥青拌合站设备　　型号：DGRE4000D　　数量：　一台套
（详见本合同所附之设备清单）
（2）供应商及制造商
供应商：　廊坊德基机械科技有限公司 制造商：廊坊德基机械科技有限公司
（3）租赁物设置场所
安阳市马投涧镇李葛涧村口东侧
（4）租赁期
①租赁期自起租日开始，共 36 个月； ②起租日为买卖合同（合同号：MM-201[illegible]002）中第二笔设备款的放款日期。
（5）交付预定・验收期限
【交付预定】【　2019　】年【　01　】月 【验收期限】租赁物按照约定直接向承租人交付后的____个工作日以内
（6）租赁首付款、租赁保证金及租赁手续费
①　承租人应不迟于起租日向出租人支付租赁首付款人民币 2,256,600.00 元（含增值税），租赁手续费人民币 270,792.00 元（含增值税），第一期租金 287,385.00 元，租赁保证金人民币 450,000.00 元及咨询服务费人民币 20,000.00 元。无论何种理由已支付的租赁手续费将不予退还。 ②　双方同意： 本合同租赁期届满前，若承租人发生违约行为，出租人有权以租赁保证金优先受偿。出租人按照自主酌定的顺序将租赁保证金冲抵包括迟延违约金等在内的本合同项下应付款项的，承租人应在出租人发出通知后 5 个工作日内补足用于冲抵的租赁保证金。
（7）租金・支付条件
①　租金：每期人民币 287,385.00 元（含增值税）； ②　租金期数：共 36 期，每期 1 个月； ③　支付方式： 第 1 期租金支付日，应不迟于本合同的起租日；第 2 期及之后各期租金的支付日为每期的【 15 】日 ④　付款方式：银行转账 ⑤　租金支付日为租金汇入出租人银行账户的日期。若遇银行非工作日，则应为前一个银行工作日； ⑥　各期租金支付日、应付租金金额等以出租人出具的《支付确认表》为准。 ⑦　出租人银行账户信息： 户名：拓荟融资租赁（上海）有限公司 开户行：中国光大银行上海静安支行　账号：3655 0188 0000 78719
（8）租赁物保险
按照本合同第 14 条（保险条款）约定，对租赁物保险事宜做如下选择： 由出租人进行投保。
（9）期末购买价格
除非另有约定，若承租人按照本合同第 15 条（期末处理条款）约定选择或被视为选择购买租赁物的，租赁物的期末购买价格为人民币 1,000.00 元（含增值税）。
（10）附属条款

TOPP

【通用条款】

第 1 条　租赁物

1. 租赁物在本合同附表（“附表”）中予以载明。

2. 租赁物和附表所载明的租赁物供应商及制造商均由承租人自主选定，未依赖出租人技能或受到出租人干预，出租人对租赁物的选定、品质、是否符合承租人用途或其他相关事项均不作任何承诺或保证。

第 2 条　购买

1. 承租人直接与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务和维护及相关交易条件，出租人完全按照承租人的选择和商定条件与供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物。

2. 由于出租人仅为本合同之租赁目的购买租赁物，因此出租人除享有租赁物完整所有权外，买卖合同项下与租赁物相关的一切争议解决及其后果均由承租人自行负责与供应商解决和承担，承租人应使出租人免于承担由此产生的任何责任和风险。

3. 若承租人为充分行使其对租赁物和供应商依据相关约定享有的索赔权，可申请出租人委托承租人按照本合同的约定，在经出租人同意后直接与供应商签署租赁物的买卖合同。但是该等买卖合同不得与本合同及委托购买合同内容、目的有任何矛盾和歧义，损害出租人权利或为出租人设定额外的任何责任和义务，否则，该等内容对出租人没有约束力，由承租人直接向供应商履行并承担相应责任。

4. 出租人直接或委托承租人与供应商签署的买卖合同，以下均称“买卖合同”。

第 3 条　交付

1. 供应商按照买卖合同直接向承租人交付符合买卖合同的约定的租赁物，承租人应提前做好接收租赁物的准备工作：

① 租赁物的规格、式样、质量、性能、机能、数量等被发现有瑕疵的，或供应商有其他违反买卖合同的行为，承租人应直接与供应商协商解决前述纠纷，并立即以书面形式通知出租人。

② 承租人未做好接收租赁物准备工作或拒收租赁物的，承租人应当赔偿由此给出租人带来的一切损失。

2. 承租人在供应商按照买卖合同的约定直接向其交付租赁物后即应妥善保管租赁物，并应在附表所载明的验收期限（“验收期限”）内自行对租赁物进行检验，并应在验收期限届满之前向出租人提交《租赁物验收证明书》，以此表明交付的租赁物已经由承租人验收完毕并符合承租人要求，承租人不得就租赁物向出租人提出任何异议或索赔。

3. 承租人在向出租人提交《租赁物验收证明书》之日起，即应按照本合同的约定使用租赁物。

4. 承租人应自行与供应商协商承担与租赁物运输、保险、安装、调试或交付相关的一切费用（出租人事先同意承担的除外）。

第 4 条　租赁期

1. 租赁期及起租日在附表中予以载明。

2. 除非本合同另有明确约定，承租人不得解除本合同，也不得提前终止租赁期。

3. 若承租人未按照本合同第 3 条（交付条款）第 1 款①的约定以书面形式通知出租人，也未在验收期限内提交《租赁物验收证明书》的，则

① 出租人可视为租赁物已由承租人验收完毕，并开始承租租赁物；

② 出租人有权行使包括解除本合同在内的本合同第 20 条（救济条款）约定的救济措施。

4. 即使承租人按照本合同第 3 条（交付条款）第 1 款①的约定以书面形式通知出租人，若承租人未在验收期限内提交《租赁物验收证明书》的，出租人仍有权行使包括解除本合同在内的本合同第 20 条（救济条款）约定的救济措施。

第 5 条　租金

1. 承租人应按照附表所载明的金额和支付方式向出租人支付租金，而不受租赁物价格、租赁物瑕疵、供应商对买卖合同的违约、承租人对供应商提起任何索赔、租赁物发生保险理赔或其他任何原因的影响。

2. 承租人不得主张以其对出租人或出租人继受人的债权抵销本合同项下租金或其他任何债务。

3. 本合同约定的起租日前出租人需向供应商支付全部或部分租赁物购买价款（“预付款”，具体金额在附表中予以载明）的，则承租人应按照附表所载明的计算方式和支付日向出租人支付利息（“租前息”）。若本合同起租前，中国人民银行上调金融机构人民币存贷款基准利率（“基准利率”）的，出租人有权按照上调后的基准利率调整租前息。

第 6 条　迟延违约金

若承租人迟延支付本合同项下租金及其他应付款项的，承租人应每日按照应付未付款项的万分之七向出租人支付迟延违约金，直至承租人实际清偿该迟延支付款项。本条款同样适用于期末处理时，承租人不按时支付期末购买款项或续租租金的情形。

第 7 条　租赁首付款及租赁保证金

1. 承租人应按照附表所载明的金额和支付方式向出租人支付租赁首付款和租赁保证金。

2. 承租人同意出租人将租赁首付款用于支付租赁物购买价款，以降低其实际融资金额，并不影响其承认出租人对租赁物享有完整所有权。出租人收取附表所载明的租金时，租赁首付款未计入实际融资金额。

3. 租赁保证金不计利息。租赁保证金用以担保承租人完全履行本合同项下全部债务。租赁期届满前，若承租人届时未发生或未正在持续发生违约的，租赁保证金可按照附表的约定处理。本合同租赁期届满前，若承租人发生违约行为，出租人有权以租赁保证金优先受偿。出租人按照自己确定的顺序将租赁保证金冲抵包括迟延违约金等在内的本合同项下应付款项的，承租人应在出租人发出通知后 3 个工作日内补足用于冲抵的租赁保证金。若因承租人违约导致本合同

提前终止或解除的，出租人有权按照本合同第 20 条（救济条款）第 1 款⑥的约定处分租赁保证金。

4. 尽管有前述约定，承租人无权要求以租赁保证金冲抵本合同项下包括租金、迟延违约金在内的任何应付款项。出租人自主决定不以租赁保证金冲抵包括迟延违约金等在内的本合同项下应付款项时，迟延违约金继续按照本合同的约定计算，承租人仍应按照本合同的约定向出租人支付该等包括迟延违约金等在内的本合同项下应付款项。

5. 除非租赁保证金由出租人按照本合同的约定退还承租人，承租人同意租赁保证金同时还作为承租人对出租人的本合同项下债务以外的其他任何债务的担保，若承租人未能履行该等其他债务，出租人有权以该等租赁保证金优先受偿。在该等情形下，承租人应在出租人通知后立即补足租赁保证金。

第 8 条　租赁手续费

承租人应按照附表的约定支付租赁手续费。承租人同意，无论何种理由已支付的租赁手续费将不予退还。

第9条　瑕疵

1. 供应商应当并将直接向承租人履行和承担买卖合同及其与承租人之间签署的其他相关合同和适用法律项下供应商对租赁物的瑕疵保证、维护及其他方面所应履行和承担的任何条件、义务和/或责任。

2. 除非由于出租人故意或重大过失直接导致否则因不可抗力、运输事故等原因造成租赁物交付延迟或不能交付，或租赁物性能或其他任何方面与本合同或买卖合同的约定不符、或不符合承租人对供应商的要求，或租赁物存在质量瑕疵等任何原因使承租人由此遭受任何损失的，出租人均不承担任何责任。若出租人因此遭受到任何损失，承租人应承担赔偿责任。承租人同意，将自行向供应商索赔并承担索赔结果，不会追究出租人的任何责任。

3. 供应商未能履行或承担本条第 1 款约定的任何条件、义务和/或责任，或发生本条第 2 款所述情形的，出租人将其在买卖合同中享有的向供应商进行索赔的权利转让给承租人。承租人应向供应商直接交涉、请求或索赔。但是，对于供应商的责任履行及承租人对供应商的各种直接交涉、请求或索赔及对供应商资质和对供应商的权利能否实现等出租人不作任何保证，承租人理解并同意自行承担其对供应商进行任何交涉、请求或索赔所发生的任何费用（包括仲裁费、诉讼费和律师费等）及产生的任何法律后果。

4. 若本合同履行过程中，承租人发现租赁物有任何先前未被发现的潜在瑕疵的，适用本条的约定。

5. 发生本条上述约定的情形，承租人在本合同项下包括支付租金义务在内的任何义务均不受影响，承租人须按时足额支付各期租金并履行本合同项下任何其他义务。

TOPP

第 10 条 所有权

1. 本合同中的租赁是指中国合同法规定的融资租赁形式。租赁物的完整所有权归出租人所有。

2. 出租人有权进入承租人营业场所或其他租赁物设置场所，检查租赁物外观、运转和维护状况。

3. 出租人有权在租赁物上安置表明出租人为租赁物所有权人的标识（“所有权标识”）。租赁期间，承租人应维护固定在租赁物上的所有权标示。若任何第三人侵害租赁物或出租人所有权的，承租人应立即通知出租人并负责采取必要措施排除该等侵害。

第 11 条 保管、使用和维护

1. 承租人应妥善保管租赁物并使租赁物免遭受灭失或毁损，并防止强制执行等任何法律手段和其他因素带来的损害，如果发生前述事件承租人应当积极采取救助措施，使损失减少至最低程度，同时保护现场迅速采取有利于出租人的必要措施，并及时通知出租人，协助勘查。

2. 承租人应为自身正常经营目的按照租赁物设计用途在附表所载明的租赁物设置场所内以不对任何人产生伤害且符合中国法律、法规、规章并按照供应商提供的使用手册、指引和建议的方式使用租赁物。

3. 承租人应自费负责保持租赁物一直处于良好的维护和工作状态。承租人应自费确保租赁物是按照供应商要求由具备资格的人员进行维护保养及更换所有磨损零部件。因维护保养目的在租赁物上所更换或增加的零部件均自动免费归出租人所有。

4. 因第三人的专利权、商标、著作权或其他知识产权而发生关于租赁物的侵权或纠纷时，由承租人自行负责解决，出租人不负担任何责任。

5. 保管和使用租赁物时，承租人应当遵照国家有关部门制定的保护财产安全的各项规定，对安全检查中发现的各种灾害事故隐患，在接到安全主管部门或出租人提出的整改通知书后，认真付诸实施。

6. 由于租赁物自身或其设置、保管、使用的原因，而造成任何人人身伤害（包括死亡）或财产损失，由承租人自行承担对第三人产生的损害赔偿责任，出租人不承担任何责任。若出租人由此被索赔，或出租人实施了必要的措施的，承租人应承担并赔偿出租人由此产生的所有责任及损失、费用。

第 12 条 禁止行为

1. 未经出租人事先书面同意，承租人不得：

① 将租赁物迁出附表所载明的租赁物设置场所；

② 自行或允许租赁物添附于不动产或其他动产上；

③ 自行或允许将动产添附在租赁物上；

④ 对租赁物予以出售、转让、转租、许可他人使用、设定抵押或其他担保、放弃、或其他可能侵害出租人所有权的处置；

⑤ 声称自己为租赁物所有权人；

⑥ 拆除、遮盖、涂改所有权标识；

⑦ 对租赁物或其任何零件进行任何增加、拆除、替换、改进或其他变更；

⑧ 改变租赁物外观、性能、品质或其他方面。

2. 发生上述情形（无论是否取得出租人书面同意），承租人应出租人的要求，应当同意该改造、变更所产生的价值无偿归属于出租人。

第 13 条 灭失毁损

1. 供应商按照买卖合同的约定直接向承租人交付租赁物后，承租人应承担租赁物灭失或毁损或租赁物的所有权遭受侵害（“事故”）的一切风险，无论是保险范围内或其他未投保的风险。直至租赁期末购买租赁物或将租赁物退还出租人为止，因盗窃、不可抗力、保全措施、承租人的原因或其他任何不可归责于出租人的原因，而引起的租赁物的灭失、毁损及其他一切风险，均由承租人承担损失。但租赁物合理的损耗、减耗不适用本款。

2. 租赁物灭失或者毁损或租赁物的所有权遭受侵害的，承租人应立即通知出租人，并按照出租人的要求采取措施，同时自行承担一切费用；本合同承租人租金支付等义务履行不受影响。

① 若租赁物出现毁损出租人认为可以修复的，承租人应将租赁物修复原或修理至完好状态，或经出租人同意的，承租人应用经出租人认可的与租赁物相同或性能相似的物件替换租赁物；

② 若租赁物出现毁损出租人认为不可修复（包括经济上不可修复），或租赁物灭失（包括所有权遭受侵害）的情况，承租人应在事故后第 1 个租金支付日向出租人支付相当于本合同项下所有到期未付及未到期租金、迟延违约金、期末购买价格的总和的款项（“终止金”）。承租人支付终止金后，本合同自动终止。

3. 承租人按照本条第 2 款②的约定向出租人支付约定的终止金时，出租人应按照租赁物届时状态将租赁物的所有权和/或对第三人的权利转移给承租人。出租人对租赁物的性能、机能及第三人的资质和对第三人的权利是否能够实现等不承担任何责任。

4. 即使租赁物被投保任何保险，承租人仍然必须在取得保险理赔前自费履行本条义务。

第 14 条 保险

1. 承租人应承担租赁物的保险费用及其后果，无论保险是出租人进行投保还是承租人自行投保。

2. 若出租人进行投保的，保险费由出租人计入租金。但该保险并不覆盖租赁物一切风险。承租人同意出租人自主酌定为租赁物购买保险，出租人可应承租人要求向承租人告知保险内容，承租人可自费为租赁物另行购买其他保险。租赁物因保险未能覆盖的风险、遭受的损失（包括对第三者造成的损害等）均由承租人承担。

3. 若承租人自行投保的，承租人应根据出租人要求以出租人为第一受益人购买保险，并连续投保至承租人履行完毕本合同项下所有义务或责任为止，承租人应于起租后 30 日内将租赁物保单及每次保险到期日前将续保保单提交给出租人。另外，承租人也可以自行向保险公司投保以出租人为第一受益人的财产一切险及机损险（含有）且承担全部保险费用。

4. 若发生任何保险事故，承租人应立即通知出租人，并向出租人提供保险理赔所需的一切材料，并配合出租人领取保险金。出租人有权将保险金用于以下用途：

① 抵扣承租人因第 13 条（灭失毁损条款）第 2 款而应支付给出租人的费用；

② 抵扣承租人应支付给出租人的其他费用；

③ 赔偿该事故给第三者造成的损害。

5. 在承租人完全履行本合同有关灭失毁损条款项下义务的情况下，出租人同意将其收到的保险金在用于上述用途以后的余额支付给承租人（但以修复费用或终止金金额为限）。

第 15 条 期末处理

1. 承租人有权在租赁期届满 2 个月前以书面通知的方式选择：购买租赁物，续租或返还租赁物（“期末选择”）。

① 承租人选择购买租赁物的，承租人应在租赁期届满前的最后一个租金支付日支付附表所载明的期末购买价格并承担所有权转让所产生的一切费用（“期末购买款项”），租赁物所有权于租赁期届满、本合同项下并无任何其他应付未付款项，且前述期末购买款项全额到账后，由出租人按照届时状况转归承租人（不附带出租人对租赁物的任何保证）所有。

② 承租人选择续租的，续租期为 1 年，承租人应在续租期开始后 1 个月内一次性支付附表所载明的续租租金，本合同条款在续租期内继续适用，除非双方另行协商约定。

③ 承租人选择返还租赁物的，承租人应在租赁期届满后 10 个工作日内自费负责将租赁物返还至出租人指定地点，租赁物应处于外观、工作、维护良好及无故障状态（正常磨损除外），承租人在租赁物上遗留的任何物件均自动免费归出租人所有。出租人有权自主处置租赁物，处置所得归出租人所有。

2. 若承租人未作出期末选择，或虽选择期末购买租赁物但未能在上述第 1 款①约定的期限支付期末购买款项的，或承租人选择返还租赁物但未能在上述第 1 款③约定的期限内返还的，则出租人可以视为承租人选择续租并要求承租人按照本合同的约定支付续租租金及全部应付未付款项（若有），或出租人有权自行或指定第三人收回租赁物并要求承租人承担因此产生的费用及全部应付未付款项（若有），或要求承租人自费报废租赁物及支付全部应付未付款项（若有），或将租赁物所有权转归承租人并要求承租人支付期末购买款项及全部应付未付款项（若有）。

3. 无论承租人作出何种期末选择，若承租人在租赁期届满时发生或正在持续违约的，则承租人自动丧失期末选择的权利。出租人有权按照本合同有关违约、救济条款及相关法律法规的规定，采取相应救济措施。

4. 尽管有上述约定，双方也可以在附表中直接约定其他期末处理方式。若附表所载明的期末处理方式与本条上述约定有冲突的，以附表为准。

5. 续租期届满时的处理，仍适用本条的约定。

TOPP

第 16 条 报废

本合同因租赁期届满、解除、或其他原因而终止时，或出租人基于本合同的约定要求承租人返还租赁物时，出租人认为租赁物符合中国法律、法规或租赁物所适用的其他规范性文件所要求的废弃或报废标准的、或出租人认为租赁物需要进行报废的，则出租人有权要求承租人自费办理租赁物废弃或报废的所有相关手续。承租人同意以安全、适当并且符合所有适用法律、法规及规范性文件的方式办理租赁物废弃或报废的所有相关手续，包括但不限于在出租人要求的处理期限内将租赁物送交中国政府或主管部门所认可的具有废弃处理资质的单位（“处理单位），委托其在处理期限内回收并处理租赁物，且将该处理单位所出具的租赁物回收证明和有关废弃处理的合同及处理单位的收据的原件提交给出租人。若承租人不按照出租人要求办理该等租赁物废弃或报废的相关手续的，则出租人有权自行委托处理单位回收并处理租赁物，出租人因此产生的费用由承租人承担。如承租人在出租人所要求的处理期限内未能向出租人提交租赁物回收证明和有关废弃处理的合同及处理单位的收据原件的，承租人同意每超过处理期限 1 个工作日均按照租赁期内每日租金金额向出租人支付违约金。此外，承租人应补偿并使出租人免于租赁物废弃或报废所产生的一切责任、处罚、费用或损失。

第 17 条 转让

1. 未经出租人事先书面同意，承租人不得将本合同项下的全部或部分权利和/或义务转让给第三人。

2. 承租人同意，出租人有权选择以下一种方式：

① 将本合同项下的全部或部分权利转让给第三人

② 转让租赁物或对租赁物设定抵押等担保或进行其他处置。

但出租人的上述处分不得影响承租人依本合同的约定所享有的权利。

第 18 条 报告

若出租人要求承租人和/或连带保证人报告其经营状况、财务状况及租赁物状况，承租人和/或连带保证人应向出租人提供包括财务报表在内的书面说明材料。出租人一般间隔不少于 3 个月要求承租人和/或连带保证人提供前述报告。

第 19 条 违约情形

承租人或连带保证人发生下列任一情形，即属承租人违约情形，出租人可按照本合同第 20 条（救济条款）采取救济措施：

① 迟延或未能支付本合同项下任何租金或其他应付款项；

② 向出租人所作陈述（包括但不限于财务资料等）被证明为错误或误导；

③ 不论任何理由，未披露其实际负债情况（包括但不限于借入民间贷款或职工集资等），或在租赁期内未经出租人书面同意，借入或归还民间贷款或职工集资；

④ 未能遵守本合同任何条款（包括但不限于“保管、使用和维护”、“禁止行为”及“声明及保证”等）的约定；

⑤ 无力偿债（包括但不限于未能清偿任何到期债务，或停止生产、歇业、提出破产、解散清算或被停业整顿、被吊销营业执照等）；

⑥ 未能遵守与出租人的其他合同项下的任何条款的约定或出现该等合同约定的其他违约情形时；

⑦ 被卷入诉讼、仲裁或其他法律程序，可能给经营活动带来明显不利影响时；

⑧ 若承租人或连带保证人为自然人，承租人或连带保证人死亡、患精神病或因其他原因丧失民事行为能力或被裁决承担刑事责任；

⑨ 发生影响其偿债能力的其他情形（包括但不限于承租人或连带保证人财产被保全、查封、扣押或没收等；发生合资、分立、减资、股权变更、股份比例变更且未经出租人书面同意；或持续经营不善、经营状况显著恶化，或有足够理由相信有此可能等；）

⑩ 除本合同签署前已书面通知出租人的情况外，被发现存在包括上述②至⑧的情形在内的被认为可能对其信用造成不良影响的重大诉讼及其他事件或情形的；

其控股股东发生上述②至⑨的情形时；

为保障出租人在本合同项下所有债权的实现而签署的担保合同的全部或部分无效、解除、撤销、不生效或无法对抗善意第三人时；

买卖合同因不可归责于出租人的事由而被解除时；

发生与上述各项相当的其他事由时。

第 20 条 救济

1. 发生本合同第 19 条（违约情形条款）任一违约情形时，出租人有权采取下列一项或多项救济措施：

① 要求承租人立即支付本合同项下的所有到期未付及未到期租金、迟延违约金、期末购买款项及其他费用；

② 解除本合同；

③ 要求承租人自费负责立即以出租人要求的方式和条件，将租赁物返还给出租人；或无需出租人通知或通过司法程序，径自进入租赁物设置场所占有并收回租赁物。按照本项的约定返还租赁物发生的修缮、运输及其他费用、各项税款等一切费用均由承租人承担。出租人可以将收回的租赁物自行处分，并将处分租赁物所得扣除因此发生的费用后（如有）用以弥补承租人的全部应付款项，其清偿顺序应按照出租人的自主酌定；

④ 要求承租人承担出租人为保护和实现本合同项下权利和救济所产生的所有合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、财产保全费、申请执行费、拍卖费、占有和收回租赁物的拆卸、包装、运输费、催款手续费等）；

⑤ 要求承租人赔偿出租人遭受的其他直接损失；

⑥ 处分租赁保证金，且承租人有义务将租赁保证金全额按照出租人自主酌定的顺序冲抵本合同项下出租人的损失、迟延违约金、所有到期未付及未到期租金、期末购买款项等承租人的全部应付款项，冲抵后租赁保证金仍有剩余，则剩余部分返还承租人；

⑦ 要求租赁物的维修服务商停止相关服务；

⑩ 采取法律允许的其他救济方式。

2. 在按照本合同约定的起租前，若发生本合同第 19 条（违约情形条款）所述违约情形或因不可归责于出租人的事由所导致的本合同未能签署（包括撤销、未生效、无效），或在起租前本合同被解除，或供应商未能按照买卖合同交付租赁物（包括租赁物的毁损灭失等情况）时，则出租人除有权采取本条第 1 款所述的救济措施外，还有权采取以下措施：

① 解除买卖合同；

② 要求承租人赔偿出租人因此遭受的损失，该损失除包含出租人为购买租赁物已支付的全部款项（如有），还应包含该等款项自出租人实际支付日起计至出租人实际收到承租人返还的全部款项之日止每日万分之七的金额；

③ 要求承租人赔偿出租人因解除买卖合同遭受的其他直接损失。

3. 承租人同意：若本合同连带保证人及其他担保人（若有）履行了担保义务，向出租人支付了本合同项下所有到期未付及未到期租金、迟延违约金、期末购买款项等承租人的全部应付款项后，出租人可以将租赁物的所有权及其相关权利按照届时状态一并转移给连带保证人及其他担保人（若有）；若第三方受让人向出租人支付了对价，出租人可以将租赁物的所有权及其相关权利按照届时状态一并转移给第三方受让人；

4. 出租人的所有救济措施是累积性的，既可以同时行使也可以单独行使。出租人有权将承租人或连带保证人及其他担保人偿还的款项或处分租赁物所得按照出租人自主酌定的顺序冲抵本合同项下出租人的损失、迟延违约金、所有到期未付及未到期租金、期末购买款项等承租人的全部应付款项。

5. 承租人发生任何违约情形（包括但不限于第 19 条（违约情形条款））出租人基于本合同的约定要求承租人返还或出租人自行收回租赁物的，出租人有权单方指定评估机构对租赁物进行评估，并按照评估后的价值进行处置。出租人亦有权不经评估而直接处置租赁物。出租人的上述处置的全部所得将用于按照出租人自主酌定的顺序冲抵本合同项下出租人的损失、迟延违约金、所有到期未付及未到期租金、期末购买款项等承租人的全部应付款项。

第 21 条 保证

1. 连带保证人为承租人在本合同项下全部债务提供连带责任保证。

2. 连带保证人承担保证责任的范围为承租人在本合同项下对出租人的全部债务，包括本合同项下租金、租赁首付款、租赁保证金、租赁手续费、租前息（若有）、迟延违约金、期末购买款项、续租租金、以及因本合同无效（含部分无效）、解除、撤销、不生效或终止作为出租人对承租人享有的损害赔偿金(包括但不限于出租人在本合同起租前支付的包括预付款在内的所有费用（若有））、出租人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、申请执行费、律师费、评估费、拍卖费、运输和收回租赁物的拆卸、包装、运输费、催款手续费等）和其他一切费用。

3. 在本合同项下承租人全部债务均得以清偿前，连带保证人不得因其履行保证责任而向承租人进行任何追偿。

4. 在本合同发生任何变更（包括但不限于数量、价款、币种、利率、履行期限，及承租人经出租人同意转让部分或全部债务等）的情况下，连带保证人仍按照变更后的合同承担连带保证责任。

5. 即使出租人就保证范围内的任何债务享有连带保证人之外的任何物的担保或其他任何担保，出租人仍有权直接要求连带保证人承担连带保证责任而无需先行主张或实现该等其他担保。连带保证人不得因出租人变更或解除其他任何担保人的责任而主张免责或减责。

6. 连带保证人不能以任何对出租人的债权来抵销其应承担的连带保证责任。

7. 连带保证人的保证期间为本合同项下最后一期租金到期日后 2 年。

第 22 条 税费

1. 除非另有明确约定，本合同项下因租赁交易及租赁物的交付、占有、保管、使用、租赁物所有权登记、支付租金、其他应付款项或与其他相关事项所产生的税款、费用和责任均应由承租人承担。

2. 承租人确认且同意，其依照本合同的约定向出租人支付的租金、迟延违约金和/或其他款项，除非明确列明已包含出租人因收取该等款项而须缴纳的增值税或营业税或其他税费，否则承租人还应承担和支付该等税费。租赁期间如遇国家或地方税收政策发生变化而导致出租人所需承担的税费较本合同签署时有任何增加的，出租人有权要求承租人全额承担该等增加部分并全额补偿出租人使出租人免于因该等增加部分产生任何损失。

3. 承租人若就租赁物或租赁交易享有任何减免税待遇，则相应手续由承租人依据相应法律自行办理。出租人对减免税未有任何承诺或保证，并且承租人保证使出租人免于因办理免税手续产生的任何责任或费用。

4. 若租赁物为进口设备，则除非双方另有明确约定，承租人应当自行承担进口关税、增值税及其他一切相关税费调整的税费，并且承租人应使出租人免于因前述税费所产生的任何责任和费用。

第 23 条 声明及保证

承租人及连带保证人向出租人声明、保证并承诺如下：

① 按照各自设立地的法律合法设立并有效存续。

② 本合同的签署及履行，完全符合与其所应遵守的法律、及各自公司内部的章程或其他内部文件、及对之有约束力的其他文件的规定并按照该等规定完成了相应手续,取得了相关全部授权。

③ 保持对租赁物件的占有和控制，并就一切有损出租人的产权和其它利益的情况及时向出租人通报。

④ 向出租人提供的所有资料、文件均真实、完整、正确。

⑤ 未向出租人隐瞒任何有可能影响出租人授信判断的重要信息，包括但不限于正在或即将发生的股权结构变化、财务状况、正在或可能面临的重要诉讼或行政处罚等。

⑪ 上述声明、保证及承诺在本合同有效期内的任何时候、任何情况下均是真实、有效的，并将完全遵守本合同。

第 24 条 争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。有关本合同的任何争议应由各方当事人合理协商，协商不成的提交出租人住所地有管辖权的法院诉讼解决，且包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、合理律师费等诉讼费用均由败诉方承担。

2. 在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，各方当事人仍须履行。

第 25 条 会计处理

承租人自主独立判断和负责承租人自身就本合同及本合同项下租赁交易所作的相关会计和税务处理，出租人对承租人的会计或税务处理未作出任何陈述、承诺或保证。

第 26 条 通知

1. 本合同项下任何通知、报告或其他通讯（"通讯"）均应以书面方式（包括能够确认送达的传真、电子邮件方式）作出，并且发送至各方在本合同所载明的联系地址。若联系地址发生变更的，任何一方应及时通知对方，对方在收到该等变更通知前已向变更前的联系地址发出的任何通讯仍然有效。

2. 任何通讯应分别于以下时间被视为已送达收件的一方：

① 以专人快递方式发送的，在交递之时；

② 以邮寄方式发送的，自放入邮资已付、正确填写收信地址的信封内投邮之日起满 5 个工作日之时；

③ 以传真方式发送的，在向正确传真号码发送完毕之时；

④ 以电子邮件发送的，在电子邮件到达对方服务器之时。

第 27 条 生效

1. 本合同自各方当事人签署后生效，对各方当事人具有约束力，并仅可由书面文件方式予以变更。为避免疑问，在此重申：出租人本身签署本合同前，享有最终的信用审查决定权。本合同生效后，各方当事人达成的任何口头承诺或协议，对出租人不产生约束力。

2. 本合同任何条款被认定为无效、不生效或解除的，不影响本合同其他条款的效力。

3. 本合同及附表构成出租人与承租人就租赁物租赁一事的完整合同，附表内容与本合同不一致的以附表为准。除非经出租人书面同意，否则不得对本合同或本合同的附表做出任何更改。

4. 因任何不可归责于出租人原因导致本合同生效后 3 个月内仍未起租的，则出租人有权行使包括解除本合同在内的本合同第 20 条（救济条款）约定的救济措施，并不承担任何责任（但除非根据按照附表的约定超过 3 个月的除外）。

5. 本合同签署后，如遇国家金融政策调整、宏观经济环境变化等客观情势变更，出租人有理由判断如继续履行本合同将明显增加出租人履约成本的，出租人可以与承租人协商变更本合同，协商不成的出租人有权解除本合同。

第 28 条 公证

1. 承租人和连带保证人同意：若出租人要求的，承租人和连带保证人将给予一切所需配合对本合同进行公证，并且因公证引起一切费用均由承租人承担。

2. 承租人和连带保证人进一步同意：

① 若出租人要求对本合同办理赋予强制执行效力的公证手续的，承租人和连带保证人将立即履行办理该等公证所需的所有配合并承担由此发生的所有公证费及其他相关费用；

② 若承租人或连带保证人发生任何违约情形（包括但不限于第 19 条（违约情形条款））的，出租人可依法直接向有管辖权法院申请强制执行，承租人和连带保证人愿意接受该等法院对本合同项下任何债务进行强制执行；

③ 以本合同所载明或按照本合同的约定通知变更的最新的联系地址、电话、传真或电子邮箱作为赋予强制执行效力公证程序中及所涉强制执行程序中的所有相关文件的送达地址，向送达地址送达文件即视同向承租人或连带保证人送达该等文件。

第 29 条 合同份数

本合同壹式 贰 份，出租人执 壹 份，承租人执 壹 份，均具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

TOPP

设备清单

序号	品名	型号	数量（台/套）	制造商	单价（含增值税）（人民币：元）	小计（含增值税）（人民币：元）
1	环保型沥青拌合站设备	DGRE4000D	1	廊坊德基机械科技有限公司	11,283,000.00	11,283,000.00
购买总价：人民币 11,283,000.00 元（含增值税）						

TOPP

拓菩融资租赁（上海）有限公司

支付确认表

承租人名称：安阳市宇捷市政工程有限公司

融资租赁合同号：RZ-Z-2019002

期数	每期应付租金（含增值税）（人民币：元）	支付方式	期数	每期应付租金（含增值税）（人民币：元）	支付方式
1	287,385.00	转账支付	19	287,385.00	转账支付
2	287,385.00	转账支付	20	287,385.00	转账支付
3	287,385.00	转账支付	21	287,385.00	转账支付
4	287,385.00	转账支付	22	287,385.00	转账支付
5	287,385.00	转账支付	23	287,385.00	转账支付
6	287,385.00	转账支付	24	287,385.00	转账支付
7	287,385.00	转账支付	25	287,385.00	转账支付
8	287,385.00	转账支付	26	287,385.00	转账支付
9	287,385.00	转账支付	27	287,385.00	转账支付
10	287,385.00	转账支付	28	287,385.00	转账支付
11	287,385.00	转账支付	29	287,385.00	转账支付
12	287,385.00	转账支付	30	287,385.00	转账支付
13	287,385.00	转账支付	31	287,385.00	转账支付
14	287,385.00	转账支付	32	287,385.00	转账支付
15	287,385.00	转账支付	33	287,385.00	转账支付
16	287,385.00	转账支付	34	287,385.00	转账支付
17	287,385.00	转账支付	35	287,385.00	保证金冲 162,615.00，支付 124,770.00
18	287,385.00	转账支付	36	287,385.00	保证金冲抵
应付租金总额：10,345,860.00					

备注：

逢节假日提前一天支付

银行账户信息如下：

户名：拓菩融资租赁（上海）有限公司

开户行：中国光大银行上海分行 开户账号：3655 0188 0000 78719

纳税人识别号：91310115MA1K3[illegible]5F

业务经理：[illegible]志军 手机号：[illegible]1902525 邮箱：dennisliu@topplcasing.com

联系地址：中国上海市[illegible]新区民生路1403号信息大厦39[illegible]室

李奇文印



德基机械 D&G MACHINERY

产品合格证

Product Certification

廊坊德基机械科技有限公司

LangFang D&G Machinery Technology Co.,Ltd.

产品名称：强制间歇式沥青混合料搅拌设备	Name of product: Batch Asphalt Mixing Plant
产品型号：DGR4000D	Type of product: DGR4000D
主机编号：1850	Serial number: 1850
供货数量：壹台套	Quantity: 1SET

产品各项技术指标经检验合格，准予出厂。

Technical performance of each items Of Product is up to standard by testing, and permitted to leave the factory.

检验员：

Inspector:

质管部：（检验用章）

Quality control department:(Quality seal)

2019年01月 日

2019 Y01M D

租赁物所有权转让证书

NO:[2019002]

拓菩融资租赁（上海）有限公司于【 2021 】年【 11 】月【 16 】日将下列物件的所有权转让给【安阳市宇捷市政工程有限公司】（“承租人”），从即日起，该物件的所有权全部独立的归属承租人。

租赁合同	编号：【 2019002】		
发票号码	03989108——03989150 28060701——28060757		
物件名称	规格型号	生产编号	数量
环保型沥青拌和站设备	DGRE4000	1850	1 台套

拓菩融资租赁（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 27 楼 F1

邮编：200032

电话：021-68866930

传真：021-68866950

河南省企业投资项目备案证明

项目代码：2019-410506-41-03-060540

项 目 名 称：安阳市宇捷市政工程有限公司沥青混凝土、水泥稳定碎石搅拌项目

企业(法人)全称：安阳市宇捷市政工程有限公司

证 照 代 码：9141050058707186XU

企业经济类型：私营企业

建 设 地 点：安阳市龙安区马投涧镇李各涧村

建 设 性 质：新建

建设规模及内容：项目占地15000余㎡，建筑面积10000余㎡，年产能27万吨沥青混凝土和水泥稳定碎石。沥青混凝土生产线1条，工艺为：碎石、机制砂—进料斗—管道天然气加热干燥滚筒—震动筛分—热料仓计量—导热炉加热沥青—搅拌缸—成品料。水泥稳定碎石生产线工艺：碎石、石粉、水泥—计量—搅拌—成品。

项 目 总 投 资： 5000万元

企业声明：本项目符合产业政策且对项目信息的真实性、合法性和完整性负责。

2019年10月31日

拌和站租赁协议

出租方（甲方）：安阳市宇捷市政工程有限公司

承租方（乙方）：河南泰捷建设有限公司

根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就沥青路面就地热再生设备租赁事宜协商一致，特签订本合同。

一、设备名称、型号、规格及数量

设备名称	规格型号	单位	数量	备注
环保型沥青拌合站	DGHP5000D	座	1	
/	/	/	/	/

二、租赁机械的所有权

1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

三、租赁期限

租赁期限为一年，从 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日

四、租金及支付

1、租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前七日内重新签定续租合同。否则期满合同失效。

2、设备租赁费按月租结算，施工期间按台班计取，租赁费按实际天数乘以 8 小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

3、工程完工 7 日内付清设备租赁款。

五、保证金

经甲、乙双方协商，机组进场前甲方收取乙方保证金500000元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。

租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

六、租赁机械的交货和验收

1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

七、租赁机械的使用、维修、保养和费用

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油，甲方应负责维修、保养，使设备保持良好状态，并各自承担相应费用。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，维修期间免收租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，因乙方原因致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

八、租赁机械运费的承担

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

九、租赁机械的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方。因乙方原因导致租赁机械发生毁损或灭失的，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：

（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；

（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；

（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

十、违约责任

1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额10%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

十一、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交出租方所在地的人民法院诉讼解决。

出租方：

安阳市宇捷市政工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

承租方：

河南泰捷建设有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：2024年9月9日

十五、供应商认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

承 诺 书

我方承诺：

本次招投标项目响应有效期：从《响应文件》开启之日起，响应有效期为 90 日历天。

特此承诺！

投标人：河南荣捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

承 诺 书

我方承诺：

如我公司中标，需自行协调周边施工环境，不得延误工期。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

承 诺 书

我方承诺：

本公司对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密。

特此承诺！

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月18日

承 诺 书

我方承诺无以下情形：

（1）供应商不符合国家或者《磋商文件》规定的资格条件；

（2）供应商没有按照《磋商文件》要求提供投标承诺函；

（3）投标联合体不符合《磋商文件》规定；

（4）《响应文件》的签字盖章不符合《磋商文件》规定；

（5）磋商报价高于竞争性磋商公告公布的预算金额；

（6）同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者磋商报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的；

（7）《响应文件》没有对《磋商文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《磋商文件》的实质性要求和条件；

（8）《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（11）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的；

（12）提供虚假材料谋取成交的；

（13）供应商有串通投标、行贿等违法行为。

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

承 诺 书

我方承诺无以下情形：

◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

◆不同供应商的《响应文件》相互混装。

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日

承诺书

我方承诺：

供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人：河南泰捷建设有限公司（盖章）

2024年11月8日
